

 Obras executadas e em andamento - periodo: 2008 à 2022/2023	Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios		Posição em: 23/12/2022
--	--	---	-------------------------------

Convenio FAI - Nº	Convenio FINEP - Nº	data assinatura do convenio	obs
1416 (RTF)	01.09.0476.00	09/10/2009	Encerrado: RTF >> set 2021
1481 (RTF)	01.11.0055.00	23/03/2011	Encerrado: RTF >> jul/2022
1406 >> Sapiens 1105	01.09.0354.00	09/09/2009	RTF: previsto p/ Jan/23
1468 >> Sapiens 1549	01.10.0625.00	01/12/2010	*
1556 >> Sapiens 595	01.12.0048.00	09/02/2012	Aguardando liberação parcial de Recursos
1597 >> Sapiens 1158	01.12.0510.00	21/12/2012	*
Sapiens 9557	01.16.0014.00 (C.Convite 01/2014)	19/04/2016	Aguardando liberação parcial de Recursos
Sapiens 11.417	01.18.0153.00 (C Convite 01/2018)	18/12/2018	*
Sapiens 11.542	01.19.0189.00 (CTINFRA 03/2018)	20/12/2019	Aguardando liberação integral de Recursos
nº FAI XXX	CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS	contratado em xx/xx/20xx	Parcialmente aprovado!!

It	conv FAI	Licitação	Descrição/obra	Status da licitação/estágio da obra/planejamento 2018/2019	Empresa Contratada/conclusão da etapa / obra	previsão de entrega da obra/empresa	Área Efetiva e/ou equivalente (m²)	nº CNO / INSS	Recursos FINEP / contratado - (R\$)	Outras Fontes (Projetos e/ou Proprios) - (R\$)	V Total Contratado (CI + TAs) R\$	centro vinculado
1	1556 e 9557	CONC xx/2023??	Conclusão do Biotério Central	Em orçamentação	** Definir c/ o Coordenador posição final em jan/2023	10 meses após assinatura do contrato	512,34	Cadastrar CNO a partir de xx/xx/2022??	3.690.000,00		3.690.000,00	CCBS
2	Conv 14.696 (não Finep)	CONC xx/2023??	Reforma das Instalações Elétricas - Predio CCDM	Edital em elaboração (Rafael: docs encaminhados ao Setor de Projetos em 21/12/2022)	CCDM - Prof Guilherme - conv 14.696	3 meses após assinatura do contrato	1.040,00	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	Conv 14.696 (não Finep)	160.550,90	160.550,90	CCET
3	1556	CONC 03/2022	Reforma das Instalações Elétricas - Predios do DEMA - Abertura das habilitações em 20/01/2023	Abertura das habilitações agendada para 20/01/2023	Empresa: ?	10 meses após assinatura do contrato	3.164,05	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	1.136.888,00		1.136.888,00	CCET
4	Conv RTI nº 14.200 (não Finep)	Contratação Direta 05/2022	(SL) Acesso viário da EE de Valparaíso (RTI 14.200) - Valor Base = R\$ 800.202,26 (SL 05/2022 - Deserta novamente em 23/09/2022) - Ata de início de obra assinada em 23/12/2022 >> Início efetivo da obra previsto para 16/01/2023	Em andamento: a partir de 16/01/23 (Fiscalização: empresa Hortolani & Avelar - Eng. Pedro Hortolani)	Empresa: Noroeste Paulista	Entrega do serviço até 24/04/2023	Extensão de 1,2 Km (=le) c/ área = 7.561,45 m²	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	Conv 14.200 (RTI) - não Finep (venc 24/04/2023)	799.417,67	799.417,67	EE Valparaíso
5	Conv 13.840 - não Finep	CONC 02/2022	Lab Multiusuario - CCN - Campus Lagoa do Sino = Valor Base = R\$ 1.780.675,87 - abertura das Habilitações: 30/05/2022 - Abertura das propostas comerciais em 07/06/2022 >> Valor do CI = R\$ 1.756.863,43 >> contratação em 28/06/2022 e início da obra em 21/07/2022	Em Andamento (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	Empresa: Sate Tecnologia e Serviços LTDA.	mar-23	256,61	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	Conv 13.840 (Lagoa do Sino) >> não FINEP	1.756.863,43	1.756.863,43	Campus Lagoa do Sino
6	1597 + 11.417	CONC 03/2021	Conclusão da Ampliação do Lab. de Pesq. em Matemática, com 2 pavimentos e 955,28 m2 - LPGDM (1597) >> V Base = R\$ 1.651.730,76 >> Abertura das Habilitações em 25/08/2021 >> Abertura das propostas em 17/09/21 >> Valor CI = R\$ 1.398.985,27 >> contratação em 18/11/2021 >> início da obra em 06/12/2021	Em Andamento (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	JNA >> CI + 1º TA + 2º TA + 3º TA	fev-23	955,28	CNO 90.009.24350/76	1.612.079,42		1.612.079,42	CCET
7	Conv 14.199 - não Finep	Pregão nº 19/2022 (Campus Araras)	Serviço de Carcamento do Campus de Araras - Valor Base = R\$ 659.677,65 >> Abertura do Pregão: 29/03/2022 - Valor CI = R\$ 546.888,00 - assinatura do contrato e início de obra em 18/04/2022	Concluída (Fiscalização empresa CONSTRUX - Arq. Nickolas)	15/11/2022	Empresa AURUS	Comprimento do Carcamento = 2.072,87 m	Serviço isento de cadastramento no CNO	Conv 14.199 (Araras) >> não FINEP	569.422,14	569.422,14	CCA - Araras
8	1597 + 11.417	CONC 02/2021	Genetica - Conclusão da obra (conv. 1597 e 11.417) - V.Base: R\$ 1.644.024,63 - data base: Dez/20 - Abertura das habilitações: 19/04/21; Abertura das Propostas: 13/05/2021 >> Contratação em 30/07/2021 (CI = R\$ 1.362.675,13) - início efetivo da obra: 16/08/2021	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	16/09/2022 (Termo de Recebimento Provisório: 04/10/2022)	JNA - (CI + Reequilíbrio Contratual + 1º TA + 2º TA + 3º TA + 4º TA ADM + 5º TA)	1.150,00	CNO 90.005.21881/70 (mesmo da CONC 03/2020 - rescindida)	1.678.077,24		1.678.077,24	CCBS
9	1556 + 11.417	CONC 01/2021	IBEV - Conclusão da Obra - Ab = 661,39 m2 (V. Base = R\$ 1.326.840,02 - out/20) - Abertura das habilitações: 05/02/2021; Abertura das Propostas Comerciais: 16/03/2021 - data da assinatura: 14/04/2021 - Valor do CI = R\$ 1.066.196,22 >> início efetivo da obra: 03/05/2021	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	29/04/2022 (Termo de Recebimento Provisório: 06/06/2022)	GG Ribeirão Construções (CI + 1º TA + Reequilíbrio + 2º TA)	661,39	CNO 90.006.65986/77	1.233.807,72		1.233.807,72	CCET
10	REVOCADO	Pregão Eletrônico 072/2021 (Prodin 02/2020 - TED/MEC 8891)	Serviço para Ampliação do Parque de Usinas Fotovoltaicas - 2 UFVs c/ PI = 447,12 KwP (Estacionamentos AT 07 e Petrobras) - Prodin 02/2020 - conv. 13.369 - Valor Base = R\$ 1.796.080,43 >> abertura 22/10/2021 > Valor Contratado/Empresa GC = R\$ 1.409.998,99	Pregão 072/2021 - Revogado	31/03/2022 (PE 072/2021 revogado)	Empresa GS	Cobertura de Estacionamentos A = 2.116,00 m²	**	Conv 13.369 (Prodin 02/2020) >> não FINEP	0,00	-	Institucional
11	9557	CONC 03/2019	LIEP - Conclusão da obra (C. Convite 01/2014) - abertura em 19/12/2019 >> abertura das propostas: 28/02/20 >> data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >> empresa GRIFFO >> início efetivo em 25/05/2020 (CI = R\$ 2.115.230,03)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	OBS 01: TR Provisório PARCIAL: 01/12/2021 > OBS 02 - TR Provisório INTEGRAL: 20/05/2022	GRIFFO (CI + 1º TA + 1º TA Reequilíbrio + 1º TA Realinhamento + 2º TA + 6º TA)	1.043,20	CNO 90.001.26278/76 (Será o mesmo da CONC 02/2019 rescindida)	2.501.066,39		2.501.066,39	CCET
12	1468 + 9557	CONC 06/2018	MAVLABS - conclusão da obra - abertura das habilitações ocorreu em 02/12/2019 - abertura das propostas em 16/12/2019 - data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >> empresa JNA (CI = R\$ 2.167.534,86)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	05/10/2021 (Termo Recebimento Provisório: 27/10/2021)	JNA (CI + 1º TA Reequilíbrio + 1º TA)	993,50	CNO 90.003.49850/60 (está em nome Jomar - 27/05/20)	2.424.437,45		2.424.437,45	CCET

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2022/2023		Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios		Posição em: 23/12/2022								
13	1597	CONC 01/2020	Reforma da UGR - DQ - (ilha) - predio 68A - Lab de Destilação (Ab = 100,98 m²) - data de assinatura do contrato/inicio de obra: 16/09/2020 (CI = R\$ 248.853,55)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	27/08/2021 (Termo Recebimento Provisório: 08/08/2021)	JNA (CI + 1º TA Reequilíbrio + 1º TA + 3º TA)	100,98	CNO 90.004.75553/75	290.706,79	290.706,79	CCET	
14	1597	CONC 02/2020	Reforma da UGR/DeGR - predio 114D + deposito existente (Ab = 163,60 m²) + Ampliação da UGR/DeGR (Ab = 82,00m²) - data de assinatura do contrato/inicio de obra: 16/09/20 (CI = R\$ 575.561,02)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	27/07/2021 (Termo Recebimento Provisório: 23/08/2021)	JNA (CI + 1º TA de Reequilíbrio + 1º TA)	245,60	CNO 90.004.75591/77	616.443,37	616.443,37	CCET	
15	RESCISÃO	CONC 04/2020	Reforma das Instalações Elétricas - Predios do DEMA - abertura das propostas comerciais em 30/09/20 - data da assinatura do contrato: 17/11/2020 - data inicio de obra: 02/12/2020 - Valor CI = R\$ 844.875,01	Rescisão contratual realizada em 11/03/2021	11/03/2021	Nasman (Rescindido)	**	CNO 90.005.21881/70	0,00	-	CCET	
16	REVOCADA	SL 015/2020 (não FINEP)	PMGCA - Lab Sala de Sementes - abertura das habilitações: 24/11/2020. Valor Base = R\$ 842.592,49 - data base Jul/20 - Convenio 10.763 (não FINEP)	Seleção Pública revogada em 09/03/2021	09/03/2021	Contratação Revogada	**	**	Convenio 10.763 (recursos privados) - não FINEP	0,00	-	CCA
17	RESCISÃO	CONC 03/2020	Genética - Conclusão da obra (conv. 1597 e 11.417) - Valor Base = R\$ 1.473.262,94 (Fev/20) - data de assinatura do contrato: 21/10/2020 - inicio da obra: 05/11/2020. Valor do Contrato Inicial = R\$ 1.096.140,00	Rescisão contratual realizada em 11/03/2021	11/03/2021	Nasman (Rescindido)	**	CNO 90.005.04383/79	0,00	-	CCBS	
18	1481 + 9557	CONC 04/2018	FINEP 2 e 3 de Araras (unificados) - conclusão da obra - abertura da licitação 31/01/2019, abertura das propostas em 13/03/2019 e assinatura do contrato em 16/05/19	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	08/09/2020	JNA	1.488,60	CNO 90.000.62787/78	3.361.724,32	3.361.724,32	CCA	
19	9557	CONC 05/2018	COLMEEA - conclusão da obra - abertura da licitação 31/01/2019; abertura das propostas: 26/02/19; assinatura do contrato em 21/05/19	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	04/09/2020	Nasman	1.242,50	CNO 90.000.63999/75	2.902.697,75	2.902.697,75	INSTITUCIONAL	
20	1556	CONC 01/2019	Reforma das Instalações Elétricas da BCO - São Carlos (Ab = 9.000,00 m²) - abertura das habilitações em 23/04/19 >> data da assinatura do contrato e da ata: 28/06/2019 - Inicio efetivo da obra: 19/07/2019	Concluída (fiscalização Eng. Eletrica FAI)	20/12/2019	Mult Light	reforma instalações elétricas BCO - Ab = 9.000,00 m²	CNO 90.000.98846/70	200.737,65	200.737,65	INSTITUCIONAL	
21	1597 + 9557	CONC 10/2017	NANOBO/DQ - Conclusão da Obra - (abertura em 23/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do contrato: 05/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	04/10/2019	MACRO	2.123,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	3.599.056,71	3.599.056,71	CCET	
22	10.763 - não FINEP	SL 009/2018 (seleção pública)	Reforma do Departamento de Biotecnologia e de Produção Vegetal e Animal - DBPVA (profª Bernadete - predio Central) /PMGCA/Araras - abertura 06/11/18, abertura proposta comercial: 14/11/18 >> JNA assinatura contrato: 14/12/2019 - inicio da obra em 07/01/2019	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	27/09/2019	JNA	183,74	CNO 90.000.21841/71	Recurso PMGCA (projeto 10.763) - valor base = R\$ 266.074,70	308.442,27	308.442,27	CCA
23	RESCISÃO	CONC 02/2019 (conv 9557)	LIEP - Conclusão da obra (C. Convite 01/2014) >>> Conclusão do processo de rescisão contratual e emissão do Termo de Recebimento Provisório datados de 24/10/2019	Concluída parcialmente (contrato rescindido) - fiscalização Empresa AGP	26/09/2019	Costa e Costa Construções	1.043,20	CNO 90.901.26278/76	55.670,48	55.670,48	CCET	
24	10.763 - não FINEP	SL 010/2018 (seleção pública)	Reforma do PREDIO PMGCA (sede >> Prof Hermann) /Araras - abertura: 09/11/18; abertura proposta comercial: 14/11/18 >> JNA assinatura contrato: 14/12/2018 - inicio da obra em 07/01/2019	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	21/08/2019	JNA	1.306,30	CNO 90.000.21996/70	Recurso PMGCA (projeto 10.763) - valor base = R\$ 285.714,33	426.908,52	426.908,52	CCA
25	1556	CONC 05/2017	BCO - S Carlos - REFORMA (abertura 14/06/17) - Empresa Viasol - assinatura do contrato 29/08/2017 inicio efetivo/ata: 11/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	06/05/2019	Viasol	reforma	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	677.233,68	677.233,68	INSTITUCIONAL	
26	1481 + 9557	CONC 17/2017	FINEP 3 e 4 - SOROCABA - conclusão da obra (abertura em 30/10/17) - assinatura c/ a M&G: 15/12/2017 - inicio efetivo da obra em 03/01/2018 - M&G	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	29/04/2019	M & G - (CI + TAs + Realinhamento)	2.026,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	4.096.076,28	4.096.076,28	CCTS	
27	1556	CONC 07/2017	INFRADEC - 1ª etapa (abertura em 20/06/2017) - empresa Contisa - assinatura do Contrato/Ata: 18/08/2017 - convenio 1556	Concluída (fiscalização empresa AGP)	18/04/2019	Contisa	684,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	716.808,79	716.808,79	CCET	
28	1556	CONC 03/2018	Reforma Biblioteca de Sorocaba - reabertura em 01/10/18 - empresa vencedora M&G : contratação em 06/11/2018	Concluída (fiscalização empresa AGP)	21/03/2019	M & G	Ab Biblios - Sorocaba = 1.686,94 m²	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	218.279,18	218.279,18	CCTS	
29	1597	CONC 03/2017	Genética - CGMB-DGE - 1ª etapa (abertura 13/06/17) - Empresa ALPHA - assinatura contrato: 03/10/17	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	11/03/2019	ALPHA - (CI + TAs + Realinhamento)	1.150,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.963.835,08	1.963.835,08	CCBS	
30	1406+ 1468+ 9557	CONC 09/2017	BIOTROP - Conclusão da obra (abertura em 22/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do contrato: 04/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	26/02/2019	MACRO	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.814.545,12	1.814.545,12	CCBS	
31	1416 + 1481	CONC 07/2016	2ª etapa da obra Lab. FINEP II e III - Araras - Ab = 1.488,60 m² - 1416*01 e 1481*01 (relançamento: abertura da licitação em 21/12/2016 - contrato datado em 03/03/2017 e o inicio efetivo da obra em 20/03/2017 >> conforme ata - empresa Prodex)	Concluída (fiscalização FAI)	20/12/2018	Prodex	1.488,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.642.425,62	1.642.425,62	CCA	
32	1406 + 9557	CONC 14/2017	CINA - conclusão da obra - abertura 04/10/2017 - assinatura contrato em 27/11/2017 - JNA	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	20/12/2018	JNA	634,95	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.136.862,65	1.136.862,65	CCET	

FAU FINEP		Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2022/2023			Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios		OTO		Posição em: 23/12/2022			
33	1406 + 1468 + 9557	CONC 08 /2017	NAP - conclusão da obra (abertura em 10/07/2017) - Empresa MACRO - assinatura contrato 15/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	30/11/2018	MACRO	1.876,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.530.061,93	1.530.061,93	CECH	
34	1556	CONC 02/2017	BIOTERIO - 1ª etapa - Ab = 512,34 m². (convenio 1556) - abertura da licitação em 07/03/2017- empresa ARQCON Julgada vencedora em 12/04/2017 - contrato assinado em 26/05/17 e início efetivo em 01/06/17	Concluída (fiscalização empresa AGP)	14/09/2018	ARQCON	512,34	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.197.829,15	1.197.829,15	CCBS	
35	9317- não Finep	CONC 01/2018	HU - Instalações de Brises do lado oeste - abertura: 15/02/2018 - contrato assinado em 19/03/2018 - Cedro	Concluída (fiscalização EBSEERH - Eng Fabio)	08/08/2018	CEDRO	instalações brises	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	318.102,99	318.102,99	INSTITUCIONAL
36	1556	CONC 13 /2017	IBEV - 1ª etapa (1556) - abertura 06/09/17 - assinatura do contrato c/ BIL: 20/10/17	Concluída (fiscalização empresa AGP)	30/07/2018	BIL	661,39	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	461.617,60	461.617,60	CCBS	
37	1597	CONC 04 /2017	DGR - Nova UGR - 1ª etapa (abertura 12/06/17) . Empresa ARQCON - assinatura do contrato: 02/10/17	Contrato rescindido/obra cancelada	27/07/2018	ARQCON	781,66	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	138.021,99	138.021,99	CCBS	
38	9317- não Finep	CONC 16/2017	HU - 3ª licitação >> Execução das Instalações Elétricas - Bloco 02 (Orçamento EBSEERH) - abertura 24/10/2017 - MONTAG	Concluída (fiscalização EBSEERH - Eng Fabio) - Cedro	15/07/2018	MONTAG	inst elétricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	356.972,24	356.972,24	INSTITUCIONAL
39	9317- não Finep	CONC 15/2017	HU - 2ª licitação >> Execução para complemento da obra civil do Bloco 02 (Orçamento EBSEERH) - abertura 23/10/2017 - Empresa Cedro >> assinatura do contrato: 27/11/2017 - CEDRO	Concluída (fiscalização EBSEERH - Eng Fabio) - Cedro	26/06/2018	CEDRO	1.881,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	1.023.728,06	1.023.728,06	INSTITUCIONAL
40	1597	CONC 18/2017	3ª etapa do LIEC - Instalações Elétricas (conclusão da obra - conv 1597) - abertura em 09/11/17 - assinatura do contrato: 06/12/2017 - MONTAG	Concluída (fiscalização eng elétrica FAI) - MONTAG	24/04/2018	MONTAG	inst elétricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	172.100,15	172.100,15	CCET	
41	1597	CONC 12 /2017	Cabine de Força Nanobio (Obra Inst. Elétrica) - abertura em 31/08/17 - início efetivo da obra em 03/01/2018 - Sampietro	Concluída (fiscalização eng elétrica FAI) - Sampietro	20/04/2018	SAMPIETRO	inst elétricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	179.974,43	179.974,43	CCET	
42	1556	CONC 11 /2017	Reforma das instalações elétricas dos 4 prédios do CECH - abertura 28/08/17 - assinatura contrato: 22/09/2017 - empresa Nova Meta	Concluída (fiscalização eng elétrica FAI) - Nova Meta	16/03/2018	NOVA META	inst elétricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	121.117,98	121.117,98	CECH	
43	1597	CONC 06 /2016	2ª etapa da ampliação do Ed. Matemática - Conv 1597*03 (relançamento abertura da licitação em 21/12/2016) - Contrato assinado em 16/01/2017: Ata Início de Obra 30/01/2017	Concluída (fiscalização FAI)	23/10/2017	CONTISA	955,28	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	359.616,68	359.616,68	CCET	
44	1468	CONC 04 /2016	1ª etapa prédio MAVLABS /DF c/ 2 pavimentos (GPF 1468) - abertura da licitação: 18/10/2016 (empresa JNA - valor CI = R\$ 934.281,17) - Ata assinada em 09/01/2017	Concluída (fiscalização FAI)	26/10/2017	JNA	993,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.006.681,17	1.006.681,17	CCET	
45	9317- não Finep	CONC 02/2016	Hospital Universitário - HU - 1ª licitação - reforma e conclusão de parte do prédio - Convenio 9317 - FAI X Sapiens (empresa Pajolla - fiscalização Eng Fabio/EBSEERH) - contrato assinado em 14/09/2016	Concluída (fiscalização EBSEERH)	18/09/2017	PAJOLLA	1.881,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	4.955.651,09	4.955.651,09	INSTITUCIONAL
46	1556	CONC 01/2017	Cabine de Força NANOBIO - p/ o prédio de 4 pavimentos (conv 1556 - obra civil) - Abertura das habilitações em 23/02/2017 - vencedora empresa Fragalli - contrato assinado em 04/04/2017 - início efetivo da obra: 10/04/2017	Concluída (fiscalização FAI)	26/07/2017	FRAGALLI	62,10	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	142.937,38	142.937,38	CCET	
47	1468	CONC 05/2016	2 Cabines de Instalações Elétricas p/ o Biotrop e Colmeia - GPF 1468 (abertura da licitação: 15/12/2016 - empresa Sampietro Eng.) - início de obra : 30/01/2017	Concluída (fiscalização FAI)	24/07/2017	SAMPIETRO	126,20	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	598.995,25	598.995,25	CCET	
48	1597	CONC 01/2016	2ª Etapa do LIEC (empresa JNA) - contrato assinado em 03/10/2016 - início efetivo em 17/10/16 - término previsto 15/04/17 - (houve solicitação de aditivo de prazo por + 60 dias solicitado em 02/02/2017)	Concluída (fiscalização FAI)	27/06/2017	JNA	352,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	411.991,00	411.991,00	CCET	
49	PRODIN	Contratação Direta (3 orçamentos)	LIEP - contratação da Laje de Piso do 1º pavimento via PRODIN - contrato assinado em 09/01/2017 c/ Habcon - obra concluída (somente escoramento da laje será retirado em 10/03/17)	Concluída (fiscalização FAI)	17/02/2017	HABCON	491,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso PRODIN/FAI/DEP - UFSCAR	84.635,08	84.635,08	CCET
50	não Finep	CONC 07/2015	Lab Ed. Física e Motricidade Humana - GPF 1325*01 (custo final da obra = soma dos pagamentos à JBS = CONC 22/2013 e dos pagamentos à JNA = CONC 07/2015)	Concluída (fiscalização FAI)	21/12/2016	JBS/JNA	1.250,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso CCI 098/2007 >> convenio encerrado em 28/12/2016	4.395.669,24	4.395.669,24	CCBS
51	1468	CONC 01/15	1ª Etapa do Edifício do LIEP (3 pav - em estrutura metálica)	Concluída (fiscalização FAI)	08/11/2016	Dalmetal	1.623,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.388.746,65	1.388.746,65	CCET	
52	RESCISÃO	CONC 06/2015	3ª Etapa BIOTROP - empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	09/09/2016	Zacarelli	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	268.498,51	268.498,51	CCBS	


FAU UFRGS		Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2022/2023			Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios		OTO		Posição em: 23/12/2022				
53	RESCISÃO	CONC 03/15	Ampliação Ed. Matemática 1ª etapa - Empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	09/09/2016	Zaccarelli	955,28	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	744.138,96	744.138,96	CCET		
54	RESCISÃO	CONC 05/15	2ª etapa Nanobio - 4 pavimentos (etapa para termino somente de 2 pavimentos) - Empresa Zaccarelli - Obs: contrato rescindido em Ago/2016	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	26/08/2016	Zaccarelli	1.061,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	202.934,43	202.934,43	CCET		
55		1468	CONC 04/15	Reforma MAVLABS - DF - ata inicio da obra: 15/01/2016	Concluída (fiscalização FAI)	09/08/2016	Simieng	170,07	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	254.014,63	254.014,63	CCET	
56		1468	TPN 01/2015	3 Cabines de Dados e Voz em S Carlos - GPF 1468*02 (5 açoes) - Cabines do Letras, do DECIV e do CCBS	Concluída (fiscalização FAI)	07/04/2016	**	180,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	230.994,10	230.994,10	INSTITUCIONAL	
57		1406	CV 06/15	Reforma do Laboratório de Controle Ambiental 01 (Edifício nº 75 - DEQ)	Concluída (fiscalização FAI)	23/02/2016	**	132,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	65.752,77	65.752,77	CCET	
58	não Finep		SL 001/2015	2º Predio Administrativo FAI (FAI 02) - recursos proprios	Concluída (fiscalização FAI)	17/12/2015	**	379,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso FAI >> não FINEP	1.128.932,54	1.128.932,54	FAI (2º predio administrativo)
59	*		CONC 23/13	4ª etapa do DEQ - São Carlos (empresa JBS)	Concluída (fiscalização FAI)	10/09/2015	**	1.542,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.352.990,00	1.352.990,00	CCET	
60	*		CONC 03/14	2ª. Etapa do NAP	Concluída (fiscalização FAI)	16/06/2015	**	1.876,75	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.343.697,06	1.343.697,06	CECH	
61		1406	CONC 21/13	Construção da 1ª etapa - COLMEEA	Concluída (fiscalização FAI)	24/04/2015	**	1.242,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.497.468,67	1.497.468,67	INSTITUCIONAL	
62	RESCISÃO		CONC 19/13	1ª etapa Finep II e III de Araras - (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato - CONC 019/2013 - foi revogado - Valor Pago até 27/02/15 = R\$ 230.064,26)	Concluída parcialmente (contrato rescindido)	27/02/2015	JBS	1.488,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	230.064,26	230.064,26	CCA	
63	RESCISÃO		CONC 02/14	Construção 2ª etapa BIOTROP (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato foi revogado)	Concluída parcialmente (contrato rescindido)	27/02/2015	**	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	333.191,92	333.191,92	CCBS	
64	*		CONC 07/14	Reforma dos Lab. DEQ - predios 34 e 34B	Concluída (fiscalização FAI)	25/10/2014	**	122,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	136.357,22	136.357,22	CCET	
65	*		CONC 15/13	1ª etapa FINEP 3 e 4 - Sorocaba - empresa JBS - Fiscal Cassio/Sorocaba	Concluída (Fiscal - Eng Cassio - Sorocaba)	05/09/2014	**	2.026,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	2.288.577,36	2.288.577,36	CCTS	
66		1406	CONC 16/13	Execução de Rede Compacta e Subterrânea - Transfederonica - S Carlos	Concluída	14/07/2014	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	712.637,48	712.637,48	INSTITUCIONAL	
67	*		TPN 010/13	Cabine de Força - Araras (p/ atender os predios FINEP 1, 2 e 3) - Eletro Pires - Fiscal Arquelau	Concluída	13/07/2014	**	52,56	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	173.531,61	34.252,17	207.783,78	CCA
68	*		CONC 17/13	Construção 1ª etapa do CINA - S Carlos	Concluída	25/06/2014	**	634,95	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	570.243,23	570.243,23	CCET	
69	1295*03 + 1551*01		CONC 13/13	2ª Etapa Ecotoxicologia - Araras - Empresa JBS - Fiscal Arquelau	Concluída	29/05/2014	**	746,32	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	610.974,12	167.540,49	778.514,61	CCA
70	não Finep		DL 04/11	Predio Sede - PMGCA - Araras	Concluída	05/05/2014	**	1.306,30	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos PMGCA	3.116.398,39	3.116.398,39	
71	*		CONC 05/12	Construção 1ª etapa BIOTROP (Empresa Zaccarelli)	Concluída	24/01/2014	**	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.364.445,15	1.364.445,15	CCBS	
72	*		CONC 12/13	Construção da 1ª etapa do LIEC - Prof Ernesto DQ	Concluída	30/12/2013	**	352,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	441.352,11	441.352,11	CCET	
73	*		CONC 11/13	Construção Ed Núcleo de Apoio a Pesquisa - NAP - 1ª etapa	Concluída	08/12/2013	**	1.876,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.134.734,26	1.134.734,26	CECH	
74	*		CONC 03/11	Construção Lab Educ. Especial - 1ª etapa - Psicologia - CONC 003/11	Concluída	12/11/2013	**	1.121,75	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	711.142,24	1.079.573,93	1.790.716,17	CECH
75	*		CONC 10/13	Reformas e adequações LIDEPS (edif 23, 25 e 15B)	Concluída	20/10/2013	**	578,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	607.801,60	607.801,60	CECH	
76	*		CONC 01/13	3ª Etapa do DEQ - Inst. Eletricas	Concluída	17/10/2013	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	456.579,02	456.579,02	CCET	
77	1295*03 + 1551*01		CONC 04/12	Construção Lab. Biotecnologia e Ecotoxicologia, 1ª Etapa - Araras - ENGE REIS - fiscal Pavan	Concluída	21/06/2013	**	746,35	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	438.288,87	3.235,04	441.523,91	CCA

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2022/2023		Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios		Posição em : 23/12/2022								
78	*	TPN 01/12	Reforma da Cobertura do Edifício LCE	Concluída	27/05/2013	**	388,32	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	199.693,87	145.943,52	345.637,39	CCET
79	*	CONC 02/12	Construção 1ª etapa Nanobio - DQ - 4 pav	Concluída	16/05/2013	**	2.123,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.180.644,82	402.240,41	1.582.885,23	CCET
80	*	TPN 011/12	2ª Etapa Cabine da Sin -	Concluída	08/02/2013	**	62,21	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	151.409,56		151.409,56	INSTITUCIONAL
81	Petrobras conv 1202	CONC 01/2009	1ª Etapa do Centro de Pesquisa / Petrobras (convenio 1202*02 - Prof Ernesto Urquieta)	Concluída	31/01/2013	**	3.600,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos PETROBRAS	7.704.956,35	7.704.956,35	CCET
82	*	CONC 04/11	Construção 2ª Etapa DEQ + Entorno - CONC 004/11	Concluída	22/10/2012	**	1.542,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	340.943,27	137.760,56	478.703,83	CCET
83	*	TPN 09/11	Construção de cabine primária - SIN - 1ª Etapa	Concluída	03/05/2012	**	62,21	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	104.066,58		104.066,58	INSTITUCIONAL
84	*	TPN 07/11	Modernização Cab. Entrada E. Elétrica	Concluída	07/04/2012	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	50.299,70		50.299,70	CCA
85	1325 (CCI) + 1371 + 1406	CONC 05/10	Construção da cobertura do Edifício da Matemática - conv 1325/CCI nº 098/2007 = R\$ 1.374.516,77 + conv 1371/FINEP = R\$ 390.000,00 + 1406/FINEP = R\$ 877.433,68	Concluída	04/03/2012	**	3.276,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.267.433,68	1.374.516,77	2.641.950,45	CCET
86	*	TPN 08/11	Reforma da Rede de Média Tensão em Araras	Concluída	15/01/2012	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	21.404,67		21.404,67	CCA
87	*	CONC 01/11	Reforma e Ampliação do Lab. de Alta Pressão - DEQ	Concluída	15/12/2011	**	34,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	86.233,89		86.233,89	CCET
88	*	CONC 01/10	Acabamento e Instalações do ATLab - Sorocaba - / GROUT	Concluída	20/09/2011	**	8.740,08	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	677.312,79	3.393.538,92	4.070.851,71	CCETS
89	*	CN 03/11	Execução e Conclusão da rede de Telefonia e Dados do Laboratorio	Concluída	03/07/2011	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	49.984,44		49.984,44	CCET
90	Petrobras conv 1325	CONC 04/2009	Fundação e Estrutura Pre Fabricada do Ed Matemática - empresa PROTENDIT - CCI 098/2007 - GPF 1325 - 01	Concluída	17/02/2011	Protendit	3.276,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos CCI 098/2007 (não FINEP)	2.120.582,97	2.120.582,97	CCET
91	*	TPN 017/08	Reforma Lab do Ed 51 - CCET - Depto Fisica (Unimaz)	Concluída	25/10/2010	**	617,17	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI		374.014,00	374.014,00	CCET
92	*	CONC 04/08	Ed. DEQ - 1ª etapa	Concluída	03/01/2010	**	1.534,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.511.883,44		1.511.883,44	CCET
93	*	CONC 06/08	Ed. Fisioterapia - 1ª etapa - fundação e estrutura pré moldada	Concluída	25/07/2009	**	3.300,55	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.990.281,10	12.000,00	2.002.281,10	CCBS
94	*	TPN 06/08	Lab Pesquisa de Exatas - Sorocaba - 2ª Etapa	Concluída	23/05/2009	**	528,91	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	357.860,17	242.477,33	600.337,50	CCETS
95	*	CN 03/08	Reforma e Ampliação Lab Controle Ambiental - DEQ	Concluída	16/02/2009	**	132,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	120.378,58		120.378,58	CCET
96	*	Dis 01/08	Reforma e Ampl. Lab. Engª Bioquímica - DEQ (CN 010/08)	Concluída	17/01/2009	**	110,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	48.508,76	18.466,44	66.975,20	CCET
97	*	TPN 016/07	Obras/Reformas Ed 51 e 52 - Depto Fisica	Concluída	03/10/2008	**	2.086,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	617.830,65		617.830,65	CCET
98	*	CN 017/08	Reforma Lab do Ed 53 - Depto Fisica	Concluída	12/09/2008	**	250,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	22.974,72		22.974,72	CCET
99	*	TPN 02/07	Lab Pesquisa Sorocaba - Fundações/Estrutura - 1ª Etapa	Concluída	21/03/2008	**	528,91	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	299.849,56		299.849,56	CCETS
100	*	TPN 008/07	Lab Microscopia Elettronica/Conclusão - S Carlos	Concluída	11/03/2008	**	434,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	404.405,31		404.405,31	CCET
							Tt =	94.858,20	70.952.960,19	36.612.793,46	107.565.753,65	107.565.753,65


Posição: 23/12/2022




Obras executadas e em andamento - periodo: 2008 à 2022/2023		
	R\$	% rel
Convenios FINEP =	70.952.960,19	65,96%
Recursos CCIs / Próprios/Outras Fontes =	36.612.793,46	34,04%
Total (R\$) =	107.565.753,65	100,00%



Posição em : 23/12/2022		
ano	Obras Concluídas/Licitadas/em andamento - (R\$/ano)	
2008 - concluídas	1.345.060,24	
2009 - concluídas	2.789.972,38	
2010 - concluídas	1.885.897,44	
2011 - concluídas	6.327.653,01	
2012 - concluídas	3.296.425,23	
2013 - concluídas	14.657.595,60	
2014 - concluídas	9.174.957,22	
2015 - concluídas	5.886.344,45	
2016 - concluídas	7.550.749,29	
2017 - concluídas	7.560.507,65	
2018 - concluídas	8.278.814,79	
2019 - concluídas	14.077.593,76	
2020 - concluídas	6.264.422,07	
2021 - concluídas	3.331.587,61	
2022 - concluídas	5.982.373,49	
Jan 2023 - em andamento	4.168.360,52	VALPARAISO: início efetivo em jan/2023
Jan 2023 - em licitação	1.136.888,00	DEMA - Abertura das habilitações em 20/01/2023
Jan 2023 - em fase de contratação	-	
Jan 2023 - em montagem de edital	160.550,90	Reforma Eletrica CCDM Edital em jan/2023
Jan 2023 - em orçamentação	3.690.000,00	Bioterio - definir valor base final c/ Coordenador
Tt Geral - R\$	107.565.753,65	

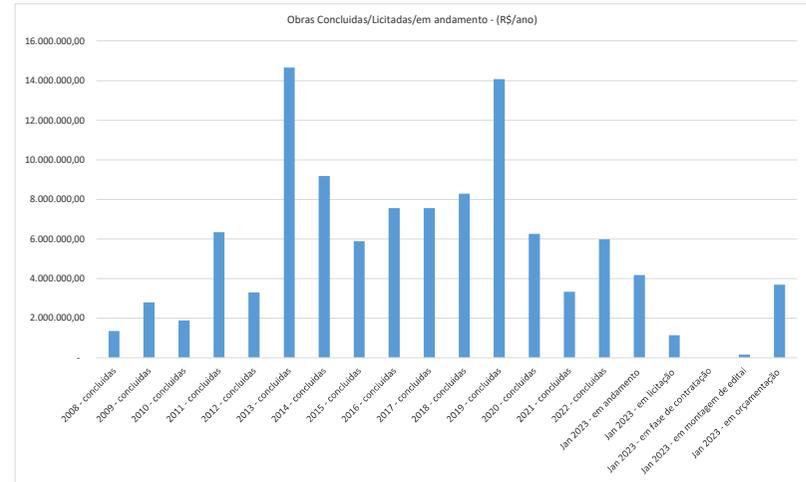

ano	Agrupamento de Obras Concluídas e/ou em andamento (R\$/ano)
2008	1.345.060,24
2009	2.789.972,38
2010	1.885.897,44
2011	6.327.653,01
2012	3.296.425,23
2013	14.657.595,60
2014	9.174.957,22
2015	5.886.344,45
2016	7.550.749,29
2017	7.560.507,65
2018	8.278.814,79
2019	14.077.593,76
2020	6.264.422,07
2021	3.331.587,61
2022	5.982.373,49
agrupado 2023	9.155.799,42
Tt Geral - R\$	107.565.753,65

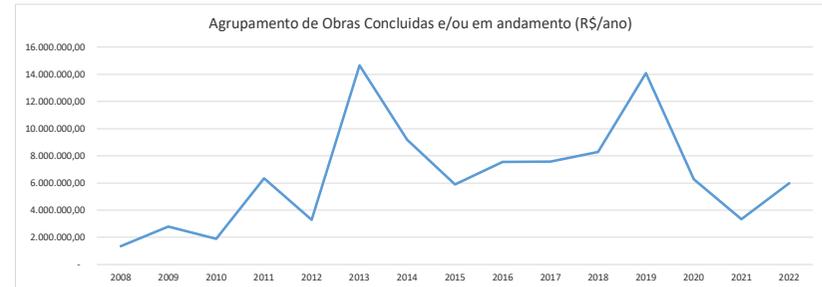

Obs 01: Recursos para obras a serem liberados pela FINEP :

Posição: 23/12/2022

Conv. GPF/Sapiens/FINEP	Recursos ainda a serem liberados /contratos vigentes (R\$)	% a ser liberado	data assinatura	vencimento atual do convenio
1416 - 01.09.0476.00	zero	recurso totalmente liberado	09/10/2009	Encerrado - RTF em set/2021
1481 - 01.11.0055.00	zero	recurso totalmente liberado	23/03/2011	Encerrado - RTF em jul/2022
1406 - 01.09.0354.00	zero	Ultima parcela liberada em jun/2014	09/09/2009	RTF: previsto p/ Jan/23
11.417 - 01.18.0153.00 (Carta Convite 01/2018)	zero	recurso totalmente liberado em dez/2019	18/12/2018	18-jun-23
1556 - 01.12.0048.00	611.000,00	7,34%	09/02/2012	09-ago-23
9557 - 01.16.0014.00 (Carta Convite 01/2014)	607.790,00	3,08%	19/04/2016 (data base plano de trabalho Jan/15)	09-ago-23
1468 - 01.10.0625.00	zero	Ultima parcela liberada em Jul/2016	01/12/2010	01-dez-23
1597 - 01.12.0510.00	zero	Ultima parcela liberada em Dez/2016	21/12/2012	21-dez-23
11.542 - 01.19.0189.00 (CTINFRA 03/2018)	249.500,00	100,00%	22/12/2019	22-dez-23
Tt - R\$	1.468.290,00			

Conv. GPF/Sapiens	Valores a serem liberados
1416	Encerrado - RTF em set/2021
1481	Encerrado - RTF em jul/2022
1406	RTF: previsto p/ Jan/23
11.417 - 01.18.0153.00 (Carta Convite 01/2018)	recurso totalmente liberado
1556	611.000,00
9557 - 01.16.0014.00 (Carta Convite 01/2014)	607.790,00
1468	recurso totalmente liberado
1597	recurso totalmente liberado
11.542 - 01.19.0189.00 (CTINFRA 03/2018)	249.500,00
Tt - R\$	1.468.290,00


18-jun-23
09-ago-23
09-ago-23
01-dez-23
21-dez-23
22-dez-23

Obs 02: Área Construída/Licitada por ano

Posição: 23/12/2022

ano	Área Construída - concluídas e/ou licitadas (m²) por ano
2008	3.298,91
2009	4.071,46
2010	1.534,60
2011	8.774,08
2012	4.880,73
2013	10.848,50
2014	6.562,36
2015	8.203,10
2016	7.046,08
2017	4.861,95
2018	7.837,64
2019	10.191,07
2020	2.731,10
2021	2.021,00
2022	2.854,59
2023 - concluídas	-
2023 - em andamento	1.211,89
2023 - em contratação	-
2023 - em licitação	1.040,00
2023 - em orçamentação	512,34

>>>>>>

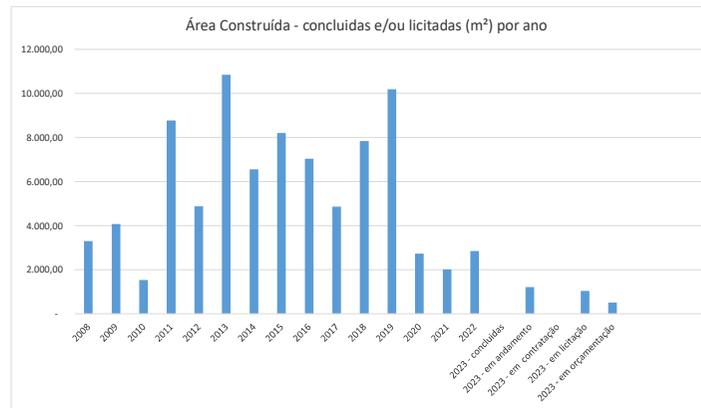

Obs 03: Obras a serem licitadas a partir de 2023

Posição: 23/12/2022

	Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2022/2023	Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios		Posição em : 23/12/2022
---	---	---	---	--------------------------------

qte	GPF/Sapiens - FAI	Obras a serem Licitadas a partir de 2023 alem das que estão em orçamentação	Nº FINEP	Status Orçamentos/Liberações	OBS	Projeção/estimativa do valor da obra (R\$)
1	1468 + 9557	Rota de Fuga/Passarela BIOTROP	1468 - 01.10.0625.00 e 9557 - 01.16.0014.00	Submeter à aprovação da Finep!	** Inclusão de Item no 1468 e 9557 >> Confirmar c/ o Coordenador	675.000,00
2	1556	Incluir a Conclusão do INFRADEC após reunião com a FINEP, realizada em 29/11/2022??	01.12.0048.00	Submeter à aprovação da Finep!	** Inclusão de Item no 1556? Confirmar com o Coordenador!	2.340.000,00
3	1556-03	CIVISA - FINEP - PROINFRA 02/2010 (SUB 03 - CIVISA) - 1ª etapa - R\$ 829.000,00 (aprovado) x reformas predios da Botanica	Predio 83 e 83 A - Elaborar projetos basicos e orçamento para submeter a aprovação da Finep	Aguardar posição final do Coordenador!!	** Definir c/ o Coordenador posição final em jan/2023	829.000,00
4	1556-09	LABPE - FINEP - PROINFRA 02/2010 (SUB 09) - 1ª etapa - R\$ 955.000,00 (aprovado) x reformas Predio PPGE/CECH	Predio PPGE/CECH - Elaborar projetos basicos e orçamento para submeter a aprovação da Finep	Aguardar posição final do Coordenador!!	** Definir c/ o Coordenador posição final em jan/2023	955.000,00
5	1556	INFRA - Alça de Redundância (inst eletricas)	01.12.0048.00	Aguardar posição final do Coordenador!!	** Definir c/ o Coordenador posição final em jan/2023	83.000,00
6	1556-10 (C)	INFRA (D) - cabine de força para Biblioteca c/ Ab = 61,39 m² - GPF 1556*10 - sub/sub 03	01.12.0048.00	Aguardar posição final do Coordenador!!	** Definir c/ o Coordenador posição final em jan/2023	190.000,00
7	1556-10 (D)	INFRA (F) - cabine de força para Unid. Saude Escola c/ Ab = 25,50 m²- GPF 1559*10 - sub/sub 04	01.12.0048.00	Aguardar posição final do Coordenador!!	** Definir c/ o Coordenador posição final em jan/2023	110.000,00
8	1556-02 (B)	Reforma da CX de Escadas do DCF - FINEP - PROINFRA 02/2010 (SUB 02 - IBEV)	01.12.0048.00	Aguardar posição final do Coordenador!!	** Definir c/ o Coordenador posição final em jan/2023	45.000,00
9	1597	Inclusão da Instalação de Gerador e respectivas Instalações Elétricas no NANOBIO	01.12.0510.00	Compra do Gerador como equipamento e contratar MO como PJ!	**Inclusão de item no 1597?? Confirmar com o Coordenador!	305.000,00
10	11.541 - CTINFRA 003/2018	Unidade 01 de Experimentação do Biotério Central (DCF)	11.541 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	aguardando liberação de recurso/FINEP	** Aprovado em 29/01/2019	20.000,00
11	11.541 - CTINFRA 003/2018	Unidade 02 de Experimentação do Biotério Central(DCF)	11.541 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	aguardando liberação de recurso/FINEP	** Aprovado em 29/01/2019	31.400,00
12	11.541 - CTINFRA 003/2018	Unidade 03 de Experimentação do Biotério Central (DCF)	11.541 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	aguardando liberação de recurso/FINEP	** Aprovado em 29/01/2019	27.700,00
13	11.541 - CTINFRA 003/2018	Unidade 04 de Experimentação do Biotério Central (DCF)	11.541 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	aguardando liberação de recurso/FINEP	** Aprovado em 29/01/2019	19.400,00
14	11.541 - CTINFRA 003/2018	Unidade 05 de Experimentação do Biotério Central (DCF)	11.541 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	aguardando liberação de recurso/FINEP	** Aprovado em 29/01/2019	48.200,00
15	11.541 - CTINFRA 003/2018	Unidade 06 de Experimentação do Biotério Central (DCF)	11.541 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	aguardando liberação de recurso/FINEP	** Aprovado em 29/01/2019	32.500,00
16	11.541 - CTINFRA 003/2018	Unidade 07 de Experimentação do Biotério Central (Fisioterapia)	11.541 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	aguardando liberação de recurso/FINEP	** Aprovado em 29/01/2019	52.400,00
17	11.541 - CTINFRA 003/2018	Unidade 08 de Experimentação do Biotério Central (DPsi - CECH)	11.541 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	aguardando liberação de recurso/FINEP	** Aprovado em 29/01/2019	17.500,00
18	Edital FINEP - Salas Limpas	Laboratório Multiusuário de Bioquímica e Biologia Molecular - LMBBM - do Ed. 89 - Departamento de Ciências Fisiológicas - DCF (Proª Heloísa)	CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS	** Pelo merito foi aprovado parcialmente pela FINEP	** Confirmar valor total !!	193.930,00
19	Conv 13.478 >> não Finep	Reforma Livraria/cafeteria BCO - Roniberto >> NÃO FINEP >> Conv.13.478	conv 13.478 >> não Finep >> vencimento em 10/05/2023	Verificar c/ o atual coordenador do Projeto se tal reforma será realizada	** Aguardando posição do Coordenador x Setor Projetos FAI	150.000,00
20	Reforma HU (emenda de bancada)	Reforma HU c/ Recursos de Emenda de Bancada x PMSC (R\$ 800.000,000)	Conv n° ?? >> Recursos não FINEP	Confirmar se esta reforma será licitada via FAI!!	** Confirmar valor total !!	800.000,00

6.925.030,00
