

	Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026	Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios		Posição em : 30/06/2026
---	--	---	---	-------------------------

Sapiens - FAI - Nº	Convenio - Nº		data assinatura do convenio	encerrado/vencimento
1416	FINEP 01.09.0476.00	**	09/10/2009	Encerrado: RTF >> Set 2021
1481	FINEP 01.11.0055.00	**	23/03/2011	Encerrado: RTF >> Jul/2022
1406 >> Sapiens 1105	FINEP 01.09.0354.00	**	09/09/2009	Encerrado: RTF >> Fev/23
Sapiens 11.417	FINEP 01.18.0153.00 (C Convite 01/2018)	**	18/12/2018	Encerrado: RTF >> Out 2023
1597 >> Sapiens 1158	FINEP 01.12.0510.00	**	21/12/2012	Encerramento em Dez/23 com RTF enviado em Abr/2024
Sapiens - 15.796	01.23.00635.00 - UPVs prédio Deciv	**	confirmar data de assinatura	Encerramento em 01/12/2024 - RTF fev/2025
1468 >> Sapiens 1549	FINEP 01.10.0625.00	**	01/12/2010	Encerramento em 01/12/2024 - RTF abr/2025
Sapiens - 11.542	FINEP 01.19.0189.00 (CTINFRA 03/2018 - Reformas 8 Bioterios de Apoio)	**	20/12/2019	Encerramento em 01/02/2025 - RTF abril/2025
Sapiens - 9557	FINEP 01.16.0014.00 (C. Convite 01/2014)	**	19/04/2016	Encerramento em 09/02/2025 - RTF abr 2025
Sapiens - 15.053	FINEP 01.22.0389.00 UFSCARXPS - Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios X e suas Aplicações em Ciência de Materiais	**	confirmar data de assinatura	Encerramento: 14/06/2025 - RTF AGO/2025
Sapiens - 15.481	FINEP 01.23.0061.00 - (CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS)	**	26/06/2023	Encerramento: 26/06/2025 - RTF AGO/2025
1556 >> Sapiens 595	FINEP 01.12.0048.00	**	09/02/2012	Encerramento em 09/02/2025 - RTF Ago/2025
15.750	PRODIN nº 01/2023 - Conclusão Predio DEMEC	**	22/12/2023	Encerramento: 30/11/2025
14.805	FINEP 01.22.0179.00 - Materiais Avançados para Recuperação, Tratamento e Monitoramento do Meio Ambiente. - MARTMA	**	20/04/2022	Encerrado em 20/04/2026
14.793	FINEP 01.22.0177.00 - Materiais avançados com elevados teores de Níobio para aplicações em produção, armazenamento, transporte e conversão de energia	**	20/04/2022	Encerrado em 20/04/2026
14.694	FINEP 01.22.0182.00 - Design, Síntese e Aplicações de Materiais Avançados para Diagnóstico e Tratamento do Câncer - MADTCANCER -	**	20/04/2022	Encerrado em 20/04/2026
16.927	FINEP 01.25.0322.00 - A Agricultura familiar e a biodiversidade contribuindo para produção de alimento sustentável e saudável - 2823/24	**	01/06/2025	01/06/2026
13.792	FINEP 01.21.0073.00 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA - AssistiVerse - Desenvolvimento de Plataforma Digital para Personalização e Auxílio à Aquisição e Mont	**	07/06/2021	07/06/2026
13.791	FINEP 01.21.0073.00 - AssistiVerse - Desenvolvimento de Plataforma Digital para Personalização e Auxílio à Aquisição e Montagem de Meios Auxiliares de	**	07/06/2021	07/06/2026
16.580	RTI - Emenda Parlamentar - Projeto Piloto - Terras Indígenas	**	20/12/2024	23/06/2026
15.481	FINEP 01.23.0061.00 - RESTAURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS PARA LABORATÓRIOS UFSCAR	**	26/06/2023	26/06/2026
15.794	FINEP 01.23.0662.00 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS MONETIZAÇÃO DO GÁS NATURAL DO PRE SAL 01/2022-LINHA 3: TRANSFORMAÇÃO DE GÁS NATURAL EM GÁS DE SÍNTESE	**	17/11/2023	17/11/2026
15.761	FINEP 01.23.0645.00 - Termo, foto, eletro: Diferentes estratégias para a conversão de gás de síntese em hidrocarbonetos líquidos - CATHIDRCOV	**	17/11/2023	17/11/2026
15.792	FINEP 01.23.0590.00 - Separação supersônica e adsorviva offshore do CO2 e outros contaminantes do gás natural do pré-sal brasileiro - SuperAd	**	23/11/2023	23/11/2026
16.601	FINEP 01.24.0603.00 - RECUPERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LABORATORIOS MULTIUSUARIOS DA UFSCAR 2024 - 1315/24	**	19/12/2024	19/12/2026
16.378	FINEP 01.24.0385.00 - Manufatura Aditiva de Materiais Cerâmicos, Metálicos e Poliméricos - MAEngMat - 0634/24	**	04/10/2024	04/10/2027
17.393	FINEP 01.24.0385.00 - Expansão da infraestrutura de pesquisa ligada ao envelhecimento e à pessoa idosa na UFSCar. - IPEPI - 0634/24	**	04/10/2024	04/10/2027
17.392	FINEP 01.24.0385.00 - Expansão do Parque de Equipamentos da Central Analítica do PPGQ/DQ/UFSCar - ExPECenter - 0634/24	**	04/10/2024	04/10/2027
15.793	FINEP 01.23.0575.00 - Aceleração de Inversão Sísmica de Próxima Geração - Fast-FWI	**	27/11/2023	27/11/2027
16.584	FINEP 01.24.0672.00 - Laboratório Multiusuário para Caracterização de Materiais Metálicos e Não Metálicos - IFSP - 0715/24	**	18/12/2024	18/12/2027
16.759	FINEP 01.25.0121.00 - UEIM/CECH - Acervos e coleções da Unidade Especial de Informação e Memória-Centro de Ciências Humanas e Educação - 3028/24	**	11/03/2025	11/03/2028
16.758	FINEP 01.25.0121.00 - ColEsp - Digitalização, preservação e disseminação dos acervos de Forestan Fernandes e Luiz Carlos Prestes - 3028/24	**	11/03/2025	11/03/2028
16.757	FINEP 01.25.0121.00 - UMMA - Difusão do conhecimento via integração multicampi de acervos históricos e culturais da UFSCar - 3028/24	**	11/03/2025	11/03/2028
16.803	FINEP 01.25.0110.00 - CBAT-UFSCar - Coleções de biodiversidade aquática e terrestre do centro de ciências biológicas e da Saúde - UFSCar - 2900/24	**	12/03/2025	12/04/2028
16.802	FINEP 01.25.0110.00 - HerbárioSORO - Adequação do espaço físico do acervo do herbário da UFSCar campus Sorocaba - 2900/24	**	12/03/2025	12/04/2028
17.637	FINEP 01.25.0838.00 - IFSP-PRIME (Programa de Reparo e Investimento em Manutenção de Equipamentos) - IFSP - 2516/25	**	11/12/2025	11/12/2028

It	conv FAI	Licitação/Contrato (nº)	Descrição/obra	Sigla /obra	Status da licitação/estágio da obra/planejamento 2025	Empresa Contratada/conclusão da etapa /obra	previsão de entrega da obra/empresa	Área Efetiva e/ou equivalente (m²)	nº CNO / INSS	Recursos FINEP / contratado - (R\$)	Outras Fontes (Projetos e/ou Próprios) - (R\$)	V Total Contratado (Cl + TAs) R\$	centro vinculado
1	10.763 - não FINEP	Contrato nº?	Conclusão do Centro Esportivo de Araras - Valor Base = R\$??	Centro Esportivo Araras	Aguardando atualização do Orçamento para a Contratação da Conclusão da Obra	?	?			Conta 10763 (não FINEP)	2.900.000,00	2.900.000,00	CCA/PMGCA

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026				Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios				Posição em :		30/06/2026						
2	17.765	Licitação nº ??	Contratação Projeto Executivo Lab. NEPEM - Campus Sorocaba (FINEP 01.26.0051.00) - Valor Base = R\$ 1.023.248,90	NEPEM - ProjExec	Edital em elaboração	?	?	PROJEXEC - Sorocaba		-	*	*				Campus Sorocaba
3	16.802	Licitação nº ??	FINEP 01.25.0110.00 - Acervos Científicos UFSCar - G1-Acervos UFSCar - Licitação Reforma Herbário Sorocaba - abertura 27/03/2026 (licitação frassada) - Valor Base = R\$ 63.831,19	Herbário Sorocaba Reforma	Lançar nova licitação!!	Empresa?	90 dias	106,20		63.831,19		63.831,19				Campus Sorocaba
4	17.764	SL 41/2026	Obra Gerontologia - CEPEH (CTINFRA 2024) - Campus São Carlos (FINEP 01.26.0051.00) - Valor Base = R\$ 3.965.861,77. Abertura 24/06/2026. Valor do CI = R\$ xxxxxxxxxxxx, Assinatura do Contrato: XX/XX/2026	CEPEH	Doc's em análises	10 empresas participantes	?	637,82		3.965.861,77		3.965.861,77				CCBS
5	16.758	SL 37/2026	FINEP 01.25.0121 - Acervos Históricos e Culturais UFSCar - G2 - Acervos UFSCar - Reforma do ultimo pavimento da BCO - Valor Base = R\$ 169.617,72 - abertura em 28/05/2026 - Valor do CI = R\$ 165.000,00 - Assinatura do Contrato: xx/xx/2026	BCO - Reforma	Início da obra previsto para 13/07/2026	Empresa: Fragalli	120 dias	84,00		165.000,00		165.000,00				CCBS
6	17.748 (não Finep)	Contrato - Prestação de Serviço nº 09/2026	Contratação Projeto Executivo do LIDI - Petrobras (Proflª Fernanda) - Valor Base = R\$ 80.000,00 - recurso liberado em 29/05/2026. Contrato assinado em 08/06/2026	LIDI - ProjExec	Em andamento (fiscalização Engenharia FAI)	Empresa Ipê	out-26	PROJEXEC - LIDI		17748 (não Finep)	*	*				CCBS
7	16.759	SP 07/2026	01.25.0121 - Acervos Históricos e Culturais - Subprojeto UEIM/CECH - Licitação Reforma Bloco Central do Predio do CECH (abertura de Licitação em 27/02/2026) - contrato assinado em 24/03/2026 - Valor CI = R\$ 133.000,00 >> Início da obra: 13/04/2026	CECH - reforma	Em Andamento (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	JNA	ago-26	80,50		133.000,00		133.000,00				CCBS
8	Conta 4932	Contrato - Prestação de Serviço nº 11/2026	Execução Estacionamento FAI/COLMEEA - início: 04/06/2026	Estacioname nto	Em Andamento - Fiscalização Engenharia FAI (civil e elétrica)	Empresa: CS Engenharia	nov-26	4.991,45	**	Conta 2930 (Não FINEP)	1.789.021,41	1.789.021,41				Estacionamento FAI
9	Conta 4932	Contrato Administrativo 17/2024	Ampliação Predio FAI 01 (c/ 2 pavimentos) - V Base = R\$ 1.601.150,38 - Valor CI = R\$ 1.319.942,57 - Contrato assinado em 05/08/2024 e Início da Obra em 22/08/2024 (Ampliação + Reforma FAI 01 + Reforma AI/FAI 02)	FAI 01	Em Andamento - Fiscalização Engenharia FAI (civil e elétrica)	Empresa: CS Engenharia + TAs)	ago-26	321,51		Conta 2930 (Não FINEP)	2.258.796,33	2.258.796,33				Ampliação FAI 01
10	16.580	Prestação de Serviço nº 02/2026	Contratação para execução das perfurações de poços artesanais - Terras Indígenas	Poços	Concluída (Fiscalização ARTHUR PAZINATTO ANTONIO SOLUCOES GEOLOGICAS LTDA)	03/06/2026 (Termo de Recebimento: xx/xx/2026)	Empresa: PERFUGEL - PERFURAÇÕES GEOLOGICAS LTDA	Perfurações de Poços		Conta 16.580 (não FINEP)	762.714,60	762.714,60				Terras indígenas - Campus Buri
11	RESCISÃO (10.763) - não FINEP	SL 11/2025	Centro Esportivo de Araras (V base = R\$ 3.643.195,30) - CI = R\$ 3.053.833,24 Assinatura do CI: 06/08/2025 - início da obra: 01/09/2025	**	Rescisão Contratual (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	Contrato de Rescisão assinado em 19/02/2026	Empresa: CGH Construtora	Ata da Rescisão assinada em 04/12/2025		Conta 10763 (não FINEP)	455.153,99	455.153,99				CCA/PMGCA
12	16.580 (não FINEP)	Seleção Publica 056/2025 (relançamento)	Contratação para execução das perfurações de 16 poços - Terras Indígenas (UFSCar nº 68/2024 - ProEx nº 39480/2024-12 - Resgate da dignidade humana e pertencimento: projeto piloto de gestão ambiental e territorial e bem viver nas Terras Indígenas Jaraguá (São Paulo) e Tenondé Porã (São Bernardo do Campo) no âmbito da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) - Abertura da Licitação: 16/12/2025	**	Certame frassado	**	60 dias	Perfurações de Poços		Conta 16.580 (não FINEP)	-	-				Terras indígenas - Campus Buri
13	Recursos FAI	Contrato Administrativo CD 06/2024	Contratação de Anteprojeto para Renaturalização da Área do Lago da UFSCAR (Barragem) - Campus São Carlos - CI = R\$ 318.400,00	**	Anteprojeto Concluído - Fiscalização Equipe SeGEF (nov/25)	Anteprojeto Concluído	Empresa: Silva Leme Engenharia Ltda.	Anteprojeto - Barragem - Campus São Carlos	CI = R\$ 318.400,00	Execução de Anteprojeto - Recursos FAI	**	**				Campus São Carlos (anteprojeto)
14	Não FINEP - conv. 13.840	CONC 02/2024 (Projetos Executivos Campus Lagoa do Sino)	Contratação Projetos Executivos - Lagoa do Sino/SeGEF - (Coordenadora Proflª Luciana/SeGEF) - V base = R\$ 528.846,95 - abertura em 24/05/2024 - Valor do CI = R\$ 475.948,86 - contrato assinatura em: 25/07/2024	**	Projetos Concluídos - Fiscalização Equipe SeGEF (nov/25)	Projetos Concluídos, exceto o de Combate a Incendio	Empresa: KAAAN ARCHITECTEN – SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	Ab = 2.000,00 m² (=e)	CI = R\$ 475.948,86	Contratação de Projetos Executivos Conv. 13.840 (não FINEP)	**	**				Campus Lagoa do Sino (Projetos Executivos)
15	16.580 (não FINEP)	Seleção Publica 42/2025	Contratação para execução das perfurações de 16 poços - Terras Indígenas (UFSCar nº 68/2024 - ProEx nº 39480/2024-12 - Resgate da dignidade humana e pertencimento: projeto piloto de gestão ambiental e territorial e bem viver nas Terras Indígenas Jaraguá (São Paulo) e Tenondé Porã (São Bernardo do Campo) no âmbito da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) - Abertura da Licitação: 05/11/2025	**	Licitação Finalizada - empresas desclassificadas - posição 19/11/2025	Licitação será relançada!	**	**	**	Conta 16.580 (não FINEP)	**	**				Terras Indígenas - Campus Buri
16	16.580 (não FINEP)	Contrato Prest. Serviço 11/2025	Poços Indígenas - Contratação do Projeto Executivo /Estudos Hidrogeológicos	**	Projetos Concluídos (entrega ocorreu em 01/09/2025)	Entrega dos Projetos: 02/09/2025	Empresa: ARTHUR PAZINATTO ANTONIO SOLUCOES GEOLOGICAS LTDA	Projetos Executivos - Poços	CI = R\$ 65.000,00	16.580 (não FINEP)	**	**				Campus Lagoa do Sino (Projetos Executivos Poços Indígenas)
17	Prodin - nº 02/2023 - Conv. 15.750	CONC 03/2024	Conclusão do Predio DeMEC x PRODIN (licitação via FAI) - V Base = R\$ 2.009.646,69 - abertura em 15/05/2024 - Valor do CI = R\$ 1.730.000,00 - Assinatura do CI: 24/06/2024 - Início da Obra: 01/07/2024	**	Concluída (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	29/04/2025 (Termo de Recebimento Provisório: 12/05/2025)	Empresa: Beuvalle Construtora		527,12		Prodin - nº 02/2023 - Conv. 15.750	1.923.071,97	1.923.071,97			CCET
18	1556 e 9557	CONC 01/2023	Conclusão do BIOTERIO CENTRAL - V Base = R\$ 3.888.259,87 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R\$ 3.498.267,83 >> Contratação em 11/10/2023 e Início da Obra em 30/10/2023	**	Concluída (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	06/02/2025 (Termo de Recebimento Provisório: 1º termo 18/02/2025 - 2º termo: 16/05/2025)	Empresa: JNA		512,34		4.114.833,48	4.114.833,48				CCBS
19	11.542	CONC 05/2024	Reforma de 6 Biotérios de Apoio (Predio DCF) = V Base = R\$ 209.092,98 - abertura em 27/05/2024 - Contrato assinado em 23/07/2024 e Início de Obra em 23/07/2024 - Final do contrato: 31/01/2025	**	Concluída (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	31/01/2025 (Termo de Recebimento Provisório: 19/02/2025)	Empresa: UMPLER Engenharia		70,93		215.983,85	215.983,85				CCBS
20	15.053	CONC 04/2024	Reforma LCE - Prof Botta - V Base = R\$ 299.898,29 - abertura em 23/05/2024 - Contrato assinado em 12/08/2024 e Início de Obra em 26/08/2024 - Final do contrato: 31/01/2025	**	Concluída (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	31/01/2025 (Termo de Recebimento Provisório: 19/02/2025)	Empresa: UMPLER Engenharia		295,00		298.598,98	298.598,98				CCET
21	1556	CONC 02/2023	Conclusão do INFRATEC - V Base = R\$ 2.299.198,97 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R\$ 1.839.355,85 >> Contratação em 11/10/2023 e Início da Obra em 30/10/2023	**	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Eletrica FAI)	06/12/2024 (Termo de Recebimento Provisório: 23/01/2025)	Empresa: JNA		684,60		2.179.368,96	2.179.368,96				CCET
22	15.481	CONC 01/2024	Reforma do Laboratorio LMBBM (DCF - Proflª Heloisa) - V base R\$ 224.897,41 >> abertura das Propostas: 16/02/2024 - Assinatura do CI em 16/04/2024 - Início da Obra em 02/05/2024	**	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Eletrica FAI)	30/10/2024 (Termo de Recebimento Provisório: xx/xx/2024)	Empresa: CS		85,21		231.010,69	231.010,69				CCBS
23	Não FINEP - conta FAI 2930	Contrato CD 11/2024	Rede Elétrica - Alimentação - Predio INFRATEC - V Base = R\$ 166.811,70	**	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Eletrica FAI)	03/09/2024 (Termo de Recebimento Provisório: xx/xx/2024)	Empresa: JNA	Rede Elétrica Aérea	**	Conta FAI 2930 (Não FINEP)	164.994,61	164.994,61				CCET

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026				Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios				Posição em:	30/06/2026				
24	1468 + 9557	CONC 03/2023	Inclusão Rota de Fuga/Passarela BIOTROP - V Base = R\$ 739.008,09 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R\$ 590.047,17 >> Contratação em 11/10/2023 à Início da Obra em 30/10/2023	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI) e Fiscalização da Granuzo Marçal a partir de 19/03/24	23/08/2024 (Termo de Recebimento Provisório: 24/09/2024)	Empresa: JNA (CI + 1ª TA + 2ª TA)	120,00	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII	715.783,93		715.783,93	CCET
25	1556	CONC 03/2022	Reforma das Instalações Elétricas - Predios do DEMA - Valor Base = R\$ 1.136.888,00 - Abertura das habilitações em 20/01/2023 - Abertura das propostas: 06/03/2023 >> Início efetivo da Obra: 13/03/2023	**	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Elétrica FAI)	07/03/2024 (Termo de Recebimento Provisório: 10/05/2024)	Empresa: Andre Hoffman Rodrigues - ME (CI + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA + 4ª TA + 5ª TA)	3.164,05	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII	1.228.171,50		1.228.171,50	CCET
26	Conv 13.840 - não Finep	CONC 02/2022	Lab Multiusuario - CCN - Campus Lagoa do Sino = Valor Base = R\$ 1.780.675,87 - abertura das Habilitações: 30/05/2022 - Abertura das propostas comerciais em 07/06/2022 >> Valor do CI = R\$ 1.756.863,43 >> contratação em 28/06/2022 e início da obra em 21/07/2022	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	30/10/2023 (Termo de Recebimento Provisório: 14/12/2023)	Sate Tecnologia e Serviços Ltda >>> CI + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA + 4ª TA de prazo administrativo + 30 dias	256,61	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII	Conv 13.840 (Lagoa do Sino) >> não FINEP	1.693.215,21	1.693.215,21	Campus Lagoa do Sino
27	Conv 14.696 (não Finep)	SL 02/2023	Reforma das Instalações Elétricas - Predio CCOD (prof Guilherme Koga) - V Base = R\$ 160.550,90 - Abertura Habilitações: 02/05/23 - Abertura propostas: 12/05/2023 - Assinatura do contrato: 05/06/2023 >>> Início Obra: 19/06/2023	**	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Elétrica FAI)	06/10/2023 (Termo de Recebimento Provisório: 20/10/2023)	Empresa: Andre Hoffman Rodrigues - ME (CI + 1ª TA)	1.040,00	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII	Conv 14.696 (não Finep)	122.676,27	122.676,27	CCET
28	Conv RTR nº 14.200 (não Finep)	Contrato CD nº 012/2022	Acesso viário da EE de Valparaíso (RT1 14.200) - Valor Base = R\$ 800.202,26 (SL 05/2022 - Deserta novamente em 23/09/2022) - Ata de início de obra assinada em 23/12/2022 >> Início efetivo da obra: 16/01/2023	**	Concluída (fiscalização: empresa Hortolani & Avelar - Eng. Pedro Hortolani)	Conclusão em 24/04/23	Noroeste Paulista >> CI + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA	Extensão de 1,2 Km (≈/≈) c/ área = 7.561,45 m²	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII	Conv 14.200 (RTI) - não Finep (venc 24/04/2023)	859.190,70	859.190,70	EE Valparaíso
29	1597 + 11.417	CONC 03/2021	Conclusão da Ampliação do Lab. de Pesq. em Matemática, com 2 pavimentos e 955,28 m² - LPGDM (1597) >> V Base = R\$ 1.651.730,76 >> Abertura das Habilitações em 25/08/2021 >> Abertura das propostas em 17/09/21 >> Valor CI = R\$ 1.398.985,27, >> contratação em 18/11/2021 >> início da obra em 06/12/2021	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	03/03/2023 (Termo de Recebimento Provisório: 13/03/2023)	JNA >> CI + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA + 4ª TA + Reequilíbrio em fev/23	955,28	CNO 90.009.24350/76	1.790.016,94		1.790.016,94	CCET
30	Conv 14.199 - não Finep	Pregão nº 19/2022 (Campus Araras)	Serviço de Cercamento do Campus de Araras - Valor Base = R\$ 659.677,65 >> Abertura do Pregão: 29/03/2022 - Valor CI = R\$ 546.888,00 - assinatura do contrato e início de obra em 18/04/2022	**	Concluída (fiscalização empresa CONSTRIX - Arq. Nickolas)	15/11/2022	Empresa AURUS	Comprimento do Cercamento = 2.072,87 m	Serviço isento de cadastramento no CNO	Conv 14.199 (Araras) >> não FINEP	569.422,14	569.422,14	CCA - Araras
31	1597 + 11.417	CONC 02/2021	Genética - Conclusão da obra (conv. 1597 e 11.417) - V.Base: R\$ 1.644.024,63 - data base: Dez/20 - Abertura das habilitações: 19/04/21; Abertura das Propostas: 13/05/2021 >> Contratação em 30/07/2021 (CI = R\$ 1.362.675,13) - início efetivo da obra: 16/08/2021	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	16/09/2022 (Termo de Recebimento Provisório: 04/10/2022)	JNA - (CI + Reequilíbrio Contratual + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA + 4ª TA ADM + 5ª TA)	1.150,00	CNO 90.005.21881/70 (mesmo da CONC 03/2020 - rescindida)	1.678.077,24		1.678.077,24	CCBS
32	1556 + 11.417	CONC 01/2021	IBEV - Conclusão da Obra - Ab = 661,39 m² (V. Base = R\$ 1.326.840,02 - out/20) - Abertura das habilitações: 05/02/2021; Abertura das Propostas Comerciais: 16/03/2021 - data da assinatura: 14/04/2021 - Valor do CI = R\$ 1.066.196,22 >> início efetivo da obra: 03/05/2021	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	29/04/2022 (Termo de Recebimento Provisório: 06/06/2022)	GG Ribeiro Construções (CI + 1ª TA + Reequilíbrio + 2ª TA)	661,39	CNO 90.006.65986/77	1.233.807,72		1.233.807,72	CCET
33	REVOGADO	Pregão Eletrônico PE 072/2021 (Prodin 02/2020 - TED/MEC 8891)	Serviço para Ampliação do Parque de Usinas Fotovoltaicas - 2 UVFs c/ PI = 447,12 KWp (Estacionamentos AT 07 e Petróbras) - Prodin 02/2020 - conv. 13.369 - Valor Base = R\$ 1.796.080,43 >> abertura 22/10/2021 > Valor Contratado/Empresa GC = R\$ 1.409.998,99	**	Pregão 072/2021 - Revogado	31/03/2022 (PE 072/2021 revogado)	Empresa GS	Cobertura de Estacionamentos A = 2.116,00 m²	**	Conv 13.369 (Prodin 02/2020) >> não FINEP	0,00	-	Institucional
34	9557	CONC 03/2019	LIEP - Conclusão da obra (C. Convite 01/2014) - abertura em 19/12/2019 >> abertura das propostas: 28/02/20 >> data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >> empresa GRIFFO >> início efetivo em 25/05/2020 (CI = R\$ 2.115.230,03)	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	OBS 01: TR Provisório PARCIAL: 01/12/2021 > OBS 02 - TR Provisório INTEGRAL: 20/05/2022	GRIFFO (CI + 1ª TA + 1ª TA Reequilíbrio + 1ª TA Realinhamento + 2ª TA + 6ª TA)	1.043,20	CNO 90.001.26278/76 (Será o mesmo da CONC 02/2019 rescindida)	2.501.066,39		2.501.066,39	CCET
35	1468 + 9557	CONC 06/2018	MAVLABS - conclusão da obra - abertura das habilitações ocorreu em 02/12/2019 - abertura das propostas em 16/12/2019 - data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >> empresa JNA (CI = R\$ 2.167.534,88)	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	05/10/2021 (Termo Recebimento Provisório: 27/10/2021)	JNA (CI + 1ª TA Reequilíbrio + 1ª TA)	993,50	CNO 90.003.49850/60 (está em nome Jomar - 27/05/20)	2.424.437,45		2.424.437,45	CCET
36	1597	CONC 01/2020	Reforma da UGR - DQ - (Ilha) - predio 68A - Lab de Destilação (Ab = 100,98 m²) - data de assinatura do contrato/início de obra: 16/09/2020 (CI = R\$ 248.853,55)	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	27/08/2021 (Termo Recebimento Provisório: 08/08/2021)	JNA (CI + 1ª TA Reequilíbrio + 1ª TA + 3ª TA)	100,98	CNO 90.004.75553/75	290.706,79		290.706,79	CCET
37	1597	CONC 02/2020	Reforma da UGR/DeGR - predio 114D + deposito existente (Ab = 163,60 m²) + Ampliação da UGR/DeGR (Ab = 82,00m²) - data da assinatura do contrato/início de obra: 16/09/20 (CI = R\$ 575.561,02)	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	27/07/2021 (Termo Recebimento Provisório: 23/08/2021)	JNA (CI + 1ª TA de Reequilíbrio + 1ª TA)	245,60	CNO 90.004.75591/77	616.443,37		616.443,37	CCET
38	RESCISÃO	CONC 04/2020	Reforma das Instalações Elétricas - Predios do DEMA - abertura das propostas comerciais em 30/09/20 - data da assinatura do contrato: 17/11/2020 - data início de obra: 02/12/2020 - Valor CI = R\$ 844.875,01	**	Rescisão contratual realizada em 11/03/2021 (conv 1556)	11/03/2021	Nasman (Rescindido)	**	CNO 90.005.21881/70	0,00		-	CCET
39	REVOGADA	SL 015/2020 (não FINEP)	PMGCA - Lab Sala de Sementes - abertura das habilitações: 24/11/2020 - Valor Base = R\$ 842.592,49 - data base Jul/20 - Convenio 10.763 (não FINEP)	**	Seleção Pública revogada em 09/03/2021	09/03/2021	Contratação Revogada	**	**	Convenio 10.763 (recursos privados) - não Finep	0,00	-	CCA
40	RESCISÃO	CONC 03/2020	Genética - Conclusão da obra (conv. 1597 e 11.417) - Valor Base = R\$ 1.473.262,94 (Fev/20) - data de assinatura do contrato: 21/10/2020 - início da obra: 05/11/2020. Valor do Contrato Inicial = R\$ 1.096.140,00	**	Rescisão contratual realizada em 11/03/2021 (conv. 1597 + 11.417)	11/03/2021	Nasman (Rescindido)	**	CNO 90.005.04383/79	0,00		-	CCBS
41	1481 + 9557	CONC 04/2018	FINEP 2 e 3 de Araras (unificados) - conclusão da obra - abertura da licitação 31/01/2019, abertura das propostas em 13/03/2019 e assinatura do contrato em 16/05/19	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	08/09/2020	JNA	1.488,60	CNO 90.000.62787/78	3.361.724,32		3.361.724,32	CCA
42	9557	CONC 05/2018	COLMEEA - conclusão da obra - abertura da licitação 31/01/2019; abertura das propostas: 26/02/19; assinatura do contrato em 21/05/19	**	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	04/09/2020	Nasman	1.242,50	CNO 90.000.63999/75	2.902.697,75		2.902.697,75	INSTITUCIONAL
43	1556	CONC 01/2019	Reforma das Instalações Elétricas da BCO - São Carlos (Ab = 9.000,00 m²) - abertura das habilitações em 23/04/19 >> data da assinatura do contrato e da ata: 28/06/2019 - Início efetivo da obra: 19/07/2019	**	Concluída (fiscalização Eng. Elétrica FAI)	20/12/2019	Mult Light	reforma instalações elétricas BCO - Ab = 9.000,00 m²	CNO 90.000.98846/70	200.737,65		200.737,65	INSTITUCIONAL

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026			Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios			Posição em :		30/06/2026					
44	1597 + 9557	CONC 10/2017	NANOBIQ/DQ - Conclusão da Obra - (abertura em 23/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do contrato: 05/09/2017	..	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	04/10/2019	MACRO	2.123,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	3.599.056,71		3.599.056,71	CCET
45	10.763 - não Finep	SL 009/2018 (seleção pública)	Reforma do Departamento de Biotecnologia e de Produção Vegetal e Animal - DBPVA (profª Bernadete - predio Central) /PMGCA/Araras - abertura 06/11/18, abertura proposta comercial: 14/11/18 >> JNA assinatura contrato: 14/12/2019 - inicio da obra em 07/01/2019	..	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	27/09/2019	JNA	183,74	CNO 90.000.21841/71	Recurso PMGCA (projeto 10.763) - valor base = R\$ 266.074,70	308.442,27	308.442,27	CCA
46	RESCISÃO	CONC 02/2019 (conv 9557)	LIEP - Conclusão da obra (C. Convite 01/2014) >>> Conclusão do processo de rescisão contratual e emissão do Termo de Recebimento Provisorio datados de 24/10/2019	..	Concluída parcialmente (contrato rescindido) - fiscalização Empresa AGP (conv 9557)	26/09/2019	Costa e Costa Construções	1.043,20	CNO 90.901.26278/76	55.670,48		55.670,48	CCET
47	10.069 - não Finep	SL 010/2018 (seleção pública)	Reforma do PREDIO PMGCA (sede >>>Prof Hermann)/Araras - abertura: 09/11/18; abertura proposta comercial : 14/11/18 >> JNA assinatura contrato: 14/12/2018 - inicio da obra em 07/01/2019	..	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	21/08/2019	JNA	1.306,30	CNO 90.000.21996/70	Recurso PMGCA (projeto 10.763) - valor base = R\$ 285.714,33	426.908,52	426.908,52	CCA
48	1556	CONC 05/2017	BCO - S Carlos - REFORMA (abertura 14/06/17) - Empresa Viasol - assintura do contrato 29/08/2017 inicio efetivo/ata: 11/09/2017	..	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	06/05/2019	Viasol	reforma	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	677.233,68		677.233,68	INSTITUCIONAL
49	1481 + 9557	CONC 17/2017	FINEP 3 e 4 - SOROCABA - conclusão da obra (abertura em 30/10/17) - assinatura c/ a M&G: 15/12/2017 - inicio efetivo da obra em 03/01/2018 - M&G	..	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	29/04/2019	M&G - (CI + Tas + Realinhamento)	2.026,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	4.096.076,28		4.096.076,28	CCTS
50	1556	CONC 07/2017	INFRADEC - 1ª etapa (abertura em 20/06/2017) - empresa Contisa - assinatura do Contrato/Ata: 18/08/2017 - convenio 1556	..	Concluída (fiscalização empresa AGP)	18/04/2019	Contisa	684,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	716.808,79		716.808,79	CCET
51	1556	CONC 03/2018	Reforma Biblioteca de Sorocaba - reabertura em 01/10/18 - empresa vencedora M&G : contratação em 06/11/2018	..	Concluída (fiscalização empresa AGP)	21/03/2019	M & G	Ab Biblias - Sorocaba = 1.686,94 m²	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	218.279,18		218.279,18	CCTS
52	1597	CONC 03/2017	Genética - CGMB-DGE - 1ª etapa (abertura 13/06/17) - Empresa ALPHA - assinatura contrato: 03/10/17	..	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	11/03/2019	ALPHA - (CI + Tas + Realinhamento)	1.150,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.963.835,08		1.963.835,08	CCBS
53	1406+ 1468+ 9557	CONC 09/2017	BIOTROP - Conclusão da obra (abertura em 22/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do contrato: 04/09/2017	..	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	26/02/2019	MACRO	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.814.545,12		1.814.545,12	CCBS
54	1416 + 1481	CONC 07/2016	2ª etapa da obra Lab. FINEP II e III - Araras - Ab = 1.488,60 m² - 1416*01 e 1481*01 (relançamento: abertura da licitação em 21/12/2016 - contrato datado em 03/03/2017 e o inicio efetivo da obra em 20/03/2017 >> conforme ata - empresa Prodex)	..	Concluída (fiscalização FAI)	20/12/2018	Prodex	1.488,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.642.425,62		1.642.425,62	CCA
55	1406 + 9557	CONC 14/2017	CINA - conclusão da obra - abertura 04/10/2017 - assinatura contrato em 27/11/2017 - JNA	..	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	20/12/2018	JNA	634,95	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.136.862,65		1.136.862,65	CCET
56	1406 + 1468 + 9557	CONC 08/2017	NAP - conclusão da obra (abertura em 10/07/2017) - Empresa MACRO - assinatura contrato 15/09/2017	..	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	30/11/2018	MACRO	1.876,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.530.061,93		1.530.061,93	CECH
57	1556	CONC 02/2017	BIOTERIO - 1ª etapa - Ab = 512,34 m². (convenio 1556) - abertura da licitação em 07/03/2017 - empresa ARQCON julgada vencedora em 12/04/2017 - contrato assinado em 26/05/17 e inicio efetivo em 01/06/17	..	Concluída (fiscalização empresa AGP)	14/09/2018	ARQCON	512,34	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.197.829,15		1.197.829,15	CCBS
58	9117 - não Finep	CONC 01/2018	HU - Instalações de Brises do lado oeste - abertura: 15/02/2018 - contrato assinado em 19/03/2018 - Cedro	..	Concluída (fiscalização EBSERH - Eng Fabio)	08/08/2018	CEDRO	instalações brises	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	318.102,99	318.102,99	INSTITUCIONAL
59	1556	CONC 13/2017	IBEV - 1ª etapa (1556) - abertura 06/09/17 - assinatura do contrato c/ BJL: 20/10/17	..	Concluída (fiscalização empresa AGP)	30/07/2018	BJL	661,39	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	461.617,60		461.617,60	CCBS
60	1597	CONC 04/2017	DGR - Nova UGR - 1ª etapa (abertura 12/06/17) - Empresa ARQCON - assinatura do contrato: 02/10/17	..	Contrato rescindido/obra cancelada	27/07/2018	ARQCON	781,66	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	138.021,99		138.021,99	CCBS
61	9317 - não Finep	CONC 16/2017	HU - 3ª licitação >> Execução das Instalações Elétricas - Bloco 02 (Orçamento EBSERH) - abertura 24/10/2017 - MONTAG	..	Concluída (fiscalização EBSERH - Eng Fabio) - Cedro	15/07/2018	MONTAG	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	356.972,24	356.972,24	INSTITUCIONAL
62	9117 - não Finep	CONC 15/2017	HU - 2ª licitação >> Execução para complemento da obra civil do Bloco 02 (Orçamento EBSERH) - abertura 23/10/2017 - Empresa Cedro >> assinatura do contrato: 27/11/2017 - CEDRO	..	Concluída (fiscalização EBSERH - Eng Fabio) - Cedro	26/06/2018	CEDRO	1.881,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	1.023.728,06	1.023.728,06	INSTITUCIONAL
63	1597	CONC 18/2017	3ª etapa do LIEC - Instalações Elétricas (conclusão da obra - conv 1597) - abertura em 09/11/17 - assinatura do contrato: 06/12/2017 - MONTAG	..	Concluída (fiscalização eng eletrica FAI) - MONTAG	24/04/2018	MONTAG	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	172.100,15		172.100,15	CCET
64	1597	CONC 12/2017	Cabine de Força Nanobio (Obra Inst.Eletrica) - abertura em 31/08/17 - inicio efetivo da obra em 03/01/2018 - Sampietro	..	Concluída (fiscalização eng eletrica FAI) - Sampietro	20/04/2018	SAMPIETRO	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	179.974,43		179.974,43	CCET
65	1556	CONC 11/2017	Reforma das instalações elétricas dos 4 predios do CECH - abertura 28/08/17 - assinatura contrato: 22/09/2017 - empresa Nova Meta	..	Concluída (fiscalização eng eletrica FAI) - Nova Meta	16/03/2018	NOVA META	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	121.117,98		121.117,98	CECH
66	1597	CONC 06/2016	2ª etapa da ampliação do Ed. Matemática - Conv 1597*03 (relançamento abertura da licitação em 21/12/2016) - Contrato assinado em 16/01/2017: Ata Inicio de Obra 30/01/2017	..	Concluída (fiscalização FAI)	23/10/2017	CONTISA	955,28	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	359.616,68		359.616,68	CCET

Obras executadas e em andamento - periodo: 2008 à 2026			Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios					Posição em :	30/06/2026				
67	1468	CONC 04/2016	1ª etapa predio MAVLABS /DF c/ 2 pavimentos (GPF 1468) - abertura da licitação: 18/10/2016 (empresa JNA - valor CI = R\$ 934.281,17) - Ata assinada em 09/01/2017	**	Concluída (fiscalização FAI)	26/10/2017	JNA	993,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.006.681,17		1.006.681,17	CCET
68	9817 - não Finep	CONC 02/2016	Hospital Universitário - HU - 1ª licitação - reforma e conclusão de parte do predio - Convenio 9317 - FAI X Sapiens (empresa Pajolla - fiscalização Eng Fabio/EBSERH) - contrato assinado em 14/09/2016	**	Concluída (fiscalização EBSERH)	18/09/2017	PAJOLLA	1.881,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFGAR >> não FINEP	4.955.651,09	4.955.651,09	INSTITUCIONAL
69	1556	CONC 01/2017	Cabine de Força NANOBIO - p/ o predio de 4 pavimentos (conv 1556 - obra civil) - Abertura das habilitações em 23/02/2017 - vencedora empresa Fragalli - contrato assinado em 04/04/2017 - início efetivo da obra: 10/04/2017	**	Concluída (fiscalização FAI)	26/07/2017	FRAGALLI	62,10	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	142.937,38		142.937,38	CCET
70	1468	CONC 05/2016	2 Cabines de Instalações Elétricas p/ o Biotrop e Colmeia - GPF 1468 (abertura da licitação: 15/12/2016 - empresa Sampietro Eng.) - início de obra : 30/01/2017	**	Concluída (fiscalização FAI)	24/07/2017	SAMPIETRO	126,20	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	598.995,25		598.995,25	CCET
71	1597	CONC 01/2016	2ª Etapa do UEC (empresa JNA) - contrato assinado em 03/10/2016 - início efetivo em 17/10/16 - termino previsto 15/04/17 - (houve solicitação de aditivo de prazo por + 60 dias solicitado em 02/02/2017)	**	Concluída (fiscalização FAI)	27/06/2017	JNA	352,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	411.991,00		411.991,00	CCET
72	PRODIN	Contratação Direta (3 orçamentos)	LIEP - contratação da Laje de Piso do 1º pavimento via PRODIN - contrato assinado em 09/01/2017 c/ Habcon - obra concluída (somente escoramento da laje será retirado em 10/03/17)	**	Concluída (fiscalização FAI)	17/02/2017	HABCON	491,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso PRODIN/FAI/DEP - UFGAR	84.635,08	84.635,08	CCET
73	não Finep	CONC 07/2015	Lab Ed. Física e Motricidade Humana - GPF 1325*01 (custo final da obra = soma dos pagamentos à JBS = CONC 22/2013 e dos pagamentos à JNA = CONC 07/2015)	**	Concluída (fiscalização FAI)	21/12/2016	JBS/JNA	1.250,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso CCI 098/2007 >> convenio encerrado em 28/12/2016	4.395.669,24	4.395.669,24	CCBS
74	1468	CONC 01/15	1ª Etapa do Edifício do LIEP (3 pav - em estrutura metálica)	**	Concluída (fiscalização FAI)	08/11/2016	Dalmeta	1.623,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.388.746,65		1.388.746,65	CCET
75	RESCISÃO	CONC 06/2015	3ª Etapa BIOTROP - empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016	**	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	09/09/2016	Zacarelli	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	268.498,51		268.498,51	CCBS
76	RESCISÃO	CONC 03/15	Ampliação Ed. Matemática 1ª etapa - Empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016	**	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	09/09/2016	Zacarelli	955,28	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	744.138,96		744.138,96	CCET
77	RESCISÃO	CONC 05/15	2ª etapa Nanobio - 4 pavimentos (etapa para termino somente de 2 pavimentos) - Empresa Zaccarelli - Obs: contrato rescindido em Ago/2016	**	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	26/08/2016	Zacarelli	1.061,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	202.934,43		202.934,43	CCET
78	1468	CONC 04/15	Reforma MAVLABS - DF - ata início da obra: 15/01/2016	**	Concluída (fiscalização FAI)	09/08/2016	Simieng	170,07	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	254.014,63		254.014,63	CCET
79	1468	TPN 01/2015	3 Cabines de Dados e Voz em S Carlos - GPF 1468*02 (5 ações) - Cabines de Letras, do DECIV e do CCBS	**	Concluída (fiscalização FAI)	07/04/2016	**	180,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	230.994,10		230.994,10	INSTITUCIONAL
80	1406	CV 06/15	Reforma do Laboratório de Controle Ambiental 01 (Edifício nº 75 - DEQ)	**	Concluída (fiscalização FAI)	23/02/2016	**	132,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	65.752,77		65.752,77	CCET
81	não Finep	SL 001/2015	2º Predio Administrativo FAI (FAI 02) - recursos proprios	**	Concluída (fiscalização FAI)	17/12/2015	**	379,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso FAI >> não FINEP	1.128.932,54	1.128.932,54	FAI (2º predio administrativo)
82	1406	CONC 23/13	4ª etapa do DEQ - São Carlos (empresa JBS)	**	Concluída (fiscalização FAI)	10/09/2015	**	1.542,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.352.990,00		1.352.990,00	CCET
83	1406	CONC 03/14	2ª. Etapa do NAP	**	Concluída (fiscalização FAI)	16/06/2015	**	1.876,75	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.343.697,06		1.343.697,06	CECH
84	1406	CONC 21/13	Construção da 1ª etapa - COLMEEA	**	Concluída (fiscalização FAI)	24/04/2015	**	1.242,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.497.468,67		1.497.468,67	INSTITUCIONAL
85	RESCISÃO	CONC 19/13	1ª etapa Finep II e III de Araras - (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato - CONC 019/2013 - foi revogado - Valor Pago até 27/02/15 = R\$ 230.064,26)	**	Concluída parcialmente (contrato rescindido)	27/02/2015	JBS	1.488,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	230.064,26		230.064,26	CCA
86	RESCISÃO	CONC 02/14	Construção 2ª etapa BIOTROP (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato foi revogado)	**	Concluída parcialmente (contrato rescindido)	27/02/2015	**	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	333.191,92		333.191,92	CCBS
87	*	CONC 07/14	Reforma dos Lab. DEQ - predios 34 e 34B	**	Concluída (fiscalização FAI)	25/10/2014	**	122,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	136.357,22		136.357,22	CCET
88	1481	CONC 15/13	1ª etapa FINEP 3 e 4 - Sorocaba - empresa JBS - Fiscal Cassio/Sorocaba	**	Concluída (Fiscal - Eng Cassio - Sorocaba)	05/09/2014	**	2.026,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	2.288.577,36		2.288.577,36	CCTS
89	1406	CONC 16/13	Execução de Rede Compacta e Subterrânea - Transfederonica - S Carlos	**	Concluída	14/07/2014	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	712.637,48		712.637,48	INSTITUCIONAL
90	*	TPN 010/13	Cabine de Força - Araras (p/ atender os predios FINEP 1, 2 e 3) - Eletro Pires - Fiscal Arquelaui	**	Concluída	13/07/2014	**	52,56	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	173.531,61	34.252,17	207.783,78	CCA
91	1406	CONC 17/13	Construção 1ª etapa do CINA - S Carlos	**	Concluída	25/06/2014	**	634,95	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	570.243,23		570.243,23	CCET
92	1295*03 + 1551*01	CONC 13/13	2ª Etapa Ecotoxicologia - Araras - Empresa JBS - Fiscal Arquelaui	**	Concluída	29/05/2014	**	746,32	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	610.974,12	167.540,49	778.514,61	CCA


Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026					Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios					Posição em :		30/06/2026			
93		DL 04/11	Predio Sede - PMGCA - Araras	**	Concluída	05/05/2014	**	1.306,30	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos PMGCA	3.116.398,39	3.116.398,39			
94	1371	CONC 05/12	Construção 1ª etapa BIOTROP (Empresa Zaccarelli)	**	Concluída	24/01/2014	**	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.364.445,15		1.364.445,15	CCBS		
95	*	CONC 12/13	Construção da 1ª etapa do LIEC - Prof Ernesto DQ	**	Concluída	30/12/2013	**	352,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	441.352,11		441.352,11	CCET		
96	1371	CONC 11/13	Construção Ed Núcleo de Apoio a Pesquisa - NAP - 1ª etapa	**	Concluída	08/12/2013	**	1.876,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.134.734,26		1.134.734,26	CECH		
97	*	CONC 03/11	Construção Lab Educ. Especial – 1ª etapa - Psicologia - CONC 003/11	**	Concluída	12/11/2013	**	1.121,75	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	711.142,24	1.079.573,93	1.790.716,17	CECH		
98	*	CONC 10/13	Reformas e adequações LIDEPS (edif 23, 25 e 15B)	**	Concluída	20/10/2013	**	578,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	607.801,60		607.801,60	CECH		
99	1406	CONC 01/13	3ª Etapa do DEQ - Inst. Elétricas	**	Concluída	17/10/2013	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	456.579,02		456.579,02	CCET		
100	1295*03 + 1551*01	CONC 04/12	Construção Lab. Biotecnologia e Ecotoxicologia, 1ª Etapa - Araras - ENGE REIS - fiscal Pavan	**	Concluída	21/06/2013	**	746,35	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	438.288,87	3.235,04	441.523,91	CCA		
101	*	TPN 01/12	Reforma da Cobertura do Edifício LCE	**	Concluída	27/05/2013	**	388,32	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	199.693,87	145.943,52	345.637,39	CCET		
102	1202	CONC 02/12	Construção 1ª etapa Nanobio - DQ - 4 pav	**	Concluída	16/05/2013	**	2.123,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.180.644,82	402.240,41	1.582.885,23	CCET		
103	*	TPN 011/12	2ª Etapa Cabine da SIn -	**	Concluída	08/02/2013	**	62,21	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	151.409,56		151.409,56	INSTITUCIONAL		
104		CONC 01/2009	1ª Etapa do Centro de Pesquisa / Petrobras (convenio 1202*02 - Prof Ernesto Urqueta)	**	Concluída	31/01/2013	**	3.600,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos PETROBRAS	7.704.956,35	7.704.956,35	CCET		
105	1287 + 1202 + 1550	CONC 04/11	Construção 2ª Etapa DEQ + Entorno - CONC 004/11	**	Concluída	22/10/2012	**	1.542,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	340.943,27	137.760,56	478.703,83	CCET		
106	*	TPN 09/11	Construção de cabine primária - SIN - 1ª Etapa	**	Concluída	03/05/2012	**	62,21	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	104.066,58		104.066,58	INSTITUCIONAL		
107	*	TPN 07/11	Modernização Cab. Entrada E. Elétrica	**	Concluída	07/04/2012	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	50.299,70		50.299,70	CCA		
108	1325 (CCI) + 1371 + 1406	CONC 05/10	Construção da cobertura do Edifício da Matemática - conv 1325/CCI nº 098/2007 = R\$ 1.374.516,77 + conv 1371/FINEP = R\$ 390.000,00 + 1406/FINEP = R\$ 877.433,68	**	Concluída	04/03/2012	**	3.276,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.267.433,68	1.374.516,77	2.641.950,45	CCET		
109	*	TPN 08/11	Reforma da Rede de Média Tensão em Araras	**	Concluída	15/01/2012	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	21.404,67		21.404,67	CCA		
110	*	CONC 01/11	Reforma e Ampliação do Lab. de Alta Pressão - DEQ	**	Concluída	15/12/2011	**	34,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	86.233,89		86.233,89	CCET		
111	*	CONC 01/10	Acabamento e Instalações do ATLab - Sorocaba - / GROUT	**	Concluída	20/09/2011	**	8.740,08	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	677.312,79	3.393.538,92	4.070.851,71	CCTS		
112	*	CN 03/11	Execução e Conclusão da rede de Telefonia e Dados do Laboratorio	**	Concluída	03/07/2011	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	49.984,44		49.984,44	CCET		
113		CONC 04/2009	Fundação e Estrutura Pre Fabricada do Ed Matemática - empresa PROTENDIT - CCI 098/2007 - - GPF 1325 - 01	**	Concluída	17/02/2011	Protendit	3.276,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos CCI 098/2007 (não FINEP)	2.120.582,97	2.120.582,97	CCET		
114	*	TPN 017/08	Reforma Lab do Ed 51 - CCET - Depto Física (Unimaz)	**	Concluída	25/10/2010	**	617,17	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI		374.014,00	374.014,00	CCET		
115	*	CONC 04/08	Ed. DEQ - 1ª etapa	**	Concluída	03/01/2010	**	1.534,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.511.883,44		1.511.883,44	CCET		
116	*	CONC 06/08	Ed. Fisioterapia - 1ª etapa - fundação e estrutura pré moldada	**	Concluída	25/07/2009	**	3.300,55	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.990.281,10	12.000,00	2.002.281,10	CCBS		
117	*	TPN 06/08	Lab Pesquisa de Exatas - Sorocaba - 2ª Etapa	**	Concluída	23/05/2009	**	528,91	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	357.860,17	242.477,33	600.337,50	CCTS		
118	*	CN 03/08	Reforma e Ampliação Lab Controle Ambiental - DEQ	**	Concluída	16/02/2009	**	132,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	120.378,58		120.378,58	CCET		
119	*	Dis 01/08	Reforma e Ampl. Lab. Engº Bioquímica - DEQ (CN 010/08)	**	Concluída	17/01/2009	**	110,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	48.508,76	18.466,44	66.975,20	CCET		
120	*	TPN 016/07	Obras/Reformas Ed 51 e 52 - Depto Física	**	Concluída	03/10/2008	**	2.086,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	617.830,65		617.830,65	CCET		

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026					Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios			Posição em :	30/06/2026				
121	*	CN 017/08	Reforma Lab do Ed 53 - Depto Fisica	**	Concluida	12/09/2008	**	250,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	22.974,72		22.974,72	CCET
122	*	TPN 02/07	Lab Pesquisa Sorocaba - Fundações/Estrutura - 1ª Etapa	**	Concluida	21/03/2008	**	528,91	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	299.849,56		299.849,56	CCTS
123	*	TPN 008/07	Lab Microscopia Elettronica/Conclusão - S Carlos	**	Concluida	11/03/2008	**	434,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	404.405,31		404.405,31	CCET
Tt =								96.962,57		79.615.454,06	46.824.796,55	126.440.250,61	


Posição: 30/06/2026

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026			
Convenios FINEP =		R\$	% rel
Recursos CCIs / Próprios/Outras Fontes =		79.615.454,06	62,97%
Total (R\$) =		46.824.796,55	37,03%
		126.440.250,61	100,00%

+++++




Posição em : 30/06/2026		
ano	Obras Concluidas/Licitadas/em andamento - (R\$/ano)	
2008 - concluidas	1.345.060,24	
2009 - concluidas	2.789.972,38	
2010 - concluidas	1.885.897,44	
2011 - concluidas	6.327.653,01	
2012 - concluidas	3.296.425,23	
2013 - concluidas	14.657.595,60	
2014 - concluidas	9.174.957,22	
2015 - concluidas	5.886.344,45	
2016 - concluidas	7.550.749,29	
2017 - concluidas	7.560.507,65	
2018 - concluidas	8.278.814,79	
2019 - concluidas	14.077.593,76	
2020 - concluidas	6.264.422,07	
2021 - concluidas	3.331.587,61	
2022 - concluidas	5.982.373,49	
2023 - concluidas	4.465.099,12	
2024 - concluidas	4.519.329,69	
2025 - concluidas	6.552.488,28	
2026 - concluidas	1.217.868,59	
2026 - em andamento	4.345.817,74	
2026 - em licitação/prazo recursal	63.831,19	
2026 - em fase de contratação	3.965.861,77	
2026 - em montagem de edital	-	
2026 - em orçamentação	2.900.000,00	
Tt Geral - R\$	126.440.250,61	

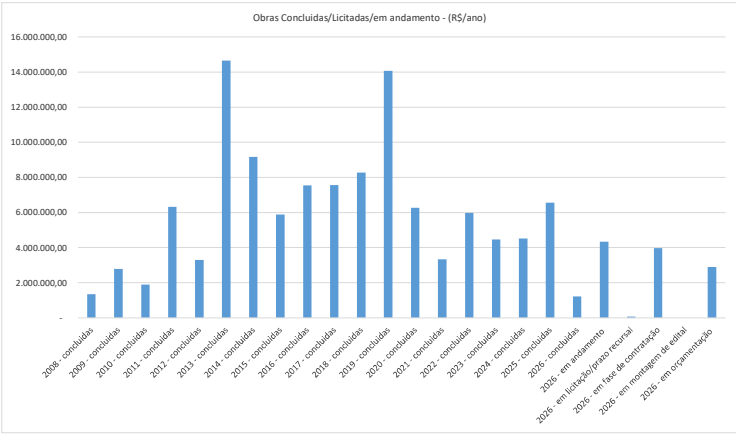

ano	Agrupamento de Obras Concluidas e/ou em andamento (R\$/ano)
2008	1.345.060,24
2009	2.789.972,38
2010	1.885.897,44
2011	6.327.653,01
2012	3.296.425,23
2013	14.657.595,60
2014	9.174.957,22
2015	5.886.344,45
2016	7.550.749,29
2017	7.560.507,65
2018	8.278.814,79
2019	14.077.593,76
2020	6.264.422,07
2021	3.331.587,61
2022	5.982.373,49
2023	4.465.099,12
2024	4.519.329,69
2025	6.552.488,28
agrupadas 2026	12.493.379,29

+++++

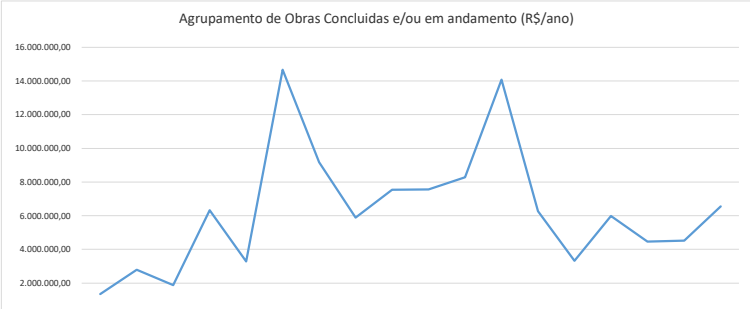


 Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026		Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios		Posição em : 30/06/2026																					
<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Tt Geral - R\$</td><td>126.440.250,61</td></tr></table>				Tt Geral - R\$	126.440.250,61	-	<table><tr><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr></table>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tt Geral - R\$	126.440.250,61																								
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								

Obs 01: Área Construída/Licitada por ano

ano	Área Construída - concluídas e/ou licitadas (m²) por ano
2008	3.298,91
2009	4.071,46
2010	1.534,60
2011	8.774,08
2012	4.880,73
2013	10.848,50
2014	6.562,36
2015	8.203,10
2016	7.046,08
2017	4.861,95
2018	7.837,64
2019	10.191,07
2020	2.731,10
2021	2.021,00
2022	2.854,59
2023	2.251,89
2024	4.053,86
2025	1.405,39
2026 - concluída	-
2026 - em andamento	321,51
2026 - em contratação	-
2026 - em licitação	908,52
2026 - em orçamentação	-

>>>>>>

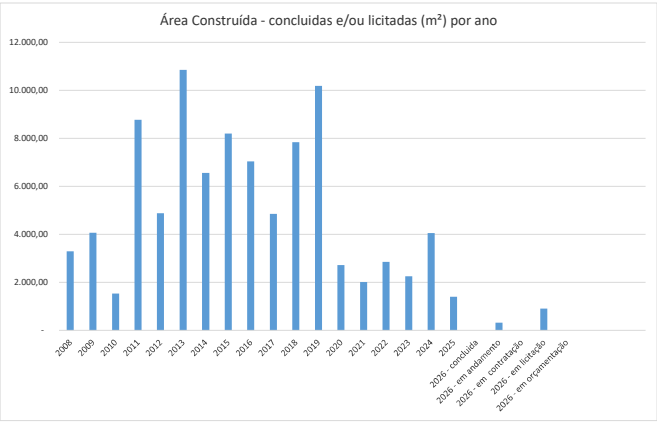

Obs 02: Propostas apresentadas em Editais:

item	tipo	obra/serviço de engenharia	edital	valor estimado (R\$)
1	Obra	Predio CEPAR - Campus Lagoa do Sino	FINEP 2025	R\$ 4.412.569,26
2	Projeto Executivo	Projetos Executivos para o Predio CeMPIE (DEMEC/DEE) - Campus S Carlos	FINEP 2025	R\$ 391.606,24

R\$ 4.804.175,50
