

Convenio FAI - Nº	Convenio FINEP - Nº	data assinatura do convenio	obs
1416	01.09.0476.00	09/10/2009	Encerrado: RTF >> Set 2021
1481	01.11.0055.00	23/03/2011	Encerrado: RTF >> Jul/2022
1406 >> Sapiens 1105	01.09.0354.00	09/09/2009	Encerrado: RTF >> Few/23
Sapiens 11.417	01.18.0153.00 (C Convite 01/2018)	18/12/2018	Encerrado: RTF >> Out 2023
1597 >> Sapiens 1158	01.12.0510.00	21/12/2012	Encerramento em Dez/23 com RTF enviado em Abr/2024
1468 >> Sapiens 1549	01.10.0625.00	01/12/2010	Encerramento em 01/12/2024 - RTF fev/2025
Sapiens - 15.796	01.23.00635.00 - UFVx prédio Deciv	confirmar data de assinatura	Encerramento em 01/12/2024 - RTF fev/2025
Sapiens - 11.542	01.19.0189.00 (CTINFRA 03/2018 - Reformas 8 Biotérios de Apoio)	20/12/2019	Encerramento em 01/02/2025 - RTF abr/2025
1556 >> Sapiens 595	01.12.0048.00	09/02/2012	Encerramento em 09/02/2025 - RTF abr 2025
Sapiens - 9557	01.16.0014.00 (C.Convite 01/2014)	19/04/2016	Encerramento em 09/02/2025 - RTF abr 2025
Sapiens - 15.481	01.23.0061.00 -(CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS)	26/06/2023	encerramento: 26/06/2025
Sapiens - 15.053	01.22.0389.00 UFSCARXPS - Espectroscopia de Fotóelétrons Excitados por Raios X e suas Aplicações em Ciência de Materiais	confirmar data de assinatura	encerramento: 14/06/2025

It	conv FAI	Licitação	Descrição/obra	Status da licitação/estágio da obra/planejamento 2024	Empresa Contratada/conclusão da etapa /obra	previsão de entrega da obra/empresa	Área Efetiva e/ou equivalente (m²)	nº CNO / INSS	Recursos FINEP / contratado - (R\$)	Outras Fontes (Projetos e/ou Próprios) - (R\$)	V Total Contratado (C1 + TAs)	centro vinculado
1	10763 (não FINEP)	CONC xx/2025?	Centro Esportivo de Araras	Em montagem de Edital	empresa: ??	6 meses	Área Equivalente?	Cadastro no CNO será via UFSCAR	10763 (não FINEP)	3.460.000,00	3.460.000,00	CCA
2	Conta 2930	Contrato Administrativo 17/2024	Ampliação Predio FAI 01 (c/ 2 pavimentos) - V Base = R\$ 1.601.150,38 - Valor CI = R\$ 1.319.942,57 - Contrato assinado em 05/08/2024 e Início da Obra em 22/08/2024	Em Andamento - Fiscalização Engenharia FAI (civil e elétrica)	Empresa: CS Engenharia	jun-25	321,51	Cadastro no CNO será via UFSCAR	Conta 2930 (Não FINEP)	1.319.942,57	1.319.942,57	Ampliação FAI 01
3	Prodin - nº 02/2023 - Conv. 15.750	CONC 03/2024	Conclusão do Predio DeMEC x PROXIND (licitação via FAI) - V Base = R\$ 2.009.646,69 - abertura em 15/05/2024 - Valor do CI = R\$ 1.730.000,00 - Assinatura do CI: 24/06/2024 - Início da Obra: 01/07/2024	Em Andamento (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Elétrica FAI)	Empresa: Bouvele Construtora (CI + 1ª TA)	abr-25	527,12	Cadastro no CNO será via UFSCAR	Prodin - nº 02/2023 - Conv. 15.750	1.863.666,69	1.863.666,69	CCET
4	Recursos FAI	Contrato Administrativo CD 06/2024	Contratação de Anteprojeto para Renaturalização da Área do Lago da UFSCAR (Barragem) - Campus São Carlos - CI = R\$ 318.400,00	Fiscal de Contrato: equipe da SeGEF	Empresa: Silva Leme Engenharia Ltda.	abr-25	Anteprojeto - Barragem - Campus São Carlos	CI = R\$ 318.400,00	Recursos FAI	**	**	Campus São Carlos (anteprojeto)
5	Não FINEP - conv 13.840	CONC 02/2024 (Projetos Executivos Campus Lagoa do Sino)	Contratação Projetos Executivos - Lagos do Sino/SeGEF - (Coordenadora Profª Luciana SeGEF) - V Base = R\$ 528.846,95 - abertura em 24/05/2024 - Valor do CI = R\$ 475.948,86 - contrato assinatura em: 25/07/2024	Fiscal de Contrato: equipe da SeGEF	Empresa: KAN ARCHITECTEN - SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	fev-25	Ab = 2.000,00 m² (n/e)	CI = R\$ 475.948,86	Contratação de Projetos Executivos Conv. 13.840 (não FINEP)	**	**	Campus Lagoa do Sino (Projetos Executivos)
6	1556 e 9557	CONC 01 /2023	Conclusão do BIOTERIO CENTRAL - V Base = R\$ 3.888.259,87 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R\$ 3.498.267,83 >> Contratação em 11/10/2023 e Início da Obra em 30/10/2023	Em Andamento (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI) e Fiscalização da Granuzzo Marçal a partir de 19/03/24	Empresa: JNA (CI + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA + 4ª TA)	fev-25	512,34	Cadastro no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	4.114.833,48		4.114.833,48	CCBS
7	11.542	CONC 05/2024	Reforma de 6 Biotérios de Apoio (Predio DCF) = V Base = R\$ 209.092,98 - abertura em 27/05/2024 - Contrato assinado em 23/07/2024 e Início de Obra em 23/07/2024 - Final do contrato: 31/01/2025	Concluída (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Elétrica FAI)	31/01/2025 (Termo de Recebimento Provisório: xxx/2025)	Empresa: UMPLEER Engenharia	70,93	Cadastro no CNO será via UFSCAR	215.983,85		215.983,85	CCBS
8	15.053	CONC 04/2024	Reforma LCE - Prof Botta - V Base = R\$ 299.898,29 - abertura em 23/05/2024 - Contrato assinado em 12/08/2024 e Início de Obra em 26/08/2024 - Final do contrato: 31/01/2025	Concluída (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Elétrica FAI)	31/01/2025 (Termo de Recebimento Provisório: xxx/2025)	Empresa: UMPLEER Engenharia	295,00	Cadastro no CNO será via UFSCAR	298.598,98		298.598,98	CCET
9	1556	CONC 02 /2023	Conclusão do INFRATEC - V Base = R\$ 2.299.198,97 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R\$ 1.839.355,85 >> Contratação em 11/10/2023 e Início da Obra em 30/10/2023	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Elétrica FAI)	06/12/2024 (Termo de Recebimento Provisório: 23/01/2025)	Empresa: JNA	684,60	Cadastro no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	2.179.368,96		2.179.368,96	CCET
10	15.481	CONC 01/2024	Reforma do Laboratorio LMBBM (DCF - Profa Heloisa) - V base R\$ 224.897,41 >> abertura das Propostas: 16/02/2024 - Assinatura do CI em 16/04/2024 - Início da Obra em 02/05/2024	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Elétrica FAI)	30/10/2024 (Termo de Recebimento Provisório: xxx/2024)	Empresa: CS	85,21	Cadastro no CNO será via UFSCAR	231.010,69		231.010,69	CCBS
11	Mão FINEP - conta FAI 2930	Contrato CD 11/2024	Rede Elétrica - Alimentação - Predio INFRATEC - V Base = R\$ 166.811,70	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Elétrica FAI)	03/09/2024 (Termo de Recebimento Provisório: xxx/2024)	Empresa: JNA	Rede Elétrica Aérea	**	Conta FAI 2930 (Não FINEP)	164.994,61	164.994,61	CCET
12	1468 + 9557	CONC 03 /2023	Inclusão Rota de Fuga/Passarela BIOTROP - V Base = R\$ 739.008,09 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R\$ 590.047,17 >> Contratação em 11/10/2023 e Início da Obra em 30/10/2023	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI) e Fiscalização da Granuzzo Marçal a partir de 19/03/24	23/08/2024 (Termo de Recebimento Provisório: 24/09/2024)	Empresa: JNA (CI + 1ª TA + 2ª TA)	120,00	Cadastro no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	715.783,93		715.783,93	CCET
13	1556	CONC 03/2022	Reforma das Instalações Elétricas - Predios do DEMA - Valor Base = R\$ 1.136.888,00 - Abertura das habilitações em 20/01/2023 - Abertura das propostas: 06/03/2023 >> Início efetivo da Obra: 13/03/2023	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Elétrica FAI)	07/03/2024 (Termo de Recebimento Provisório: 28/05/2024)	Empresa: Andre Hoffman Rodrigues - ME (CI + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA + 4ª TA + 5ª TA)	3.164,05	Cadastro no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	1.228.171,50		1.228.171,50	CCET
14	Conv 13.840 - não FINEP	CONC 02/2022	Lab Multiusuario - CCN - Campus Lagoa do Sino = Valor Base = R\$ 1.780.675,87 - abertura das Habilitações: 30/05/2022 - Abertura das propostas comerciais em 07/06/2022 >> Valor do CI = R\$ 1.756.863,43 >> contratação em 28/06/2022 e Início da obra em 21/07/2022	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	30/10/2023 (Termo de Recebimento Provisório: 14/12/2023)	Sate Tecnologia e Serviços Ltda >> CI + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA + 4ª TA de prazo administrativo + 30 dias	256,61	Cadastro no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	Conv 13.840 (Lagoa do Sino) >> não FINEP	1.693.215,21	1.693.215,21	Campus Lagoa do Sino

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024		Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios			Posição em:	31/01/2025						
15	Conv 14.056 (nbo Finep)	SL 02 /2023	Reforma das Instalações Elétricas - Predio CCDD (prof Guilherme Koga) - V Base = R\$ 160.550,90 - Abertura Habilitações: 02/05/23 - Abertura propostas: 12/05/2023 - Assinatura do contrato: 05/06/2023 >>> Início Obra: 19/06/2023	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Elétrica FAI)	06/10/2023 (Termo de Recebimento Provisório: 20/10/2023)	Empresa: Andre Hoffman Rodrigues - ME (CI + 1º TA)	1.040,00	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	Conv 14.696 (nbo Finep)	122.676,27	122.676,27	CCET
16	Conv 14.200 (nbo Finep)	Contrato CD nº 012/2022	Acesso viário da EE de Valparaíso (RTI 14.200) - Valor Base = R\$ 800.202,26 (SL 05/2022 - Desista novamente em 23/09/2022) - Ata de início de obra assinada em 23/12/2022 >>> Início efetivo da obra: 18/01/2023	Concluída (fiscalização: empresa Hortolani & Avellar - Eng. Pedro Hortolani)	Conclusão em 24/04/23	Noroeste Paulista >>> CI + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA	Extensão de 1,2 Km (nó) c/ área = 7.561,45 m²	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAII!	Conv 14.200 (RTI) - não Finep (venc 24/04/2023)	859.190,70	859.190,70	EE Valparaíso
17	1597 + 11.417	CONC 03/2021	Conclusão da Ampliação do Lab. de Pesq. em Matemática, com 2 pavimentos e 955,28 m2 - LPGDM (1597) >>> V Base = R\$ 1.651.730,76 >>> Abertura das Habilitações em 25/08/2021 >>> Abertura das propostas em 17/09/21 >>> Valor CI = R\$ 1.398.985,27,>>> contratação em 18/11/2021 >>> início da obra em 06/12/2021	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	03/03/2023 (Termo de Recebimento Provisório : 13/03/2023)	JNA >>> CI + 1º TA + 2º TA + 3º TA + 4º TA + Reequilíbrio em fev/23	955,28	CNO 90.009.24350/76	1.790.016,94	1.790.016,94	CCET	
18	Conv 14.379 - nbo Finep	Pregão nº 19/2022 (Campus Araras)	Serviço de Cercamento do Campus de Araras - Valor Base = R\$ 659.677,65 >>> Abertura do Pregão: 29/03/2022 - Valor CI = R\$ 546.888,00 - assinatura do contrato e início de obra em 18/04/2022	Concluída (fiscalização empresa CONSTRIX - Arq. Nickolas)	15/11/2022	Empresa AURUS	Comprimento do Cercamento = 2.072,87 m	Serviço isento de cadastramento no CNO	Conv 14.199 (Araras) >>> não FINEP	569.422,14	569.422,14	CCA - Araras
19	1597 + 11.417	CONC 02/2021	Genética - Conclusão da obra (conv. 1597 e 11.417) - V.Base: R\$ 1.644.024,63 - data base: Dez/20) - Abertura das habilitações: 19/04/21; Abertura das Propostas: 13/05/2021 >>> Contratação em 30/07/2021 (CI = R\$ 1.362.675,13) - início efetivo da obra: 1º/08/2021	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	16/09/2022 (Termo de Recebimento Provisório : 04/10/2022)	JNA - (CI + Reequilíbrio Contratual + 1º TA + 2º TA + 3º TA + 4º TA ADM + 5º TA)	1.150,00	CNO 90.005.21881/70 (mesmo da CONC 03/2020 - rescindida)	1.678.077,24	1.678.077,24	CCBS	
20	1556 + 11.417	CONC 01/2021	IBEV - Conclusão da Obra - Ab = 661,39 m2 (V. Base = R\$ 1.326.840,02 - out/20) - Abertura das habilitações: 05/02/2021; Abertura das Propostas Comerciais: 16/03/2021 - data da assinatura: 14/04/2021 - Valor do CI = R\$ 1.066.196,22 >>> início efetivo da obra: 03/05/2021	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	29/04/2022 (Termo de Recebimento Provisório: 06/06/2022)	GG Ribeirão Construções (CI + 1º TA + Reequilíbrio + 2º TA)	661,39	CNO 90.006.65986/77	1.233.807,72	1.233.807,72	CCET	
21	REVOGADO	Pregão Eletrônico 072/2021 (Prodin 02/2020 - TED/MEC 8891)	Serviço para Ampliação do Parque de Usinas Fotovoltaicas - 2 UFVs c/ PI = 447,12 KWp (Estacionamentos AT 07 e Petros) - Prodin 02/2020 - conv. 13.369 - Valor Base = R\$ 1.796.080,43 >>> abertura 22/10/2021 >>> Valor Contratado/Empresa GC = R\$ 1.409.998,99	Pregão 072/2021 - Revogado	31/03/2022 (072/2021 revogado) (PE)	Empresa GS	Cobertura de Estacionamentos A = 2.116,00 m²	**	Conv 13.369 (Prodin 02/2020) >>> não FINEP	0,00	-	Institucional
22	9557	CONC 03/2019	LIEP - Conclusão da obra (C. Convênio 01/2014) - abertura em 19/12/2019 >>> abertura das propostas: 28/02/20 >>> data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >>> empresa GRIFFO >>> início efetivo em 25/05/2020 (CI = R\$ 2.115.230,03)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	OBS 01: TR Provisório PARCIAL: 01/12/2021 > OBS 02 - TR Provisório INTEGRAL: 20/05/2022	GRIFFO (CI + 1º TA + 1º TA Reequilíbrio + 1º TA Realinhamento + 2º TA + 6º TA)	1.043,20	CNO 90.001.26278/76 (Será o mesmo da CONC 02/2019 rescindida)	2.501.066,39	2.501.066,39	CCET	
23	1468 + 9557	CONC 06/2018	MAVLABS - conclusão da obra - abertura das habilitações ocorreu em 02/12/2019 - abertura das propostas em 18/12/2019 - data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >>> empresa JNA (CI = R\$ 2.167.534,88)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	05/10/2021 (Termo Recebimento Provisório: 27/10/2021)	JNA (CI + 1º TA Reequilíbrio + 1º TA)	993,50	CNO 90.003.49850/60 (está em nome Jomar - 27/05/20)	2.424.437,45	2.424.437,45	CCET	
24	1597	CONC 01/2020	Reforma da UGR - DQ - (ilha) - predio 68A - Lab de Destilação (Ab = 100,98 m²) - data de assinatura do contrato/início de obra: 16/09/2020 (CI = R\$ 248.853,55)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	27/08/2021 (Termo Recebimento Provisório: 08/08/2021)	JNA (CI + 1º TA Reequilíbrio + 1º TA + 3º TA)	100,98	CNO 90.004.75553/75	290.706,79	290.706,79	CCET	
25	1597	CONC 02/2020	Reforma da UGR/DeGR - predio 114D + depósito existente (Ab = 163,60 m²) + Ampliação da UGR/DeGR (Ab = 82,00m²) - data da assinatura do contrato/início de obra: 16/09/2020 (CI = R\$ 375.561,02)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	27/07/2021 (Termo Recebimento Provisório: 23/08/2021)	JNA (CI + 1º TA de Reequilíbrio + 1º TA)	245,60	CNO 90.004.75591/77	616.443,37	616.443,37	CCET	
26	RESCISÃO	CONC 04/2020	Reforma das Instalações Elétricas - Predios do DEMA - abertura das propostas comerciais em 30/09/20 - data da assinatura do contrato: 17/11/2020 - data Início de obra: 02/12/2020 - Valor CI = R\$ 844.875,01	Rescisão contratual realizada em 11/03/2021 (conv 1556)	11/03/2021	Nasman (Rescindido)	**	CNO 90.005.21881/70	0,00	-	CCET	
27	REVOGADA	SL 015/2020 (nbo FINEP)	PMGCA - Lab Sala de Sementes - abertura das habilitações: 24/11/2020 - Valor Base = R\$ 842.992,49 - data base Jul/20 - Convenio 10.763 (nbo Finep)	Seleção Pública revogada em 09/03/2021	09/03/2021	Contratação Revogada	**	**	Convenio 10.763 (recursos privados) - não Finep	0,00	-	CCA
28	RESCISÃO	CONC 03/2020	Genética - Conclusão da obra (conv. 1597 e 11.417) - Valor Base = R\$ 1.473.262,94 (Fev/20)-data de assinatura do contrato: 21/10/2020 - início da obra: 05/11/2020. Valor do Contrato Inicial = R\$ 1.096.140,00	Rescisão contratual realizada em 11/03/2021 (conv. 1597 + 11.417)	11/03/2021	Nasman (Rescindido)	**	CNO 90.005.04383/79	0,00	-	CCBS	
29	1481 + 9557	CONC 04/2018	FINEP 2 e 3 de Araras (unificados) - conclusão da obra - abertura da licitação 31/01/2019, abertura das propostas em 13/03/2019 e assinatura do contrato em 16/05/19	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	08/09/2020	JNA	1.488,60	CNO 90.000.62787/78	3.361.724,32	3.361.724,32	CCA	
30	9557	CONC 05/2018	COLMEEA - conclusão da obra - abertura da licitação 31/01/2019; abertura das propostas: 26/02/19; assinatura do contrato em 21/05/19	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	04/09/2020	Nasman	1.242,50	CNO 90.000.63999/75	2.902.697,75	2.902.697,75	INSTITUCIONAL	
31	1556	CONC 01/2019	Reforma das Instalações Elétricas da BCO - São Carlos (Ab = 9.000,00 m²) - abertura das habilitações em 23/04/19 >>> data da assinatura do contrato e da ata: 28/06/2019 - Início efetivo da obra: 18/07/2019	Concluída (fiscalização Eng. Elétrica FAI)	20/12/2019	Mult Light	reforma instalações elétricas BCO - Ab = 9.000,00 m²	CNO 90.000.98846/70	200.737,65	200.737,65	INSTITUCIONAL	
32	1597 + 9557	CONC 10 /2017	NANOBIODQ - conclusão da Obra - (abertura em 23/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do contrato: 05/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	04/10/2019	MACRO	2.123,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	3.599.056,71	3.599.056,71	CCET	
33	SL 009/2018 (seleção pública)	Reforma do Departamento de Biotecnologia e de Produção Vegetal e Animal - DBPVA (prof. Bernadete - predio Central) PMGCA/Araras - abertura 06/11/18, abertura proposta comercial: 14/11/18 >>> JNA assinatura contrato: 14/12/2019 - início da obra em 07/01/2019	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	27/09/2019	JNA	183,74	CNO 90.000.21841/71	Recurso PMGCA (projeto 10.763) - valor base = R\$ 266.074,70	308.442,27	308.442,27	CCA	
34	RESCISÃO	CONC 02/2019 (conv 9557)	LIEP - Conclusão da obra (C. Convênio 01/2014) >>> Conclusão do processo de rescisão contratual e emissão do Termo de Recebimento Provisório datados de 24/10/2019	Concluída parcialmente (contrato rescindido) - fiscalização Empresa AGP (conv 9557)	26/09/2019	Costa e Costa Construções	1.043,20	CNO 90.901.26278/76	55.670,48	55.670,48	CCET	
35	SL 010/2018 (seleção pública)	Reforma do PREDIO PMGCA (sede >>>Prof Hermann)Araras - abertura: 09/11/18; abertura proposta comercial : 14/11/18 >>> JNA assinatura contrato: 14/12/2018 - início da obra em 07/01/2019	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	21/08/2019	JNA	1.306,30	CNO 90.000.21996/70	Recurso PMGCA (projeto 10.763) - valor base = R\$ 285.714,33	426.908,52	426.908,52	CCA	
36	1556	CONC 05 /2017	BCO - 5 Carlos - REFORMA (abertura 14/06/17) - Empresa Viasol - assinatura do contrato 29/08/2017 início efetivo/ata: 11/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	06/05/2019	Viasol	reforma	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	677.233,68	677.233,68	INSTITUCIONAL	

4.465.099,12


Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024		Obras CT/INFRA/FINEP e/ou Outros Convenios		Posição em: 31/01/2025								
37	1481 + 9557	CONC 17/2017	FINEP 3 e 4 - SOROCABA - conclusão da obra (abertura em 30/10/17) - assinatura c/ a M&G: 15/12/2017 - início efetivo da obra em 03/01/2018 - M&G	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	29/04/2019	M&G - (CI + TAs + Realinhamento)	2.026,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	4.096.076,28	4.096.076,28	CCTS	
38	1556	CONC 07/2017	INFRADEC - 1ª etapa (abertura em 20/06/2017) - empresa Contisa - assinatura do Contrato/Ata: 18/08/2017 - convenio 1556	Concluída (fiscalização empresa AGP)	18/04/2019	Contisa	684,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	716.808,79	716.808,79	CCET	
39	1556	CONC 03/2018	Reforma Biblioteca de Sorocaba - reabertura em 01/10/18 - empresa vencedora M&G : contratação em 06/11/2018	Concluída (fiscalização empresa AGP)	21/03/2019	M & G	Ab Biblias - Sorocaba = 1.686,94 m²	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	218.279,18	218.279,18	CCTS	
40	1597	CONC 03/2017	Genética - CGMB-DGE - 1ª etapa (abertura 13/06/17) - Empresa ALPHA - assinatura contrato: 03/10/17	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	11/03/2019	ALPHA - (CI + TAs + Realinhamento)	1.150,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.963.835,08	1.963.835,08	CCBS	
41	1406+ 1468+ 9557	CONC 09/2017	BIOTROP - Conclusão da obra (abertura em 22/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do contrato: 04/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	26/02/2019	MACRO	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.814.545,12	1.814.545,12	CCBS	
42	1416 + 1481	CONC 07/2016	2ª etapa da obra Lab. FINEP II e III - Araras - Ab = 1.488,60 m² - 1416*01 e 1481*01 (relançamento; abertura da licitação em 21/12/2016 - contrato datado em 03/03/2017 e o início efetivo da obra em 20/03/2017 >> conforme ata - empresa Prodex)	Concluída (fiscalização FAI)	20/12/2018	Prodex	1.488,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.642.425,62	1.642.425,62	CCA	
43	1406 + 9557	CONC 14/2017	CINA - conclusão da obra - abertura 04/10/2017 - assinatura contrato em 27/11/2017 - JNA	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	20/12/2018	JNA	634,95	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.136.862,65	1.136.862,65	CCET	
44	1406 + 1468 + 9557	CONC 08/2017	NAP - conclusão da obra (abertura em 10/07/2017) - Empresa MACRO - assinatura contrato 15/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	30/11/2018	MACRO	1.876,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.530.061,93	1.530.061,93	CECH	
45	1556	CONC 02/2017	BIOTERIO - 1ª etapa - Ab = 512,34 m² - (convenio 1556) - abertura da licitação em 07/03/2017 - empresa ARQCON julgada vencedora em 12/04/2017 - contrato assinado em 26/05/17 e início efetivo em 01/06/17	Concluída (fiscalização empresa AGP)	14/09/2018	ARQCON	512,34	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.197.829,15	1.197.829,15	CCBS	
46	8917 - não FINEP	CONC 01/2018	HU - Instalações de Brises do lado oeste - abertura: 15/02/2018 - contrato assinado em 19/03/2018 - Cedro	Concluída (fiscalização EBSEERH - Eng Fabio)	08/08/2018	CEDRO	instalações brises	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	318.102,99	318.102,99	INSTITUCIONAL
47	1556	CONC 13/2017	IBEV - 1ª etapa (1556) - abertura 06/09/17 - assinatura do contrato c/ BIL: 20/10/17	Concluída (fiscalização empresa AGP)	30/07/2018	BIL	661,39	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	461.617,60	461.617,60	CCBS	
48	1597	CONC 04/2017	DGR - Nova UGR - 1ª etapa (abertura 12/06/17) - Empresa ARQCON - assinatura do contrato: 02/10/17	Contrato rescindido/obra cancelada	27/07/2018	ARQCON	781,66	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	138.021,99	138.021,99	CCBS	
49	9317 - não FINEP	CONC 16/2017	HU - 3ª licitação >> Execução das Instalações Elétricas - Bloco 02 (Orçamento EBSEERH) - abertura 24/10/2017 - MONTAG	Concluída (fiscalização EBSEERH - Eng Fabio) - Cedro	15/07/2018	MONTAG	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	356.972,24	356.972,24	INSTITUCIONAL
50	8917 - não FINEP	CONC 15/2017	HU - 2ª licitação >> Execução para complemento da obra civil do Bloco 02 (Orçamento EBSEERH) - abertura 23/10/2017 - Empresa Cedro >> assinatura do contrato: 27/11/2017 - CEDRO	Concluída (fiscalização EBSEERH - Eng Fabio) - Cedro	26/06/2018	CEDRO	1.881,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	1.023.728,06	1.023.728,06	INSTITUCIONAL
51	1597	CONC 18/2017	3ª etapa do LIEC - Instalações Elétricas (conclusão da obra - conv 1597) - abertura em 09/11/17 - assinatura do contrato: 06/12/2017 - MONTAG	Concluída (fiscalização eng elétrica FAI) - MONTAG	24/04/2018	MONTAG	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	172.100,15	172.100,15	CCET	
52	1597	CONC 12/2017	Cabine de Força Nanobio (Obra Inst.Elétrica) - abertura em 31/08/17 - início efetivo da obra em 03/01/2018 - Sampietro	Concluída (fiscalização eng elétrica FAI) - Sampietro	20/04/2018	SAMPIETRO	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	179.974,43	179.974,43	CCET	
53	1556	CONC 11/2017	Reforma das instalações elétricas dos 4 prédios do CECH - abertura 28/08/17 - assinatura contrato: 22/09/2017 - empresa Nova Meta	Concluída (fiscalização eng elétrica FAI) - Nova Meta	16/03/2018	NOVA META	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	121.117,98	121.117,98	CECH	
54	1597	CONC 06/2016	2ª etapa da ampliação do Ed. Matemática - Conv 1597*03 (relançamento abertura da licitação em 21/12/2016) - Contrato assinado em 16/01/2017: Ata Início de Obra 30/01/2017	Concluída (fiscalização FAI)	23/10/2017	CONTISA	955,28	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	359.616,68	359.616,68	CCET	
55	1468	CONC 04/2016	1ª etapa prédio MAVLABS /DF c/ 2 pavimentos (GPF 1468) - abertura da licitação: 18/10/2016 (empresa JNA - valor CI = R\$ 934.281,17) - Ata assinada em 09/01/2017	Concluída (fiscalização FAI)	26/10/2017	JNA	993,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.006.681,17	1.006.681,17	CCET	
56	9317 - não FINEP	CONC 02/2016	Hospital Universitário - HU - 1ª licitação - reforma e conclusão de parte do prédio - Convenio 9317 - FAI X Sapiens (empresa Pajolla - fiscalização Eng Fabio/EBSEERH) - contrato assinado em 14/09/2016	Concluída (fiscalização EBSEERH)	18/09/2017	PAJOLLA	1.881,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	4.955.651,09	4.955.651,09	INSTITUCIONAL
57	1556	CONC 01/2017	Cabine de Força NANOBIO - p/ o prédio de 4 pavimentos (conv 1556 - obra civil) - Abertura das habilitações em 23/02/2017 - vencedora empresa Fragalli - contrato assinado em 04/04/2017 - início efetivo da obra: 10/04/2017	Concluída (fiscalização FAI)	26/07/2017	FRAGALLI	62,10	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	142.937,38	142.937,38	CCET	
58	1468	CONC 05/2016	2 Cabines de Instalações Elétricas p/ o Biotrop e Colmeia - GPF 1468 (abertura da licitação: 15/12/2016 - empresa Sampietro Eng.) - início de obra : 30/01/2017	Concluída (fiscalização FAI)	24/07/2017	SAMPIETRO	126,20	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	598.995,25	598.995,25	CCET	
59	1597	CONC 01/2016	2ª Etapa do LIEC (empresa JNA) - contrato assinado em 03/10/2016 - início efetivo em 17/10/16 - término previsto 15/04/17 - (houve solicitação de aditivo de prazo por + 60 dias solicitado em 02/02/2017)	Concluída (fiscalização FAI)	27/06/2017	JNA	352,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	411.991,00	411.991,00	CCET	
60	PRODIN	Contratação Direta (3 orçamentos)	LIEP - contratação da Laje de Piso do 1º pavimento via PRODIN - contrato assinado em 09/01/2017 c/ Habcon - obra concluída (somente escoramento da laje será retirado em 10/03/17)	Concluída (fiscalização FAI)	17/02/2017	HABCON	491,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso PRODIN/FAI/DEP - UFSCAR	84.635,08	84.635,08	CCET

FAI		Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024			Obras CT/INFRA/FINEP e/ou Outros Convenios		DTO		Posição em:	31/01/2025			
61	não FINEP	CONC 07/2015	Lab Ed. Física e Motricidade Humana - GPF 1325*01 (custo final da obra = soma dos pagamentos à JBS = CONC 22/2013 e dos pagamentos à JNA = CONC 07/2015)	Concluída (fiscalização FAI)	21/12/2016	JBS/JNA	1.250,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso CCJ 098/2007 >> convenio encerrada em 28/12/2016	4.395.669,24	4.395.669,24	CCBS	
62	1468	CONC 01/15	1ª Etapa do Edifício do LIEP (3 pav - em estrutura metálica)	Concluída (fiscalização FAI)	08/11/2016	Dalmetal	1.623,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.388.746,65		1.388.746,65	CCET	
63	RESCISÃO	CONC 06/2015	3ª Etapa BIOTROP - empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	09/09/2016	Zacarelli	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	268.498,51		268.498,51	CCBS	
64	RESCISÃO	CONC 03/15	Ampliação Ed. Matemática 1ª etapa - Empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	09/09/2016	Zacarelli	955,28	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	744.138,96		744.138,96	CCET	
65	RESCISÃO	CONC 05/15	2ª etapa Nanóbio - 4 pavimentos (etapa para termino somente de 2 pavimentos) - Empresa Zaccarelli - Obs: contrato rescindido em Ago/2016	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	26/08/2016	Zacarelli	1.061,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	202.934,43		202.934,43	CCET	
66	1468	CONC 04/15	Reforma MAVLABS - DF - ata inicio da obra: 15/01/2016	Concluída (fiscalização FAI)	09/08/2016	Simieng	170,07	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	254.014,63		254.014,63	CCET	
67	1468	TPN 01/2015	3 Cabines de Dados e Voz em S Carlos - GPF 1468*02 (5 açoes) - Cabines do Letras, do DECIV e do CCBS	Concluída (fiscalização FAI)	07/04/2016	**	180,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	230.994,10		230.994,10	INSTITUCIONAL	
68	1406	CV 06/15	Reforma do Laboratório de Controle Ambiental 01 (Edifício nº 75 - DEQ)	Concluída (fiscalização FAI)	23/02/2016	**	132,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	65.752,77		65.752,77	CCET	
69	não FINEP	SL 001/2015	2º Predio Administrativo FAI (FAI 02) - recursos propios	Concluída (fiscalização FAI)	17/12/2015	**	379,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso FAI >> não FINEP	1.128.932,54	1.128.932,54	FAI (2º predio administrativo)	
70	1406	CONC 23/13	4ª etapa do DEQ - São Carlos (empresa JBS)	Concluída (fiscalização FAI)	10/09/2015	**	1.542,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.352.990,00		1.352.990,00	CCET	
71	1406	CONC 03/14	2ª. Etapa do NAP	Concluída (fiscalização FAI)	16/06/2015	**	1.876,75	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.343.697,06		1.343.697,06	CECH	
72	1406	CONC 21/13	Construção da 1ª etapa - COLMEEA	Concluída (fiscalização FAI)	24/04/2015	**	1.242,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.497.468,67		1.497.468,67	INSTITUCIONAL	
73	RESCISÃO	CONC 19/13	1ª etapa Finep II e III de Araras - (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato - CONC 019/2013 - foi revogado - Valor Pago até 27/02/15 = R\$ 230.064,26)	Concluída parcialmente (contrato rescindido)	27/02/2015	JBS	1.488,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	230.064,26		230.064,26	CCA	
74	RESCISÃO	CONC 02/14	Construção 2ª etapa BIOTROP (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato foi revogado)	Concluída parcialmente (contrato rescindido)	27/02/2015	**	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	333.191,92		333.191,92	CCBS	
75	*	CONC 07/14	Reforma dos Lab. DEQ - predios 34 e 34B	Concluída (fiscalização FAI)	25/10/2014	**	122,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	136.357,22		136.357,22	CCET	
76	1481	CONC 15/13	1ª etapa FINEP 3 e 4 - Sorocaba - empresa JBS - Fiscal Cassio/Sorocaba	Concluída (Fiscal - Eng Cassio - Sorocaba)	05/09/2014	**	2.026,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	2.288.577,36		2.288.577,36	CCTS	
77	1406	CONC 16/13	Execução de Rede Compacta e Subterrânea - Transfederonica - S Carlos	Concluída	14/07/2014	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	712.637,48		712.637,48	INSTITUCIONAL	
78	*	TPN 010/13	Cabine de Força - Araras (p/ atender os predios FINEP 1, 2 e 3) - Eletro Pires - Fiscal Arquelau	Concluída	13/07/2014	**	52,56	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	173.531,61	34.252,17	207.783,78	CCA	
79	1406	CONC 17/13	Construção 1ª etapa do CINA - S Carlos	Concluída	25/06/2014	**	634,95	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	570.243,23		570.243,23	CCET	
80	1299*03 + 1551*01	CONC 13/13	2ª Etapa Ecotoxicologia - Araras - Empresa JBS - Fiscal Arquelau	Concluída	29/05/2014	**	746,32	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	610.974,12	167.540,49	778.514,61	CCA	
81	não FINEP	DL 04/11	Predio Sêde - PMGCA - Araras	Concluída	05/05/2014	**	1.306,30	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos PMGCA	3.116.398,39	3.116.398,39		
82	1371	CONC 05/12	Construção 1ª etapa BIOTROP (Empresa Zaccarelli)	Concluída	24/01/2014	**	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.364.445,15		1.364.445,15	CCBS	
83	*	CONC 12/13	Construção da 1ª etapa do LIEC - Prof Ernesto DQ	Concluída	30/12/2013	**	352,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	441.352,11		441.352,11	CCET	
84	1371	CONC 11/13	Construção Ed Núcleo de Apoio a Pesquisa - NAP - 1ª etapa	Concluída	08/12/2013	**	1.876,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.134.734,26		1.134.734,26	CECH	
85	*	CONC 03/11	Construção Lab Educ. Especial - 1ª etapa - Psicologia - CONC 003/11	Concluída	12/11/2013	**	1.121,75	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	711.142,24	1.079.573,93	1.790.716,17	CECH	
86	*	CONC 10/13	Reformas e adequações LIDEPS (edif 23, 25 e 15B)	Concluída	20/10/2013	**	578,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	607.801,60		607.801,60	CECH	
87	1406	CONC 01/13	3ª Etapa do DEQ - Inst. Eletricas	Concluída	17/10/2013	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	456.579,02		456.579,02	CCET	
88	1299*03 + 1551*01	CONC 04/12	Construção Lab. Biotecnologia e Ecotoxicologia, 1ª Etapa - Araras - ENGE REIS - fiscal Pavan	Concluída	21/06/2013	**	746,35	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	438.288,87	3.235,04	441.523,91	CCA	

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024		Obras CT/INFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios		Posição em: 31/01/2025								
89	* TPN 01/12	Reforma da Cobertura do Edifício LCE	Concluída	27/05/2013	**	388,32	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	199.693,87	145.943,52	345.637,39	CCET	
90	1202 CONC 02/12	Construção 1ª etapa Nanobio - DQ - 4 pav	Concluída	16/05/2013	**	2.123,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.180.644,82	402.240,41	1.582.885,23	CCET	
91	* TPN 011/12	2ª Etapa Cabine da Sin -	Concluída	08/02/2013	**	62,21	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	151.409,56		151.409,56	INSTITUCIONAL	
92	Recursos conv 1202	CONC 01/2009	1ª Etapa do Centro de Pesquisa / Petrobras (convenio 1202*02 - Prof Ernesto Urquieta)	Concluída	31/01/2013	**	3.600,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos PETROBRAS	7.704.956,35	7.704.956,35	CCET
93	1287 + 1202 + 1550	CONC 04/11	Construção 2ª Etapa DEQ + Entorno - CONC 004/11	Concluída	22/10/2012	**	1.542,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	340.943,27	137.760,56	478.703,83	CCET
94	* TPN 09/11	Construção de cabine primária - SIN - 1ª Etapa	Concluída	03/05/2012	**	62,21	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	104.066,58		104.066,58	INSTITUCIONAL	
95	* TPN 07/11	Modernização Cab. Entrada E. Elétrica	Concluída	07/04/2012	**	inst eletrica		50.299,70		50.299,70	CCA	
96	1325 (CCI) + 1371 + 1406	CONC 05/10	Construção da cobertura do Edifício da Matemática - conv 1325/CCI nº 098/2007 = R\$ 1.374.516,77 + conv 1371/FINEP = R\$ 390.000,00 + 1406/FINEP = R\$ 877.433,68	Concluída	04/03/2012	**	3.276,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.267.433,68	1.374.516,77	2.641.950,45	CCET
97	* TPN 08/11	Reforma da Rede de Média Tensão em Araras	Concluída	15/01/2012	**	inst eletrica		21.404,67		21.404,67	CCA	
98	* CONC 01/11	Reforma e Ampliação do Lab. de Alta Pressão - DEQ	Concluída	15/12/2011	**	34,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	86.233,89		86.233,89	CCET	
99	* CONC 01/10	Acabamento e Instalações do ATLab - Sorocaba - J GROUT	Concluída	20/09/2011	**	8.740,08	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	677.312,79	3.393.538,92	4.070.851,71	CCTS	
100	* CN 03/11	Execução e Conclusão da rede de Telefonia e Dados do Laboratorio	Concluída	03/07/2011	**	inst eletrica		49.984,44		49.984,44	CCET	
101	Recursos conv 1325	CONC 04/2009	Fundação e Estrutura Pre Fabricada do Ed Matemática - empresa PROTENDIT - CCI 098/2007 - GPF 1325 - 01	Concluída	17/02/2011	Protendit	3.276,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos CCI 098/2007 (não FINEP)	2.120.582,97	2.120.582,97	CCET
102	* TPN 017/08	Reforma Lab do Ed 51 - CCET - Depto Fisica (Unimaz)	Concluída	25/10/2010	**	617,17	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI		374.014,00	374.014,00	CCET	
103	* CONC 04/08	Ed. DEQ - 1ª etapa	Concluída	03/01/2010	**	1.534,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.511.883,44		1.511.883,44	CCET	
104	* CONC 06/08	Ed. Fisioterapia - 1ª etapa - fundação e estrutura pré moldada	Concluída	25/07/2009	**	3.300,55	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.990.281,10	12.000,00	2.002.281,10	CCBS	
105	* TPN 06/08	Lab Pesquisa de Exatas - Sorocaba - 2ª Etapa	Concluída	23/05/2009	**	528,91	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	357.860,17	242.477,33	600.337,50	CCTS	
106	* CN 03/08	Reforma e Ampliação Lab Controle Ambiental - DEQ	Concluída	16/02/2009	**	132,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	120.378,58		120.378,58	CCET	
107	* Dis 01/08	Reforma e Ampl. Lab. Engº Bioquímica - DEQ (CN 010/08)	Concluída	17/01/2009	**	110,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	48.508,76	18.466,44	66.975,20	CCET	
108	* TPN 016/07	Obras/Reformas Ed 51 e 52 - Depto Fisica	Concluída	03/10/2008	**	2.086,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	617.830,65		617.830,65	CCET	
109	* CN 017/08	Reforma Lab do Ed 53 - Depto Fisica	Concluída	12/09/2008	**	250,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	22.974,72		22.974,72	CCET	
110	* TPN 02/07	Lab Pesquisa Sorocaba - Fundações/Estrutura - 1ª Etapa	Concluída	21/03/2008	**	528,91	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	299.849,56		299.849,56	CCTS	
111	* TPN 008/07	Lab Microscopia Eletronica/Conclusão - S Carlos	Concluída	11/03/2008	**	434,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	404.405,31		404.405,31	CCET	
Tt =						96.962,57		75.287.761,10	43.379.647,51	118.667.408,61	118.667.408,61	

Posição: 31/01/2025


Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024	R\$	% rel
Convenios FINEP =	75.287.761,10	63,44%
Recursos CCIs / Próprios/Outras Fontes =	43.379.647,51	36,56%
Total (R\$) =	118.667.408,61	100,00%




Posição em: 31/01/2025

ano	Obras Concluídas/Licitadas/em andamento - (R\$/ano)
2008 - concluídas	1.345.060,24

2009 - concluídas	2.789.972,38
2010 - concluídas	1.885.897,44
2011 - concluídas	6.327.653,01
2012 - concluídas	3.296.425,23
2013 - concluídas	14.657.595,60
2014 - concluídas	9.174.957,22
2015 - concluídas	5.886.344,45
2016 - concluídas	7.550.749,29
2017 - concluídas	7.560.507,65
2018 - concluídas	8.278.814,79
2019 - concluídas	14.077.593,76
2020 - concluídas	6.264.422,07
2021 - concluídas	3.331.587,61
2022 - concluídas	5.982.373,49
2023 - concluídas	4.465.099,12
2024 - concluídas	4.519.329,69
2025 - concluídas	514.582,83
2025 - em andamento	7.298.442,74
2025 - em licitação/prazo recursal	-
2025 - em fase de contratação	-
2025 - em montagem de edital	3.460.000,00
2025 - em orçamentação	-
Tt Geral - R\$	118.667.408,61

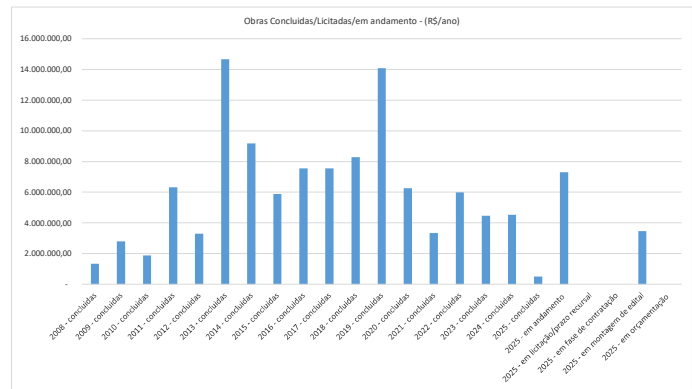

ano	Agrupamento de Obras Concluídas e/ou em andamento (R\$/ano)
2008	1.345.060,24
2009	2.789.972,38
2010	1.885.897,44
2011	6.327.653,01
2012	3.296.425,23
2013	14.657.595,60
2014	9.174.957,22
2015	5.886.344,45
2016	7.550.749,29
2017	7.560.507,65
2018	8.278.814,79
2019	14.077.593,76
2020	6.264.422,07
2021	3.331.587,61
2022	5.982.373,49
2023	4.465.099,12
2024	4.519.329,69
agrupadas 2025	11.273.025,57
Tt Geral - R\$	118.667.408,61

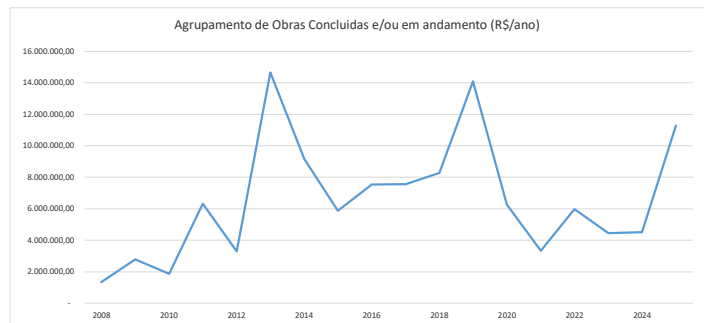

>>>>>>>

Obs 01: Recursos para obras a serem liberados pela FINEP:

Posição: 31/01/2025

Conv. GPF/Sapiens/FINEP	Recursos ainda a serem liberados /contratos vigentes (R\$)	% a ser liberado para Obras	data assinatura	vencimento atual do convenio
1416 - 01.09.0476.00	Encerrado - RTF em set/2021	recurso totalmente liberado	09/10/2009	Encerrado - RTF em set/2021
1481 - 01.11.0055.00	Encerrado - RTF em jul/2022	recurso totalmente liberado	23/03/2011	Encerrado - RTF em jul/2022
1406 - 01.09.0354.00	Encerrado: RTF >> fev/23	Ultima parcela liberada em jun/2014	09/09/2009	Encerrado: RTF >> fev/23
11.417 - 01.18.0153.00 (Carta Convite 01/2018)	Encerrado: RTF >> Out 2023	recurso totalmente liberado em dez/2019	18/12/2018	Encerrado: RTF >> Out 2023
1597 - Sapiens 1158 01.12.0510.00	Encerramento em Dez/23 com RTF enviado em Abr/2024	Ultima parcela liberada em Dez/2016	21/12/2012	21/12/2023 - não será prorrogado - RTF até Fev/24
1468 - Sapiens 1549 01.10.0625.00	Encerramento em 01/12/2024	Ultima parcela liberada em Jul/2016	01/12/2010	01-dez-24

Conv. GPF/Sapiens	Valores a serem liberados
1416	Encerrado - RTF em set/2021
1481	Encerrado - RTF em jul/2022
1406	Encerrado: RTF >> fev/23
11.417 - 01.18.0153.00 (Carta Convite 01/2018)	Encerrado: RTF >> Ago 2023
1597	Encerramento em Dez/23 com RTF enviado em Abr/2024
1468	recurso totalmente liberado

Encerrado: RTF >> Out 2023

21/12/2023 - não será prorrogado - RTF até Fev/24

01-dez-24

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024 Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios Posição em: **31/01/2025**

15.796 - 01.23.0635.00 (projeto UFV - DECV)	Encerramento em 11/12/2024	Valor total liberado em julho/2023 (R\$ 193.931,48 p/ reforma)	confirmar	11-dez-24
11.542 - 01.19.0189.00 (CTINFRA 03/2018 - Reformas 8 Biotérios de Apoio)	Encerramento em 20/12/2024	valor liberado em jul/2024	22/12/2019	20-dez-24
1556 - Sapiens 595 01.12.0048.00	zero	recurso totalmente liberado (saldo desbloqueado em jan/23)	09/02/2012	09-fev-25
9557 - 01.16.0014.00 (Carta Convite 01/2014)	zero	recurso totalmente liberado em mar/2024 (valor última parcela = R\$ 434.450,36)	19/04/2016	09-fev-25
15.481 - 01.23.0061.00 (Salas Limpas)	zero	Valor total liberado em julho/2023 (R\$ 193.931,48 p/ reforma)	26/06/2023	26-jun-25
Tt - R\$				

15.796 - 01.23.0635.00 (projeto UFV - DECV)	recurso totalmente liberado
11.542 - 01.19.0189.00 (CTINFRA 03/2018 - Reformas 8 Biotérios de Apoio)	recurso totalmente liberado
1556 - sapiens 595	recurso totalmente liberado (saldo desbloqueado em jan/23)
9557 - 01.16.0014.00 (Carta Convite 01/2014)	recurso totalmente liberado
15.481 - 01.23.0061.00 (Salas Limpas)	recurso totalmente liberado
Tt - R\$	

20-dez-24


09-fev-25

09-fev-25

Obs 02: Área Construída/Licitada por ano

Posição: 31/01/2025

ano	Área Construída - concluídas e/ou licitadas (m²) por ano
2008	3.298,91
2009	4.071,46
2010	1.534,60
2011	8.774,08
2012	4.880,73
2013	10.848,50
2014	6.562,36
2015	8.203,10
2016	7.046,08
2017	4.861,95
2018	7.837,64
2019	10.191,07
2020	2.731,10
2021	2.021,00
2022	2.854,59
2023	2.251,89
2024	4.053,86
2025 - concluída	-
2025 - em andamento	1.726,90
2025 - em contratação	-
2025 - em licitação	-
2025 - em orçamentação	-

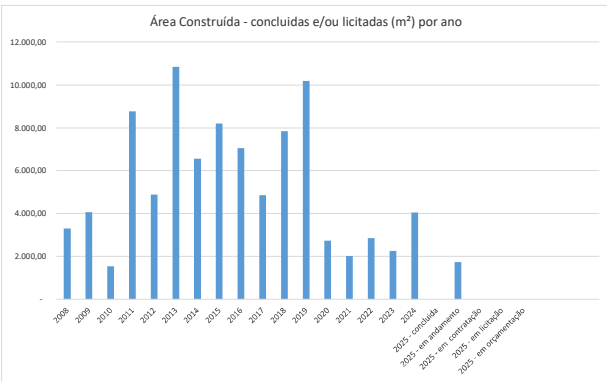

Obs 03: Obras a serem licitadas a partir de 2024

Posição: 31/01/2025

qte	GPF/Sapiens - FAI	Obras a serem Licitadas a partir de 2024	Nº Convenio	Status Orçamentos/Liberações	OBS	Projeção/estimativa do valor da obra (R\$)
1	**	**	**	**	**	**
