Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026 | **Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios** | Posição em : **30/10/2026**

30/10/2026
439

it	conv FAI	Licitação/Contrato (nº)	Descrição/obra	Sigla /obra	Status da licitação/estagio da obra/planejamento 2025	Empresa Contratada/conclusão da etapa /obra	previsão de entrega da obra/empresa	Área Efetiva e/ou equivalente (m²)	nº CNO / INSS	Recursos FINEP / contratado - (R$)	Outras Fontes (Projetos e/ou Proprios) - (R$)	V Total Contratado (CI + TAs)	centro vinculado
1	(10.763) - não FINEP	Contrato nº?	Conclusão do Centro Esportivo de Araras - Valor Base = R$ 3.730.786,89 (Atualização Jun/2026 - Eng. Estevam)	Centro Esportivo Araras	Aguardando Contratação	Empresa?	?			Conta 10763 (não FINEP)	3.730.786,89	3.730.786,89	CCA/PMGCA
2	17.765	Licitação nº ??	Contratação Projeto Executivo Lab. NEPEM - Campus Sorocaba (FINEP 01.26.0051.00) - Valor Base = R$ 1.023.248,90	NEPEM - ProjExec	Licitação será lançada em nov/2026??	Empresa?	?	PROJEXEC - Sorocaba	V Aprovado R$ 1.023.000,00	-	*	*	Campus Sorocaba
3	10.401	SP 070/2026	Reforma Eletrica do PPGBiotec	PPGBiotec	documentação em analises	Empresa?	?	145,00		Conta 10401 (não FINEP)	55.473,08	55.473,08	CCBS
4	16.802	Contratação Direta nº 020/2026	FINEP 01.25.0110.00 - Reforma Herbario Sorocaba - Valor Base = R$ 69.670,50 - Inicio efetivo da obra: 05/10/2026	Herbario Sorocaba Reforma	Em Andamento (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	Empresa: Uno Plano Construtota Ltda	jan-27	145,00		69.670,56	*	69.670,56	Campus Sorocaba
5	17.764	SL 41/2026	Obra Gerontologia - CEPEH (CTINFRA 2024) - Campus São Carlos (FINEP 01.26.0051.00) - Valor Base = R$ 3.965.861,77. Abertura 24/06/2026. Valor do CI = R$ 3.590.000,00, Assinatura do Contrato/Ata: 17/07/2026 - Inicio de obra: 10/08/2026	CEPEH	Em Andamento (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	Empresa: Fragalli	ago-27	637,82		3.590.000,00		3.590.000,00	CCBS
6	17.748 (não Finep)	Contrato - Prestação de Serviço nº 09/2026	Contratação Projeto Executivo do LIDI - Petrobras (Profª Fernanda) - Valor Base = R$ 80.000,00 - recurso liberado em 29/05/2026. Contrato assinado em 08/06/2026	LIDI - ProjExec	Em andamento (fiscalização Engenharia FAI) - (CI + 1º TA Prazo)	Empresa Ipê	nov-26	PROJEXEC - LIDI		17748 (não Finep)	*	*	CCBS
7	.Conta 4932	Contrato - Prestação de Serviço nº 11/2026	Execução Estacionamento FAI/COLMEEA - contrato assinado em 26/06/2026 - CI = R$ 1.789.021,41	Estacionamento	Em Andamento - Fiscalização Engenharia FAI (civil e eletrica)	Empresa: CS Engenharia	dez-26	4.991,45	**	Conta 2930 (Não FINEP)	1.789.021,41	1.789.021,41	Estacionamento FAI
8	.Conta 4932	Contrato Administrativo 17/2024	Ampliação Predio FAI 01 (c/ 2 pavimentos) - V Base = R$ 1.601.150,38 - Valor CI = R$ 1.319.942,57 - Contrato assinado em 05/08/2024 e Inicio da Obra em 22/08/2024 (Ampliação + Reforma FAI 01 + Reforma AI/FAI 02)	FAI 01	Em Andamento - Fiscalização Engenharia FAI (civil e eletrica)	Empresa: CS Engenharia (CI + TAs)	out-26	321,51	Cadastramento no CNO será via UFSCAR	Conta 2930 (Não FINEP)	2.264.913,58	2.264.913,58	Ampliação FAI 01
9	16.758	SL 37/2026	FINEP 01.25.0121 - Acervos Históricos e Culturais UFSCar - G2 - Acervos UFSCar - Reforma do ultimo pavimento da BCO - Valor Base = R$ 169.617,72 - abertura em 28/05/2026 - Valor do CI = R$ 165.000,00 - Assinatura do Contrato: 26/06/2026 - Inicio da obra: 13/07/2026	BCO - Reforma	CONCLUIDA (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	16/09/2026 (Termo de Recebimento: 29/09/2026)	Empresa: Fragalli	84,00		165.670,80		165.670,80	CCBS
10	16.802	SL 055/2026	FINEP 01.25.0110.00 - Acervos Cientificos UFSCar - G1-Acervos UFSCar - Licitação Reforma Herbario Sorocaba - Valor Base = R$ 69.670,50 - Abertura: 05/08/2026	Herbario Sorocaba Reforma	Certame fracassado	**	**	106,20	Cadastramento no CNO será via UFSCAR ou via empresa contratada	**		-	Campus Sorocaba
11	16.759	SP 07/2026	01.25.0121 - Acervos Históricos e Culturais - Subprojeto UEIM/CECH - Licitação Reforma Bloco Central do Predio do CECH (abertura da Licitação em 27/02/2026) - contrato assinado em 24/03/2026 - Valor CI = R$ 133.000,00 >> Inicio da obra: 13/04/2026	CECH - reforma	Concluida (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	28/07/2026 (termo de recebimento provisório: 30/07/2026)	Empresa: JNA	80,50	Cadastramento no CNO será via UFSCAR ou via empresa contratada	143.658,32		143.658,32	CCBS
12	16.580	Prestação de Serviço nº 02/2026	Contratação para execução das perfurações de poços artesianos - Terras Indígenas	Poços	Concluida (Fiscalização ARTHUR PAZINATTO ANTONIO SOLUCOES GEOLOGICAS LTDA) - obs: ainda há possibilidade de aditivo de prazo e valor, pois o contrato está vigente	03/06/2026 (Termo de Recebimento: xx/xx/2026)	Empresa: PERFUGEL - PERFURAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA	Perfurações de Poços	Cadastramento no CNO será via UFSCAR ou via empresa contratada	Conta 16.580 (não FINEP)	1.093.527,07	1.093.527,07	Terras indígenas - Campus Buri
13	RESCISÃO (10.763) - não FINEP	SL 11/2025	Centro Esportivo de Araras (V base = R$ 3.643.195,30) - CI = R$ 3.053.833,24 Assinatura do CI: 06/08/2025 - inicio da obra: 01/09/2025	**	Rescisão Contratual (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	Contrato de Rescisão assinado em 19/02/2026	Empresa: CGH Construtora	Ata da Rescisão assinada em 04/12/2025	Cadastramento no CNO será via UFSCAR	Conta 10763 (não FINEP)	455.153,99	455.153,99	CCA/PMGCA
14	16.580 (não FINEP)	Seleção Publica 056/2025 (relançamento)	Contratação para execução das perfurações de 16 poços - Terras Indígenas (UFSCar nº 68/2024 - ProEx nº 39480/2024-12 - Resgate da dignidade humana e pertencimento: projeto piloto de gestão ambiental e territorial e bem viver nas Terras Indígenas Jaraguá (São Paulo) e Tenondé Porã (São Bernardo do Campo) no âmbito da Politica Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) - Abertura da Licitação: 16/12/2025	**	Certame fracassado	**	60 dias	Perfurações de Poços	Cadastramento no CNO será via UFSCAR	Conta 16.580 (não FINEP)	-	-	Terras indígenas - Campus Buri
15	Recursos FAI	Contrato Administrativo CD 06/2024	Contratação de Anteprojeto para Renaturalização da Area do Lago da UFSCAR (Barragem) - Campus São Carlos - CI = R$ 318.400,00	**	Anteprojetos Concluidos - Fiscalização Equipe SeGEF (nov/25)	Anteprojeto Concluído	Empresa: Silva Leme Engenharia Ltda.	Anteprojeto - Barragem - Campus São Carlos	CI = R$ 318.400,00	Execução de Anteprojeto - Recursos FAI	**	**	Campus São Carlos (anteprojeto)
16	Não FINEP - conv 13.840	CONC 02/2024 (Projetos Executivos Campus Lagoa do Sino)	Contratação Projetos Executivos - Lagoa do Sino/SeGEF - (Coordenadora Profª Luciana/SeGEF) - V base = R$ 528.846,95 - abertura em 24/05/2024 - Valor do CI = R$ 475.948,86 - contrato assinatura em: 25/07/2024	**	Projetos Concluidos - Fiscalização Equipe SeGEF (nov/25)	Projetos Concluidos, exceto o de Combate a Incendio	Empresa: KAAN ARCHITECTEN – SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	Ab = 2.000,00 m² (=/e)	CI = R$ 475.948,86	Contratação de Projetos Executivos Conv. 13.840 (não FINEP)	**	**	Campus Lagoa do Sino (Projetos Executivos)
17	16.580 (não FINEP)	Seleção Publica 42/2025	Contratação para execução das perfurações de 16 poços - Terras Indígenas (UFSCar nº 68/2024 - ProEx nº 39480/2024-12 - Resgate da dignidade humana e pertencimento: projeto piloto de gestão ambiental e territorial e bem viver nas Terras Indígenas Jaraguá (São Paulo) e Tenondé Porã (São Bernardo do Campo) no âmbito da Politica Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) - Abertura da Licitação: 05/11/2025	**	Licitação Finalizada - empresas desclassificadas - posição 19/11/2025	Licitação será relançada!	**	**	**	Conta 16.580 (não FINEP)	**	**	Terras indígenas - Campus Buri
18	16.580 (não FINEP)	Contrato Prest. Serviço 11 /2025	Poços Indigenas - Contratação do Projeto Executivo /Estudos Hidrogeológicos	**	Projetos Concluidos (entrega ocorreu em 01/09/2025)	Entrega dos Projetos: 02/09/2025	Empresa: ARTHUR PAZINATTO ANTONIO SOLUCOES GEOLOGICAS LTDA	Projetos Executivos - Poços	CI = R$ 65.000,00	16.580 (não FINEP)	**	**	Campus Lagoa do Sino (Projetos Executivos Poços Indigenas)
19	Prodin - nº 02/2023 - Conv. 15.750	CONC 03/2024	Conclusão do Predio DeMEC x PRODIN (licitação via FAI) - V Base = R$ 2.009.646,69 - abertura em 15/05/2024 - Valor do CI = R$ 1.730.000,00 - Assinatura do CI: 24/06/2024 - Inicio da Obra: 01/07/2024	**	Concluida (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	29/04/2025 (Termo de Recebimento Provisório: 12/05/2025)	Empresa: Beuvale Construtora	527,12	Cadastramento no CNO será via UFSCAR	Prodin - nº 02/2023 - Conv. 15.750	1.923.071,97	1.923.071,97	CCET
20	1556 e 9557	CONC 01 /2023	Conclusão do BIOTERIO CENTRAL - V Base = R$ 3.888.259,87 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R$ 3.498.267,83 >> Contratação em 11/10/2023 e Inicio da Obra em 30/10/2023	**	Concluida (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	06/02/2025 (Termo de Recebimento Provisório: 1º termo 18/02/2025 - 2º termo: 16/05/2025)	Empresa: JNA	512,34	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!!	4.114.833,48		4.114.833,48	CCBS
21	11.542	CONC 05/2024	Reforma de 6 Bioterios de Apoio (Predio DCF) = V Base = R$ 209.092,98 - abertura em 27/05/2024 - Contrato assinado em 23/07/2024 e Inicio de Obra em 23/07/2024 - Final do contrato: 31/01/2025	**	Concluida (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	31/01/2025 (Termo de Recebimento Provisório: 19/02/2025)	Empresa: UMPLER Engenharia	70,93	Cadastramento no CNO será via UFSCAR	215.983,85		215.983,85	CCBS

			Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026		Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios					Posição em : 30/10/2026			
22	15.053	CONC 04/2024	Reforma LCE - Prof Botta - V Base = R$ 299.898,29 - abertura em 23/05/2024 - Contrato assinado em 12/08/2024 e Inicio de Obra em 26/08/2024 - Final do contrato: 31/01/2025	**	Concluida (Fiscalização Empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	31/01/2025 (Termo de Recebimento Provisório: 19/02/2025)	Empresa: UMPLER Engenharia	295,00	Cadastramento no CNO será via UFSCAR	298.598,98		298.598,98	CCET
23	1556	CONC 02 /2023	Conclusão do INFRATEC - V Base = R$ 2.299.198,97 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R$ 1.839.355,85 >> Contratação em 11/10/2023 e Inicio da Obra em 30/10/2023	**	Concluida (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Eletrica FAI)	06/12/2024 (Termo de Recebimento Provisório: 23/01/2025)	Empresa: JNA	684,60	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!!	2.179.368,96		2.179.368,96	CCET
24	15.481	CONC 01/2024	Reforma do Laboratorio LMBBM (DCF - Profª Heloisa) - V base R$ 224.897,41 >> abertura das Propostas: 16/02/2024 - Assinatura do CI em 16/04/2024 - Inicio da Obra em 02/05/2024	**	Concluida (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Eletrica FAI)	30/10/2024 (Termo de Recebimento Provisório: xx/xx/2024)	Empresa: CS	85,21	Cadastramento no CNO será via UFSCAR	231.010,69		231.010,69	CCBS
25	Não FINEP - conta FAI 2930	Contrato CD 11/2024	Rede Eletrica - Alimentação - Predio INFRATEC - V Base = R$ 166.811,70	**	Concluida (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Eletrica FAI)	03/09/2024 (Termo de Recebimento Provisório: xx/xx/2024)	Empresa: JNA	Rede Eletrica Aérea	**	Conta FAI 2930 (Não FINEP)	164.994,61	164.994,61	CCET
26	1468 + 9557	CONC 03 /2023	Inclusão Rota de Fuga/Passarela BIOTROP - V Base = R$ 739.008,09 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R$ 590.047,17 >> Contratação em 11/10/2023 e Inicio da Obra em 30/10/2023	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI) e Fiscalização da Granuzzo Marçal a partir de 19/03/24	23/08/2024 (Termo de Recebimento Provisório: 24/09/2024)	Empresa: JNA (CI + 1º TA + 2º TA)	120,00	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!!	715.783,93		715.783,93	CCET
27	1556	CONC 03/2022	Reforma das Instalações Eletricas - Predios do DEMA - Valor Base = R$ 1.136.888,00 - Abertura das habilitações em 20/01/2023 - Abertura das propostas: 06/03/2023 >> Inicio efetivo da Obra: 13/03/2023	**	Concluida (fiscalização Eng. Rafael - Eng. Eletrica FAI)	07/03/2024 (Termo de Recebimento Provisório: 10/05/2024)	.Empresa: Andre Hoffman Rodrigues - ME (CI + 1º TA + 2º TA+3º TA + 4ºTA + 5º TA)	3.164,05	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!!	1.228.171,50		1.228.171,50	CCET
28	Conv 13.840 - não Finep	CONC 02/2022	Lab Multiusuario - CCN - Campus Lagoa do Sino = Valor Base = R$ 1.780.675,87 - aberura das Habilitações: 30/05/2022 .. Abertura das propostas comerciais em 07/06/2022 >> Valor do CI = R$ 1.756.863,43 >> contratação em 28/06/2022 e inicio da obra em 21/07/2022	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	30/10/2023 (Termo de Recebimento Provisório: 14/12/2023)	Sate Tecnologia e Serviços Ltda >>> CI + 1º TA + 2º TA+ 3º TA+ 4º TA de prazo administrativo + 30 dias	256,61	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!!	Conv 13.840 (Lagoa do Sino) >> não FINEP	1.693.215,21	1.693.215,21	Campus Lagoa do Sino
29	Conv 14.696 (não Finep)	SL 02 /2023	Reforma das Instalações Eletricas - Predio CCDM (prof Guilherme Koga) - V Base = R$ 160.550,90 - Abertuta Habilitações: 02/05/23 - Abertura propostas: 12/05/2023 - Assinatura do contrato: 05/06/2023 >>> Inicio Obra: 19/06/2023	**	Concluida (fiscalização Eng. Rafael - Eletrica FAI)	06/10/2023 (Termo de Recebimento Provisório: 20/10/2023)	Empresa: Andre Hoffman Rodrigues - ME (CI + 1º TA)	1.040,00	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!!	Conv 14.696 (não Finep)	122.676,27	122.676,27	CCET
30	Conv RTI nº 14.200 (não Finep)	Contrato CD nº 012/2022	Acesso viário da EE de Valparaiso (RTI 14.200) - Valor Base = R$ 800.202,26 (SL 05/2022 - Deserta novamente em 23/09/2022) - Ata de inicio de obra assinada em 23/12/2022 >> Inicio efetivo da obra: 16/01/2023	**	Concluida (fiscalização: empresa Hortolani & Avelar - Eng. Pedro Hortolani)	Conclusão em 24/04/23	Noroeste Paulista >> CI + 1ºTA +2º TA + 3º TA	Extensão de 1,2 Km (=/e) c/ área = 7.561,45 m²	Cadastramento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!!	Conv 14.200 (RTI) - não Finep (venc 24/04/2023)	859.190,70	859.190,70	EE Valparaiso
31	1597 + 11.417	CONC 03/2021	Conclusão da Ampliação do Lab. de Pesq. em Matemática, com 2 pavimentos e 955,28 m2 - LPGDM (1597) >> V Base = R$ 1.651.730,76 >> Abertura das Habilitações em 25/08/2021 >> Abetura das prospostas em 17/09/21 >> Valor CI = R$ 1.398.985,27,>> contratação em 18/11/2021 >> inicio da obra em 06/12/2021	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	03/03/2023 (Termo de Recebimento Provisório : 13/03/2023)	JNA >> CI + 1º TA + 2º TA + 3º TA + 4º TA + Reequilibrio em fev/23	955,28	CNO 90.009.24350/76	1.790.016,94		1.790.016,94	CCET
32	Conv 14.199 - não Finep	Pregão nº 19/2022 (Campus Araras)	Serviço de Cercamento do Campus de Araras - Valor Base = R$ 659.677,65 >> Abertura do Pregão: 29/03/2022 - Valor CI = R$ 546.888,00 - assinatura do contrato e inicio de obra em 18/04/2022	**	Concluida (Fiscalização empresa CONSTRIX - Arq. Nickolas)	15/11/2022	Empresa AURUS	Comprimento do Cercamento = 2.072,87 m	Serviço isento de cadastramento no CNO	Conv 14.199 (Araras) >> não FINEP	569.422,14	569.422,14	CCA - Araras
33	1597 + 11.417	CONC 02/2021	Genetica - Conclusão da obra (conv. 1597 e 11.417) - V.Base: R$ 1.644.024,63 - data base: Dez/20) - Abetura das habilitações: 19/04/21; Abertura das Propostas: 13/05/2021 >> Contratação em 30/07/2021 (CI = R$ 1.362.675,13) - inicio efetivo da obra: 16/08/2021	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	16/09/2022 (Termo de Recebimento Provisório : 04/10/2022)	JNA - (CI + Reequilibrio Contratual + 1º TA + 2º TA + 3º TA + 4º TA ADM + 5º TA)	1.150,00	CNO 90.005.21881/70 (mesmo da CONC 03/2020 - rescindida)	1.678.077,24		1.678.077,24	CCBS
34	1556 + 11.417	CONC 01/2021	IBEV - Conclusão da Obra - Ab = 661,39 m2 (V. Base = R$ 1.326.840,02 - out/20) - Abertura das habilitações: 05/02/2021: Abertura das Propostas Comerciais: 16/03/2021 - data da assinatura: 14/04/2021 - Valor do CI = R$ 1.066.196,22 >> inicio efetivo da obra: 03/05/2021	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	29/04/2022 (Termo de Recebimento Provisório: 06/06/2022)	GG Ribeirão Construções (CI + 1º TA + Reequilibrio + 2º TA)	661,39	CNO 90.006.65986/77	1.233.807,72		1.233.807,72	CCET
35	REVOGADO	Pregão Eletronico PE 072/2021 (Prodin 02/2020 - TED/MEC 8891)	Serviço para Ampliação do Parque de Usinas Fotovoltaicas - 2 UFVs c/ PI = 447,12 KWp (Estacionamentos AT 07 e Petrobras) - Prodin 02/2020 - conv. 13.369 - Valor Base = R$ 1.796.080,43 >> abertura 22/10/2021 > Valor Contratado/Empresa GC = R$ 1.409.998,99	**	Pregão 072/2021 - Revogado	31/03/2022 (PE 072/2021 revogado)	Empresa GS	Cobertura de Estacionamentos A = 2.116,00 m²	**	Conv 13.369 (Prodin 02/2020) >> não FINEP	0,00	-	Institucional
36	9557	CONC 03/2019	LIEP - Conclusão da obra (C. Convite 01/2014) - abertura em 19/12/2019 >> abertura das propostas: 28/02/20 >> data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >> empresa GRIFFO >> inicio efetivo em 25/05/2020 (CI = R$ 2.115.230,03)	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	OBS 01: TR Provisório PARCIAL: 01/12/2021 > OBS 02 - TR Provisorio INTEGRAL: 20/05/2022	GRIFFO (CI + 1º TA + 1º TA Reequilibrio + 1º TA Realinhamento + 2º TA + 6º TA)	1.043,20	CNO 90.001.26278/76 (Será o mesmo da CONC 02/2019 rescindida)	2.501.066,39		2.501.066,39	CCET
37	1468 + 9557	CONC 06/2018	MAVLABS - conclusão da obra - abertura das habilitações ocorreu em 02/12/2019 - abertura das propostas em 16/12/2019 - data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >> empresa JNA (CI = R$ 2.167.534,88)	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	05/10/2021 (Termo Recebimento Provisório: 27/10/2021)	JNA (CI + 1º TA Reequilibrio + 1º TA)	993,50	CNO 90.003.49850/60 (está em nome Jomar - 27/05/20)	2.424.437,45		2.424.437,45	CCET
38	1597	CONC 01/2020	Reforma da UGR - DQ - (ilha) - predio 68A - Lab de Destilação (Ab = 100,98 m²) - data de assinatura do contrato/inicio de obra: 16/09/2020 (CI = R$ 248.853,55)	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	27/08/2021 (Termo Recebimento Provisório: 08/08/2021)	JNA (CI + 1º TA Reequilibrio + 1º TA + 3º TA)	100,98	CNO 90.004.75553/75	290.706,79		290.706,79	CCET
39	1597	CONC 02/2020	Reforma da UGR/DeGR - predio 114D + deposito existente (Ab = 163,60 m²) + Ampliação da UGR/DeGR (Ab = 82,00m²) - data da assinatura do contrato/inicio de obra: 16/09/20 (CI = R$ 575.561,02)	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	27/07/2021 (Termo Recebimento Provisório: 23/08/2021)	JNA (CI + 1º TA de Reequilibrio + 1º TA)	245,60	CNO 90.004.75591/77	616.443,37		616.443,37	CCET
40	RESCISÃO	CONC 04/2020	Reforma das Instalações Eletricas - Predios do DEMA - abertura das propostas comerciais em 30/09/20 - data da assinatura do contrato: 17/11/2020 - data Inicio de obra: 02/12/2020 - Valor CI = R$ 844.875,01	**	Rescisão contratual realizada em 11/03/2021 (conv 1556)	11/03/2021	Nasman (Rescindido)	**	CNO 90.005.21881/70	0,00		-	CCET
41	REVOGADA	SL 015/2020 (não FINEP)	PMGCA - Lab Sala de Sementes - abertura das habilitações: 24/11/2020 . Valor Base = R$ 842.592,49 - data base Jul/20) - Convenio 10.763 (não FINEP)	**	Seleção Publica revogada em 09/03/2021	09/03/2021	Contratação Revogada	**	**	Convenio 10.763 (recursos privados) - não Finep	0,00	-	CCA

			Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026		Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios					Posição em : 30/10/2026			
42	RESCISÃO	CONC 03/2020	Genetica - Conclusão da obra (conv. 1597 e 11.417) - Valor Base = R$ 1.473.262,94 (Fev/20)- data de assinatura do contrato: 21/10/2020 - inicio da obra: 05/11/2020. Valor do Contrato Inicial = R$ 1.096.140,00	**	Rescisão contratual realizada em 11/03/2021 (conv. 1597 + 11.417)	11/03/2021	Nasman (Rescindido)	**	CNO 90.005.04383/79	0,00		-	CCBS
43	1481 + 9557	CONC 04/2018	FINEP 2 e 3 de Araras (unificados) - conclusão da obra - abertura da licitação 31/01/2019, abertura das propostas em 13/03/2019 e assinatura do contrato em 16/05/19	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	08/09/2020	JNA	1.488,60	CNO 90.000.62787/78	3.361.724,32		3.361.724,32	CCA
44	9557	CONC 05/2018	COLMEEA - conclusão da obra - abertura da licitação 31/01/2019; abertura das propostas: 26/02/19; assinatura do contrato em 21/05/19	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	04/09/2020	Nasman	1.242,50	CNO 90.000.63999/75	2.902.697,75		2.902.697,75	INSTITUCIONAL
45	1556	CONC 01/2019	Reforma das Instalações Eletricas da BCO - São Carlos (Ab = 9.000,00 m²) - abertura das habilitações em 23/04/19 >> data da assinatura do contrato e da ata: 28/06/2019 - Inicio efetivo da obra: 19/07/2019	**	Concluida (fiscalização Eng. Eletrica FAI)	20/12/2019	Mult Light	reforma instalações eletricas BCO - Ab = 9.000,00 m²	CNO 90.000.98846/70	200.737,65		200.737,65	INSTITUCIONAL
46	1597 + 9557	CONC 10 /2017	NANOBIO/DQ - Conclusão da Obra - (abertura em 23/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do contrato: 05/09/2017	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	04/10/2019	MACRO	2.123,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	3.599.056,71		3.599.056,71	CCET
47	10.763- não Finep	SL 009/2018 (seleção publica)	Reforma do Departamento de Biotecnologia e de Produção Vegetal e Animal.- DBPVA (profª Bernadete - predio Central) /PMGCA/Araras - abertura 06/11/18, abertura proposta comercial: 14/11/18 >> JNA assinatura contrato: 14/12/2019 - inicio da obra em 07/01/2019	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	27/09/2019	JNA	183,74	CNO 90.000.21841/71	Recurso PMGCA (projeto 10.763) - valor base = R$ 266.074,70	308.442,27	308.442,27	CCA
48	RESCISÃO	CONC 02/2019 (conv 9557)	LIEP - Conclusão da obra (C. Convite 01/2014) >>> Conclusão do processo de rescisão contratual e emissão do Termo de Recebibento Provisorio datados de 24/10/2019	**	Concluida parcialmente (contrato rescindido) - fiscalização Empresa AGP (conv 9557)	26/09/2019	Costa e Costa Construções	1.043,20	CNO 90.901.26278/76	55.670,48		55.670,48	CCET
49	10.763- não Finep	SL 010/2018 (seleção publica)	Reforma do PREDIO PMGCA (sede >>Prof Hermann)/Araras - abertura: 09/11/18; abertura proposta comercial : 14/11/18 >> JNA assinatura contrato: 14/12/2018 - inicio da obra em 07/01/2019	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	21/08/2019	JNA	1.306,30	CNO 90.000.21996/70	Recurso PMGCA (projeto 10.763) - valor base = R$ 285.714,33	426.908,52	426.908,52	CCA
50	1556	CONC 05 /2017	BCO - S Carlos - REFORMA (abertura 14/06/17) - Empresa Viasol - assintura do contrato 29/08/2017 inicio efetivo/ata: 11/09/2017	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	06/05/2019	Viasol	reforma	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	677.233,68		677.233,68	INSTITUCIONAL
51	1481 + 9557	CONC 17/2017	FINEP 3 e 4 - SOROCABA - conclusão da obra (abertura em 30/10/17) - assinatura c/ a M&G: 15/12/2017 - incio efetivo da obra em 03/01/2018 - M&G	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	29/04/2019	M&G - (CI + TAs + Realinhamento)	2.026,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	4.096.076,28		4.096.076,28	CCTS
52	1556	CONC 07 /2017	INFRATEC - 1ª etapa (abertura em 20/06/2017) - empresa Contisa - assinatura do Contrato/Ata: 18/08/2017 - convenio 1556	**	Concluida (fiscalização empresa AGP)	18/04/2019	Contisa	684,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	716.808,79		716.808,79	CCET
53	1556	CONC 03/2018	Reforma Biblioteca de Sorocaba - reabertura em 01/10/18 - empresa vencedora M&G : contratação em 06/11/2018	**	Concluida (fiscalização empresa AGP)	21/03/2019	M & G	Ab Biblios - Sorocaba = 1.686,94 m²	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	218.279,18		218.279,18	CCTS
54	1597	CONC 03 /2017	Genética - CGMB-DGE - 1ª etapa (abertura 13/06/17) - Empresa ALPHA - assinatura contrato: 03/10/17	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	11/03/2019	ALPHA - (CI + TAs + Realinhamento)	1.150,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.963.835,08		1.963.835,08	CCBS
55	1406+ 1468+ 9557	CONC 09 /2017	BIOTROP - Conclusão da obra (abertura em 22/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do contrato: 04/09/2017	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	26/02/2019	MACRO	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.814.545,12		1.814.545,12	CCBS
56	1416 + 1481	CONC 07 /2016	2ª etapa da obra Lab. FINEP II e III - Araras - Ab = 1.488,60 m² - 1416*01 e 1481*01 (relançamento: abertura da licitação em 21/12/2016 - contrato datado em 03/03/2017 e o inicio efetivo da obra em 20/03/2017 >> conforme ata - empresa Prodex)	**	Concluida (fiscalização FAI)	20/12/2018	Prodex	1.488,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.642.425,62		1.642.425,62	CCA
57	1406 + 9557	CONC 14 /2017	CINA - conclusão da obra - abertura 04/10/2017 - assinatura contrato em 27/11/2017 - JNA	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	20/12/2018	JNA	634,95	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.136.862,65		1.136.862,65	CCET
58	1406 + 1468 + 9557	CONC 08 /2017	NAP - conclusão da obra (abertura em 10/07/2017) - Empresa MACRO - assinatura contrato 15/09/2017	**	Concluida (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	30/11/2018	MACRO	1.876,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.530.061,93		1.530.061,93	CECH
59	1556	CONC 02/2017	BIOTERIO - 1ª etapa - Ab = 512,34 m²- (convenio 1556) - abertura da licitação em 07/03/2017 - empresa ARQCON julgada vencedora em 12/04/2017 - contrato assinado em 26/05/17 e inicio efetivo em 01/06/17	**	Concluida (fiscalização empresa AGP)	14/09/2018	ARQCON	512,34	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.197.829,15		1.197.829,15	CCBS
60	9317 - não Finep	CONC 01/2018	HU - Instalações de Brises do lado oeste - abertura: 15/02/2018 - contrato assinado em 19/03/2018 - Cedro	**	Concluida (fiscalização EBSERH - Eng Fabio)	08/08/2018	CEDRO	instalações brises	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	318.102,99	318.102,99	INSTITUCIONAL
61	1556	CONC 13 /2017	IBEV - 1ª etapa (1556) - abertura 06/09/17 - assinatura do contrato c/ BJL: 20/10/17	**	Concluida (fiscalização empresa AGP)	30/07/2018	BJL	661,39	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	461.617,60		461.617,60	CCBS
62	1597	CONC 04 /2017	DGR - Nova UGR - 1ª etapa (abertura 12/06/17) . Empresa ARQCON - assinatura do contrato: 02/10/17	**	Contrato rescindido/obra cancelada	27/07/2018	ARQCON	781,66	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	138.021,99		138.021,99	CCBS
63	9317 - não Finep	CONC 16/2017	HU - 3ª licitação >> Execução das Instalações Eletricas - Bloco 02 (Orçamento EBSERH) - abertura 24/10/2017 - MONTAG	**	Concluida (fiscalização EBSERH - Eng Fabio) - Cedro	15/07/2018	MONTAG	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	356.972,24	356.972,24	INSTITUCIONAL
64	9317 - não Finep	CONC 15/2017	HU - 2ª licitação >> Execução para complemento da obra civil do Bloco 02 (Orçamento EBSERH) - abertura 23/10/2017 - Empresa Cedro >> assinatura do contrato: 27/11/2017 - CEDRO	**	Concluida (fiscalização EBSERH - Eng Fabio) - Cedro	26/06/2018	CEDRO	1.881,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	1.023.728,06	1.023.728,06	INSTITUCIONAL

			Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026		Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios					Posição em : 30/10/2026			
65	1597	CONC 18/2017	3ª etapa do LIEC - Instalações Eletricas (conclusão da obra - conv 1597) - abertura em 09/11/17 - assinatura do contrato: 06/12/2017 - MONTAG	**	Concluida (fiscalização eng eletrica FAI) - MONTAG	24/04/2018	MONTAG	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	172.100,15		172.100,15	CCET
66	1597	CONC 12 /2017	Cabine de Força Nanobio (Obra Inst.Eletrica) - abertura em 31/08/17 - inicio efetivo da obra em 03/01/2018 - Sampietro	**	Concluida (fiscalização eng eletrica FAI) - Sampietro	20/04/2018	SAMPIETRO	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	179.974,43		179.974,43	CCET
67	1556	CONC 11 /2017	Reforma das instalações eletricas dos 4 predios do CECH - abertura 28/08/17 - assinatura contrato: 22/09/2017 - empresa Nova Meta	**	Concluida (fiscalização eng eletrica FAI) - Nova Meta	16/03/2018	NOVA META	inst eletricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	121.117,98		121.117,98	CECH
68	1597	CONC 06 /2016	2ª etapa da ampliação do Ed. Matemática - Conv 1597*03 (relançamento abertura da licitação em 21/12/2016) - Contrato assinado em 16/01/2017: Ata Inicio de Obra 30/01/2017	**	Concluida (fiscalização FAI)	23/10/2017	CONTISA	955,28	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	359.616,68		359.616,68	CCET
69	1468	CONC 04 /2016	1ª etapa predio MAVLABS /DF c/ 2 pavimentos (GPF 1468) - abertura da licitação: 18/10/2016 (empresa JNA - valor CI = R$ 934.281,17) - Ata assinada em 09/01/2017	**	Concluida (fiscalização FAI)	26/10/2017	JNA	993,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.006.681,17		1.006.681,17	CCET
70	9317 - não Finep	CONC 02/2016	Hospital Universitário - HU - 1ª licitação - reforma e conclusão de parte do predio - Convenio 9317 - FAI X Sapiens (empresa Pajolla - fiscalização Eng Fabio/EBSERH) - contrato assinado em 14/09/2016	**	Concluida (fiscalização EBSERH)	18/09/2017	PAJOLLA	1.881,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	4.955.651,09	4.955.651,09	INSTITUCIONAL
71	1556	CONC 01/2017	Cabine de Força NANOBIO - p/ o predio de 4 pavimentos (conv 1556 - obra civil) - Abertura das habilitações em 23/02/2017 - vencedora empresa Fragalli - contrato assinado em 04/04/2017 - inicio efetivo da obra: 10/04/2017	**	Concluida (fiscalização FAI)	26/07/2017	FRAGALLI	62,10	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	142.937,38		142.937,38	CCET
72	1468	CONC 05/2016	2 Cabines de Instalações Eletricas p/ o Biotrop e Colmeea - GPF 1468 (abertura da licitação: 15/12/2016 - empresa Sampietro Eng.) - inicio de obra : 30/01/2017	**	Concluida (fiscalização FAI)	24/07/2017	SAMPIETRO	126,20	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	598.995,25		598.995,25	CCET
73	1597	CONC 01/2016	2ª Etapa do LIEC (empresa JNA) - contrato assinado em 03/10/2016 - inicio efetivo em 17/10/16 - termino previsto 15/04/17 - (houve solicitação de aditvo de prazo por + 60 dias solicitado em 02/02/2017)	**	Concluida (fiscalização FAI)	27/06/2017	JNA	352,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	411.991,00		411.991,00	CCET
74	PRODIN	Contratação Direta (3 orçamentos)	LIEP - contratação da Laje de Piso do 1º pavimento via PRODIN - contrato assinado em 09/01/2017 c/ Habcon - obra concluida (somente escoramento da laje será retirado em 10/03/17)	**	Concluida (fiscalização FAI)	17/02/2017	HABCON	491,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso PRODIN/FAI/DEP - UFSCAR	84.635,08	84.635,08	CCET
75	não Finep	CONC 07/2015	Lab Ed. Fisica e Motricidade Humana - GPF 1325*01 (custo final da obra = soma dos pagamentos à JBS = CONC 22/2013 e dos pagamentos à JNA = CONC 07/2015)	**	Concluida (fiscalização FAI)	21/12/2016	JBS/JNA	1.250,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso CCI 098/2007 >> convenio encerrado em 28/12/2016	4.395.669,24	4.395.669,24	CCBS
76	1468	CONC 01/15	1ª Etapa do Edifício do LIEP (3 pav - em estrutura metalica)	**	Concluida (fiscalização FAI)	08/11/2016	Dalmetal	1.623,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.388.746,65		1.388.746,65	CCET
77	RESCISÃO	CONC 06/2015	3ª Etapa BIOTROP - empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016	**	Concluida parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	09/09/2016	Zacarelli	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	268.498,51		268.498,51	CCBS
78	RESCISÃO	CONC 03/15	Ampliação Ed. Matemática 1ª etapa - Empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016	**	Concluida parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	09/09/2016	Zacarelli	955,28	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	744.138,96		744.138,96	CCET
79	RESCISÃO	CONC 05/15	2ª etapa Nanobio - 4 pavimentos (etapa para termino somente de 2 pavimentos) - Empresa Zaccarelli - Obs: contrato rescindido em Ago/2016	**	Concluida parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	26/08/2016	Zacarelli	1.061,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	202.934,43		202.934,43	CCET
80	1468	CONC 04/15	Reforma MAVLABS - DF - ata inicio da obra: 15/01/2016	**	Concluida (fiscalização FAI)	09/08/2016	Simieng	170,07	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	254.014,63		254.014,63	CCET
81	1468	TPN 01/2015	3 Cabines de Dados e Voz em S Carlos - GPF 1468*02 (5 açoes) - Cabines do Letras, do DECIV e do CCBS	**	Concluida (fiscalização FAI)	07/04/2016	**	180,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	230.994,10		230.994,10	INSTITUCIONAL
82	1406	CV 06/15	Reforma do Laboratório de Controle Ambiental 01 (Edifício nº 75 - DEQ)	**	Concluida (fiscalização FAI)	23/02/2016	**	132,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	65.752,77		65.752,77	CCET
83	não Finep	SL 001/2015	2º Predio Administrativo FAI (FAI 02) - recursos proprios	**	Concluida (fiscalização FAI)	17/12/2015	**	379,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso FAI >> não FINEP	1.128.932,54	1.128.932,54	FAI (2º predio administrativo)
84	1406	CONC 23/13	4ª etapa do DEQ - São Carlos (empresa JBS)	**	Concluida (fiscalização FAI)	10/09/2015	**	1.542,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.352.990,00		1.352.990,00	CCET
85	1406	CONC 03/14	2ª. Etapa do NAP	**	Concluida (fiscalização FAI)	16/06/2015	**	1.876,75	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.343.697,06		1.343.697,06	CECH
86	1406	CONC 21/13	Construção da 1ª etapa - COLMEEA	**	Concluida (fiscalização FAI)	24/04/2015	**	1.242,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.497.468,67		1.497.468,67	INSTITUCIONAL
87	RESCISÃO	CONC 19/13	1ª etapa Finep II e III de Araras - (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato - CONC 019/2013 - foi revogado - Valor Pago até 27/02/15 = R$ 230.064,26)	**	Concluida parcialmente (contrato rescindido)	27/02/2015	JBS	1.488,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	230.064,26		230.064,26	CCA
88	RESCISÃO	CONC 02/14	Construção 2ª etapa BIOTROP (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato foi revogado)	**	Concluida parcialmente (contrato rescindido)	27/02/2015	**	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	333.191,92		333.191,92	CCBS


			Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026		Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios					Posição em : 30/10/2026			
89	*	CONC 07/14	Reforma dos Lab. DEQ - predios 34 e 34B	**	Concluida (fiscalização FAI)	25/10/2014	**	122,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	136.357,22		136.357,22	CCET
90	1481	CONC 15/13	1ª etapa FINEP 3 e 4 - Sorocaba - empresa JBS - Fiscal Cassio/Sorocaba	**	Concluida (Fiscal - Eng Cassio - Sorocaba)	05/09/2014	**	2.026,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	2.288.577,36		2.288.577,36	CCTS
91	1406	CONC 16/13	Execução de Rede Compacta e Subterrânea - Transfederonica - S Carlos	**	Concluida	14/07/2014	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	712.637,48		712.637,48	INSTITUCIONAL
92	*	TPN 010/13	Cabine de Força - Araras (p/ atender os predios FINEP 1, 2 e 3) - Eletro Pires - Fiscal Arquelau	**	Concluida	13/07/2014	**	52,56	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	173.531,61	34.252,17	207.783,78	CCA
93	1406	CONC 17/13	Construção 1ª etapa do CINA - S Carlos	**	Concluida	25/06/2014	**	634,95	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	570.243,23		570.243,23	CCET
94	1295*03 + 1551*01	CONC 13/13	2ª Etapa Ecotoxicologia - Araras - Empresa JBS - Fiscal Arquelau	**	Concluida	29/05/2014	**	746,32	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	610.974,12	167.540,49	778.514,61	CCA
95	não Finep	DL 04/11	Predio Séde - PMGCA - Araras	**	Concluida	05/05/2014	**	1.306,30	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos PMGCA	3.116.398,39	3.116.398,39	
96	1371	CONC 05/12	Construção 1ª etapa BIOTROP (Empresa Zaccarelli)	**	Concluida	24/01/2014	**	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.364.445,15		1.364.445,15	CCBS
97	*	CONC 12/13	Construção da 1ª etapa do LIEC - Prof Ernesto DQ	**	Concluida	30/12/2013	**	352,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	441.352,11		441.352,11	CCET
98	1371	CONC 11/13	Construção Ed Núcleo de Apoio a Pesquisa - NAP - 1ª etapa	**	Concluida	08/12/2013	**	1.876,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.134.734,26		1.134.734,26	CECH
99	*	CONC 03/11	Construção Lab Educ. Especial – 1ª etapa - Psicologia - CONC 003/11	**	Concluida	12/11/2013	**	1.121,75	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	711.142,24	1.079.573,93	1.790.716,17	CECH
100	*	CONC 10/13	Reformas e adequações LIDEPS (edif 23, 25 e 15B)	**	Concluida	20/10/2013	**	578,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	607.801,60		607.801,60	CECH
101	1406	CONC 01/13	3º Etapa do DEQ - Inst. Eletricas	**	Concluida	17/10/2013	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	456.579,02		456.579,02	CCET
102	1295*03 + 1551*01	CONC 04/12	Construção Lab. Biotecnologia e Ecotoxicologia, 1ª Etapa - Araras - ENGE REIS - fiscal Pavan	**	Concluida	21/06/2013	**	746,35	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	438.288,87	3.235,04	441.523,91	CCA
103	*	TPN 01/12	Reforma da Cobertura do Edifício LCE	**	Concluida	27/05/2013	**	388,32	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	199.693,87	145.943,52	345.637,39	CCET
104	1202	CONC 02/12	Construção 1ª etapa Nanobio - DQ - 4 pav	**	Concluida	16/05/2013	**	2.123,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.180.644,82	402.240,41	1.582.885,23	CCET
105	*	TPN 011/12	2ª Etapa Cabine da SIn -	**	Concluida	08/02/2013	**	62,21	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	151.409,56		151.409,56	INSTITUCIONAL
106	Petrobras conv 1202	CONC 01/2009	1ª Etapa do Centro de Pesquisa / Petrobras (convenio 1202*02 - Prof Ernesto Urquieta)	**	Concluida	31/01/2013	**	3.600,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos PETROBRAS	7.704.956,35	7.704.956,35	CCET
107	1287 + 1202 + 1550	CONC 04/11	Construção 2ª Etapa DEQ + Entorno - CONC 004/11	**	Concluida	22/10/2012	**	1.542,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	340.943,27	137.760,56	478.703,83	CCET
108	*	TPN 09/11	Construção de cabine primária - SIN - 1ª Etapa	**	Concluida	03/05/2012	**	62,21	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	104.066,58		104.066,58	INSTITUCIONAL
109	*	TPN 07/11	Modernização Cab. Entrada E. Elétrica	**	Concluida	07/04/2012	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	50.299,70		50.299,70	CCA
110	1325 (CCI) + 1371 + 1406	CONC 05/10	Construção da cobertura do Edifício da Matemática - conv 1325/CCI nº 098/2007 = R$ 1.374.516,77 + conv 1371/FINEP = R$ 390.000,00 + 1406/FINEP = R$ 877.433,68	**	Concluida	04/03/2012	**	3.276,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.267.433,68	1.374.516,77	2.641.950,45	CCET
111	*	TPN 08/11	Reforma da Rede de Média Tensão em Araras	**	Concluida	15/01/2012	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	21.404,67		21.404,67	CCA
112	*	CONC 01/11	Reforma e Ampliação do Lab. de Alta Pressão - DEQ	**	Concluida	15/12/2011	**	34,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	86.233,89		86.233,89	CCET
113	*	CONC 01/10	Acabamento e Instalações do ATLab - Sorocaba -/ GROUT	**	Concluida	20/09/2011	**	8.740,08	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	677.312,79	3.393.538,92	4.070.851,71	CCTS
114	*	CN 03/11	Execução e Conclusão da rede de Telefonia e Dados do Laboratorio	**	Concluida	03/07/2011	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	49.984,44		49.984,44	CCET
115	Petrobras conv 1325	CONC 04/2009	Fundação e Estrutura Pre Fabricada do Ed Matemática - empresa PROTENDIT - CCI 098/2007 - - GPF 1325 - 01	**	Concluida	17/02/2011	Protendit	3.276,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos CCI 098/2007 (não FINEP)	2.120.582,97	2.120.582,97	CCET
116	*	TPN 017/08	Reforma Lab do Ed 51 - CCET - Depto Fisica (Unimaz)	**	Concluida	25/10/2010	**	617,17	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI		374.014,00	374.014,00	CCET

			Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026		Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios				Posição em :	30/10/2026			
117	*	CONC 04/08	Ed. DEQ - 1ª etapa	**	Concluida	03/01/2010	**	1.534,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.511.883,44		1.511.883,44	CCET
118	*	CONC 06/08	Ed. Fisioterapia - 1ª etapa - fundação e estrutura pré moldada	**	Concluida	25/07/2009	**	3.300,55	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.990.281,10	12.000,00	2.002.281,10	CCBS
119	*	TPN 06/08	Lab Pesquisa de Exatas - Sorocaba - 2ª Etapa	**	Concluida	23/05/2009	**	528,91	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	357.860,17	242.477,33	600.337,50	CCTS
120	*	CN 03/08	Reforma e Ampliação Lab Controle Ambiental - DEQ	**	Concluida	16/02/2009	**	132,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	120.378,58		120.378,58	CCET
121	*	Dis 01/08	Reforma e Ampl. Lab. Engª Bioquimica - DEQ (CN 010/08)	**	Concluida	17/01/2009	**	110,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	48.508,76	18.466,44	66.975,20	CCET
122	*	TPN 016/07	Obras/Reformas Ed 51 e 52 - Depto Fisica	**	Concluida	03/10/2008	**	2.086,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	617.830,65		617.830,65	CCET
123	*	CN 017/08	Reforma Lab do Ed 53 - Depto Fisica	**	Concluida	12/09/2008	**	250,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	22.974,72		22.974,72	CCET
124	*	TPN 02/07	Lab Pesquisa Sorocaba - Fundações/Estrutura - 1ª Etapa	**	Concluida	21/03/2008	**	528,91	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	299.849,56		299.849,56	CCTS
125	*	TPN 008/07	Lab Microscopia Eletronica/Conclusão - S Carlos	**	Concluida	11/03/2008	**	434,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	404.405,31		404.405,31	CCET
							Tt =	97.233,27		79.256.760,78	48.047.986,24	127.304.747,02	

Posição: 30/10/2026


Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026	R$	% rel
Convenios FINEP =	79.256.760,78	62,26%
Recursos CCIs / Próprios/Outras Fontes =	48.047.986,24	37,74%
Total (R$) =	127.304.747,02	100,00%

>>>>>>>>




Posição em : 30/10/2026

ano	Obras Concluidas/Licitadas/em andamento - (R$/ano)
2008 - concluidas	1.345.060,24
2009 - concluidas	2.789.972,38
2010 - concluidas	1.885.897,44
2011 - concluidas	6.327.653,01
2012 - concluidas	3.296.425,23
2013 - concluidas	14.657.595,60
2014 - concluidas	9.174.957,22
2015 - concluidas	5.886.344,45
2016 - concluidas	7.550.749,29
2017 - concluidas	7.560.507,65
2018 - concluidas	8.278.814,79
2019 - concluidas	14.077.593,76
2020 - concluidas	6.264.422,07
2021 - concluidas	3.331.587,61
2022 - concluidas	5.982.373,49
2023 - concluidas	4.465.099,12
2024 - concluidas	4.519.329,69
2025 - concluidas	6.552.488,28
2026 - concluidas	1.858.010,18
2026 - em andamento	7.643.934,99
2026 - em licitação/prazo recursal	55.473,08
2026 - em fase de contratação	3.800.457,45
2026 - em montagem de edital	-
2026 - em orçamentação	-
Tt Geral - R$	127.304.747,02

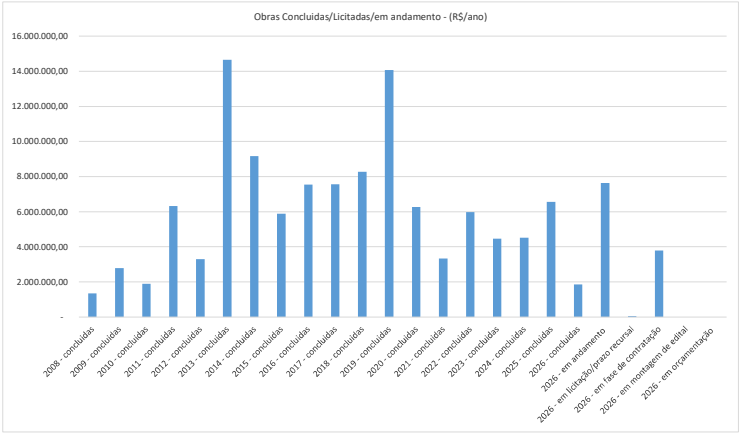


ano	Agrupamento de Obras Concluidas e/ou em andamento (R$/ano)
2008	1.345.060,24
2009	2.789.972,38
2010	1.885.897,44
2011	6.327.653,01



Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2026	Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios	Posição em :	30/10/2026

2012	3.296.425,23
2013	14.657.595,60
2014	9.174.957,22
2015	5.886.344,45
2016	7.550.749,29
2017	7.560.507,65
2018	8.278.814,79
2019	14.077.593,76
2020	6.264.422,07
2021	3.331.587,61
2022	5.982.373,49
2023	4.465.099,12
2024	4.519.329,69
2025	6.552.488,28
agrupadas 2026	13.357.875,70
Tt Geral - R$	127.304.747,02


>>>>>>>>

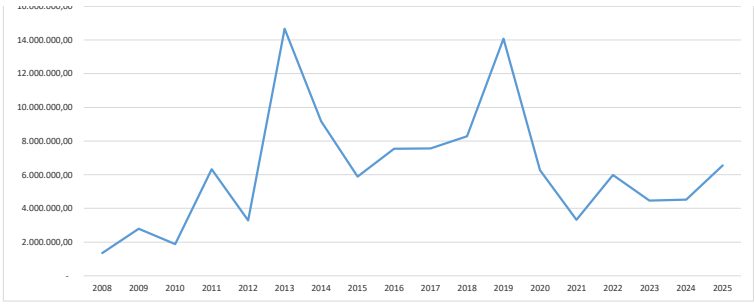

Obs 01: Área Construida/Licitada por ano

ano	Área Construída - concluidas e/ou licitadas (m²) por ano
2008	3.298,91
2009	4.071,46
2010	1.534,60
2011	8.774,08
2012	4.880,73
2013	10.848,50
2014	6.562,36
2015	8.203,10
2016	7.046,08
2017	4.861,95
2018	7.837,64
2019	10.191,07
2020	2.731,10
2021	2.021,00
2022	2.854,59
2023	2.251,89
2024	4.053,86
2025	1.405,39
2026 - concluida	-
2026 - em andamento	-
2026 - em contratação	-
2026 - em licitação	-
2026 - em orçamentação	-

>>>>>>>

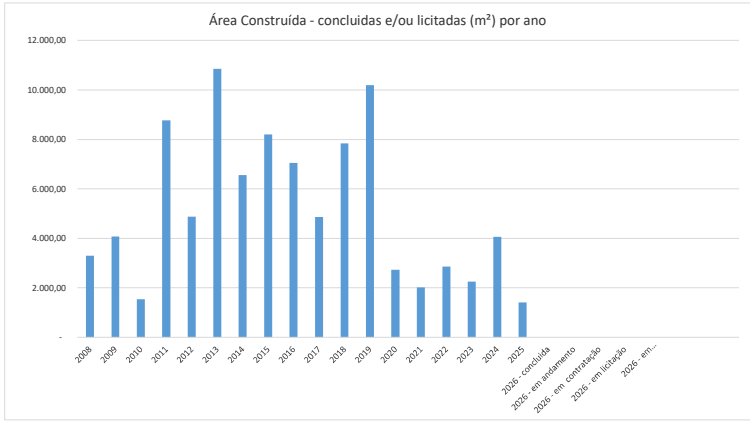

Obs 02: Propostas apresentadas em Editais:

item	tipo	obra/serviço de engenharia	edital	valor estimado (R$)	obs
1	Obra	Predio CEPAR - Campus Lagoa do Sino	FINEP 2025	R$ 4.412.569,26	APROVADO >> Aguardando liberação de recursos
2	Projeto Executivo	Projetos Executivos para o Predio CeMPIE (DEMEC/DEE) - Campus S Carlos	FINEP 2025	R$ 391.606,24	APROVADO >> Aguardando liberação de recursos

R$ 4.804.175,50
